



รายงานผลการดำเนินงานและ การใช้จ่ายงบประมาณเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

(ตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยาและแผนเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 - 5)

(ร อ บ 6 เ ตี อ ห)

โดยฝ่ายวิจัยและประเมินผล ส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนา

สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ เมืองพัทยา โทร 038-253100 ต่อ 3237

คำนำ

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน) ฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินวัดผลการดำเนินโครงการตามแผนดำเนินงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.2568 ถึงความสามารถในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้ ตลอดจน ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานที่วางไว้หรือไม่ โดยการทำการติดตามโครงการตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 และแผนดำเนินงานเพิ่มเติมฉบับที่ 1 - 5 จำนวนทั้งสิ้น 335 โครงการ โดยได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูล จากระบบบริหารจัดการทรัพยากรเมืองพัทยา (ERP Pattaya) และระบบการเงินและบัญชีเมืองพัทยา (PFAS) และข้อมูลจากส่วนราชการ กำหนดขั้นตอนการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 และแผนดำเนินงานเพิ่มเติมฉบับที่ 1 - 5 ตลอดจนมาตรการการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กระทรวงมหาดไทย เป็นตัวชี้วัดกำหนดค่าเป้าหมายในการนำมาวิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น

คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน) ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อคณะผู้บริหารและทุกส่วนราชการ โดยสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลหรือแนวทาง เพื่อวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาให้การดำเนินโครงการสามารถเป็นไปตามแผนแล้วเสร็จ ลุล่วง ตามเป้าหมายที่วางไว้ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดในการบริหารจัดการแผนการดำเนินงานต่อไป

คณะผู้จัดทำ

ฝ่ายวิจัยและประเมินผล ส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนา

สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ เมืองพัทยา

เมษายน 2568

สารบัญ

	หน้า
รายละเอียดแผนดำเนินงานเมืองพัทยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่ใช้ติดตาม	1
รายการสรุปภาพรวมโครงการตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (งบประมาณ พ.ศ.2568) (รอบ 6 เดือน)	2
รายการสรุปภาพรวมโครงการตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (งบประมาณ พ.ศ.2567 กรณีกักเงิน) (รอบ 6 เดือน)	3
รายการสรุปภาพรวมโครงการตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)	10
รายการสรุปขั้นตอนการดำเนินงานภาพรวมโครงการ ตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)	12
รายการโครงการที่ยกเลิก/เปลี่ยนแปลง/ไม่ได้ดำเนินการ ตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)	14
สรุปผลการติดตามประเมินผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)	16
ข้อเสนอแนะ	19
รายการสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน) (จำแนกตามหน่วยงาน)	20
ภาคผนวก	105

สารบัญแผนภูมิ

	หน้า
แผนภูมิที่ 1 แสดงงบประมาณโครงการและรายการงบประมาณเบิกจ่ายสะสมตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 แยกงบประมาณ(รอบ 6 เดือน)	4
แผนภูมิที่ 2 แสดงงบประมาณโครงการและรายการงบประมาณเบิกจ่ายสะสมตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)	7
แผนภูมิที่ 3 แสดงร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการตามแผนดำเนินงานเมืองพัทยา พ.ศ. 2568 สะสม ณ 31 มีนาคม 2568 (จำแนกตามหน่วยงาน)	8
แผนภูมิที่ 4 แสดงจำนวนร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยาเทียบกับเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐ (ภาพรวม)	9
แผนภูมิที่ 5 แสดงผลภาพรวมขั้นตอนการดำเนินงาน โครงการตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)	13

รายละเอียดแผนดำเนินงานเมืองพัทยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่ใช้ติดตามประกอบด้วย

ลำดับที่	รายการ	เงินงบประมาณ
1	แผนดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
2	แผนดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) (ฉบับที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
3	แผนดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 (งบประมาณเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
4	แผนดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 (กรณีกันเงินงบประมาณเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
5	แผนดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 (กรณีกันเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
6	แผนดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 (กองทุนหลักประกันสุขภาพเมืองพัทยา)	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รายการสรุปภาพรวมโครงการ ตามแผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (งบประมาณ พ.ศ.2568) รอบ 6 เดือน


ลำดับ ที่	ชื่อหน่วยงาน	แผนการดำเนินงานเมืองพัทยา 2568			เพิ่มเติมครั้งที่ 2			เพิ่มเติมครั้งที่ 5			รวมทั้งสิ้น		
		จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย
1	สำนักปลัดเมืองพัทยา	12	11,092,380	3,615,650	3	84,226,200	0	0	0	0	15	95,318,580	3,615,650
2	สำนักคลัง	3	17,457,000	0	1	74,891,000	74,891,000	0	0	0	4	92,348,000	74,891,000
3	สำนักช่าง	4	98,004,970	47,685,483.33	15	894,306,800	11,476,700	0	0	0	19	992,311,770	59,162,183
4	สำนักสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	11	16,465,000	1,960,691.20	0	0	0	11	3,148,490	971,115	22	19,613,490	2,931,806
5	สำนักการศึกษา	6	75,407,880	3,681,417.84	1	57,629,000	0	0	0	0	7	133,036,880	3,681,418
6	สำนักช่างสุขาภิบาล	20	135,350,000	0	7	415,853,000	39,486,300	0	0	0	27	551,203,000	39,486,300
8	สำนักสวัสดิการสังคม สำนักทรัพยากรธรรมชาติและ	21	8,049,000	3,998,503.39	3	133,891,200	68,225,100	0	0	0	24	141,940,200	72,223,603
9	สิ่งแวดล้อม	14	234,166,510	169,901,841.27	1	82,310,000	0	0	0	0	15	316,476,510	169,901,841
10	สำนักการท่องเที่ยวและกีฬา	19	158,406,600	79,661,525.51	0	0	0	0	0	0	19	158,406,600	79,661,526
11	สำนักพัสดุและทรัพย์สิน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	กองการเจ้าหน้าที่	2	1,530,000	710,967.74	0	0	0	0	0	0	2	1,530,000	710,968
13	กลุ่มงานกฎหมาย	1	30,000	0	0	0	0	0	0	0	1	30,000	0
14	หน่วยงานตรวจสอบภายใน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	เมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน	13	72,073,680	9,820,013.48	9	221,980,700	109,110	0	0	0	22	294,054,380	9,929,123
รวม		186	906,315,060	359,476,489.84	58	2,543,640,700	691,469,910	11	3,148,490	971,115	255	3,453,104,250	1,051,917,514.84
												คิดเป็นร้อยละ	30.46

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

รายการสรุปภาพรวมโครงการ ตามแผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (งบประมาณ พ.ศ.2567 กรณีกันเงิน) รอบ 6 เดือน

ลำดับ ที่	ชื่อหน่วยงาน	เพิ่มเติมครั้งที่ 1			เพิ่มเติมครั้งที่ 3			เพิ่มเติมครั้งที่ 4			รวมทั้งสิ้น		
		จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย
1	สำนักปลัดเมืองพัทยา	2	10,474,000	239,250	5	378,753,300	218,092,000	2	3,900,000	2,086,000	9	393,127,300	220,417,250
2	สำนักคลัง	0	0	0	0	0	0	1	6,500,000	4,837,500	1	6,500,000	4,837,500
3	สำนักช่าง	20	287,162,200	11,340,000	3	134,395,000	25,351,800	9	110,254,760	0	32	531,811,960	36,691,800
4	สำนักสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	0	0	1	9,900,000	0	1	9,900,000	0
5	งปประมาณ	3	38,149,000	0	1	35,000,000	31,185,000	2	50,082,000	11,974,619	6	123,231,000	43,159,619
6	สำนักการศึกษา	1	12,027,150	0	3	99,900,000	1,632,000	0	0	0	4	111,927,150	1,632,000
7	สำนักช่างสุขาภิบาล	2	48,000,000	0	6	414,371,400	165,486,000	3	30,060,000	4,936,400	11	492,431,400	170,422,400
8	สำนักสวัสดิการสังคม สำนักทรัพยากรธรรมชาติและ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	สิ่งแวดล้อม	0	0	0	2	50,850,000	0	0	0	0	2	50,850,000	0
10	สำนักการท่องเที่ยวและกีฬา	0	0	0	0	0	0	5	36,117,600	32,060,000	5	36,117,600	32,060,000
11	สำนักพัสดุและทรัพย์สิน	0	0	0	0	0	0	1	500,000	373,000	1	500,000	373,000
12	กองการเจ้าหน้าที่	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	กลุ่มงานกฎหมาย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	หน่วยงานตรวจสอบภายใน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	เมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน	3	18,570,000	0	2	79,087,000	9,305,350	3	60,823,000	4,794,388	8	158,480,000	14,099,738
รวม		31	414,382,350	11,579,250	22	1,192,356,700	451,052,150	27	308,137,360	61,061,907	80	1,914,876,410	523,693,307
												คิดเป็นร้อยละ	27.35

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

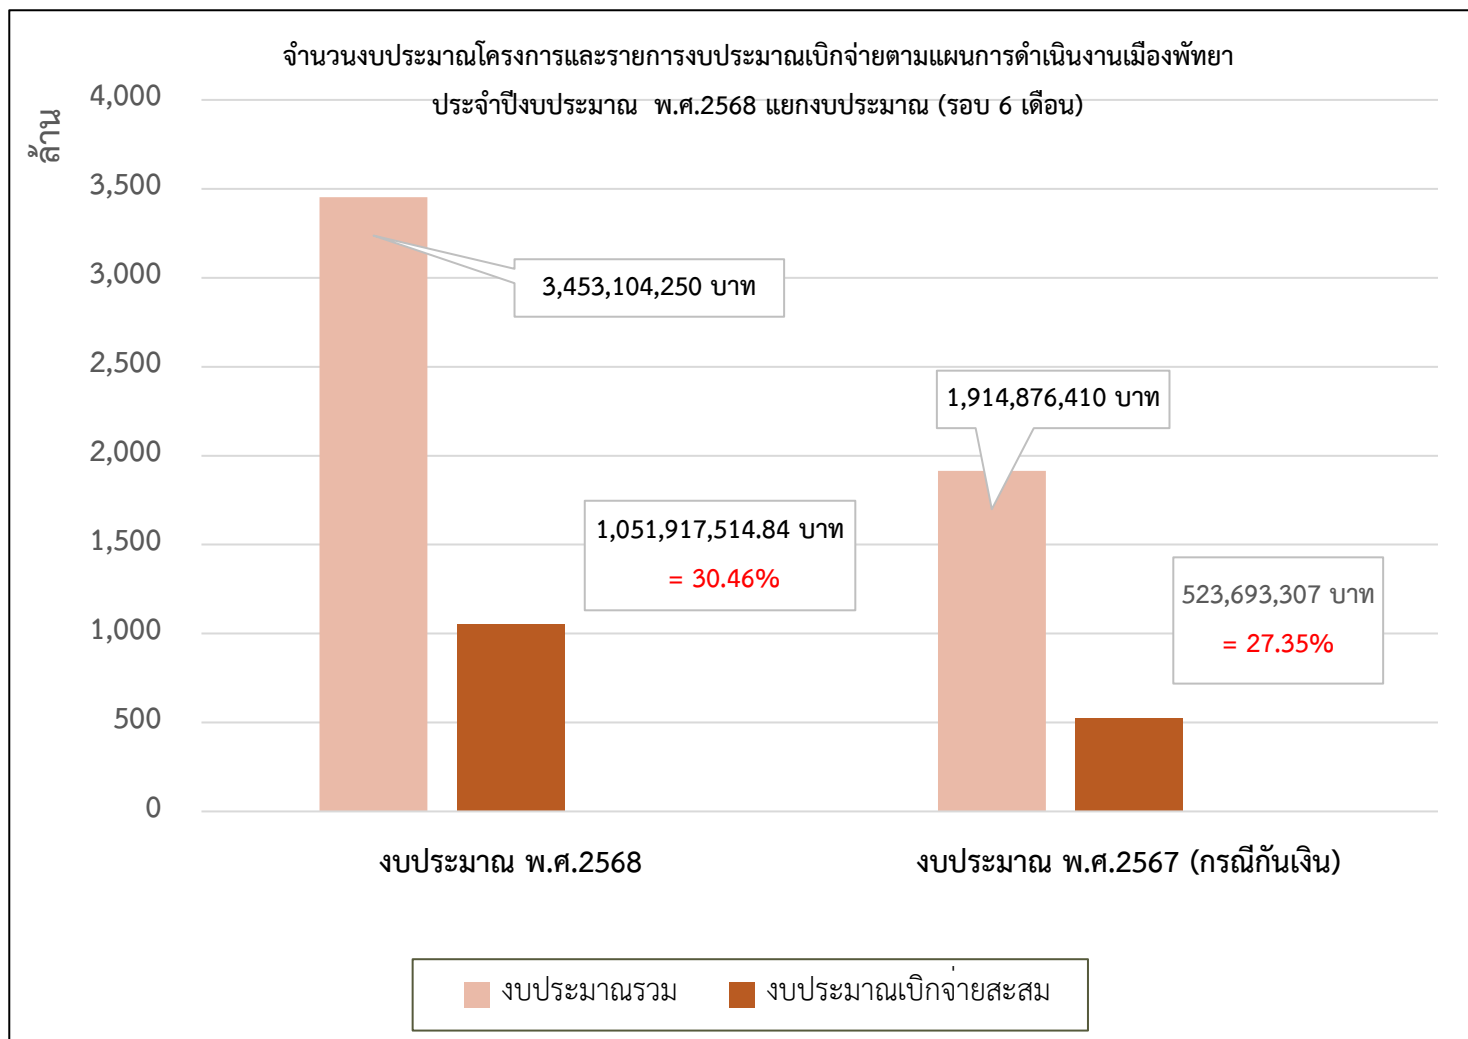

แผนภูมิที่ 1 แสดงงบประมาณโครงการและรายการงบประมาณเบิกจ่ายสะสมตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 แยกงบประมาณ (รอบ 6 เดือน)


รายการสรุปภาพรวมโครงการตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
(จำแนกตามหน่วยงาน)

รายการสรุปภาพรวมโครงการตามแผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำแนกตามหน่วยงาน (รอบ 6 เดือน)


(ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2568)

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน	จำนวนโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คิดเป็นร้อยละ (%)
1	สำนักปลัดเมืองพัทยา	24	488,445,880	224,032,900	45.87
2	สำนักคลัง	5	98,848,000	79,728,500	80.66
3	สำนักช่าง	51	1,524,123,730	95,853,983.33	6.29
4	สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	23	29,513,490	2,931,806.20	9.93
5	สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ	13	256,267,880	46,841,036.84	18.28
6	สำนักการศึกษา	82	768,761,990	537,354,096.08	69.90
7	สำนักช่างสุขาภิบาล	38	1,043,634,400	209,908,700	20.11
8	สำนักสวัสดิการสังคม	24	141,940,200	72,223,603.39	50.88
9	สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	17	367,326,510	169,901,841.27	46.25
10	สำนักการท่องเที่ยวและกีฬา	24	194,524,200	111,721,525.51	57.43
11	สำนักพัสดุและทรัพย์สิน	1	500,000	373,000	74.60
12	กองการเจ้าหน้าที่	2	1,530,000	710,967.74	46.47
13	กลุ่มงานกฎหมาย	1	30,000	0	0.00
14	หน่วยงานตรวจสอบภายใน	0	-	-	-
15	เมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน	30	452,534,380	24,028,861.48	5.31
รวม		335	5,367,980,660.00	1,575,610,821.84	29.35


รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

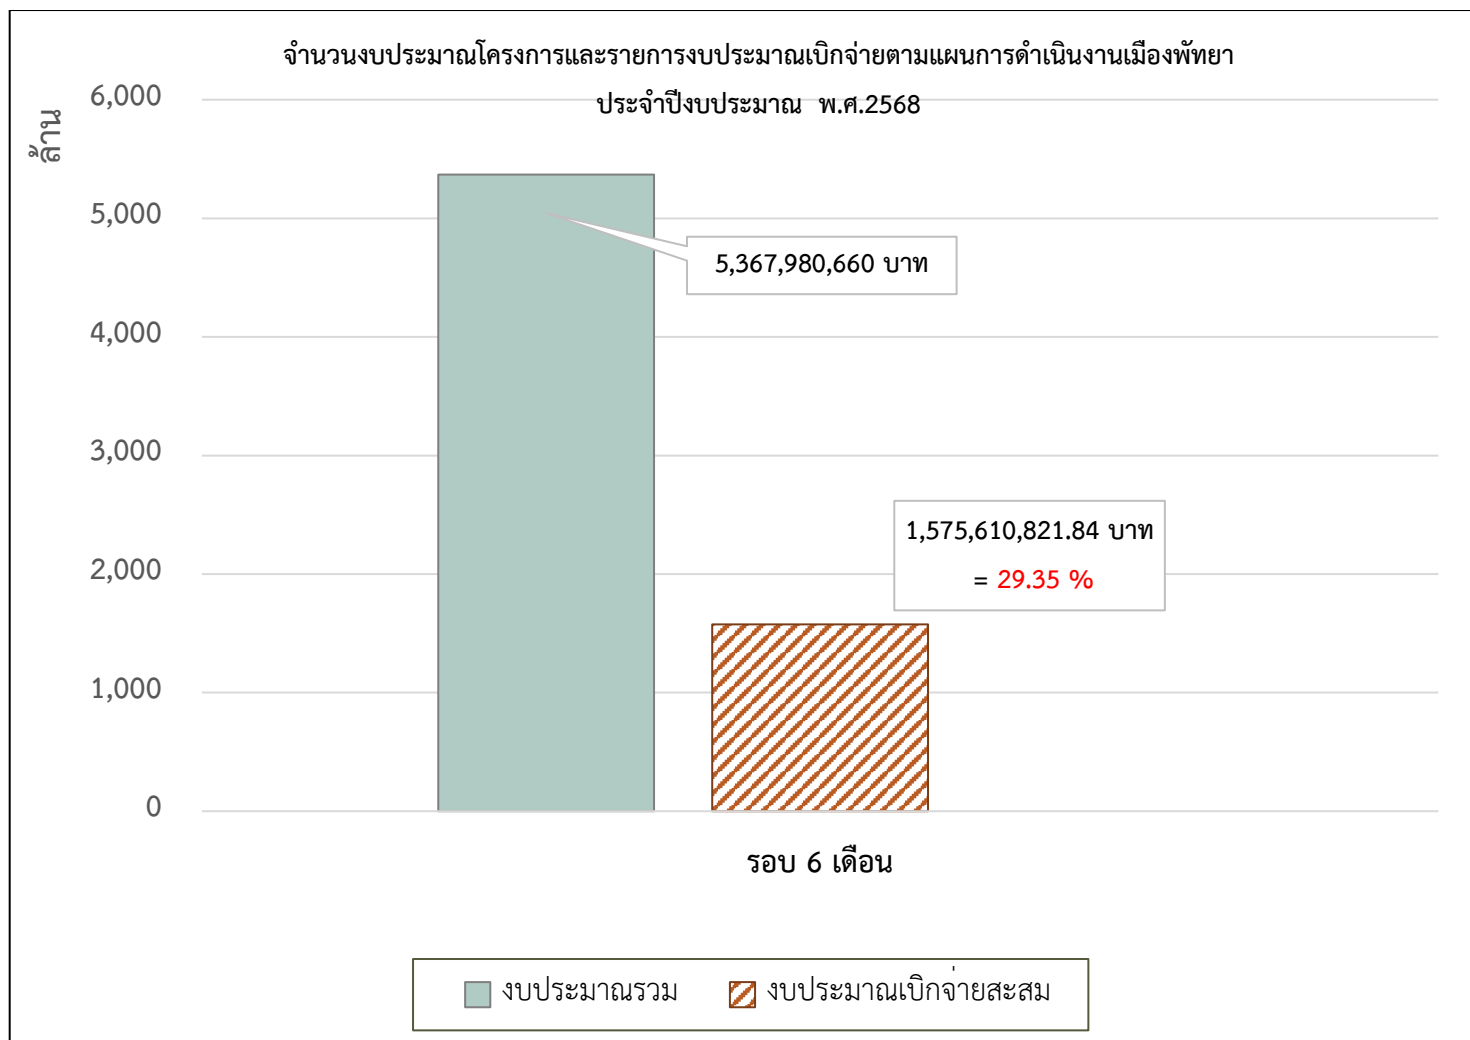

แผนภูมิที่ 2 แสดงงบประมาณโครงการและรายการงบประมาณเบิกจ่ายสะสมตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

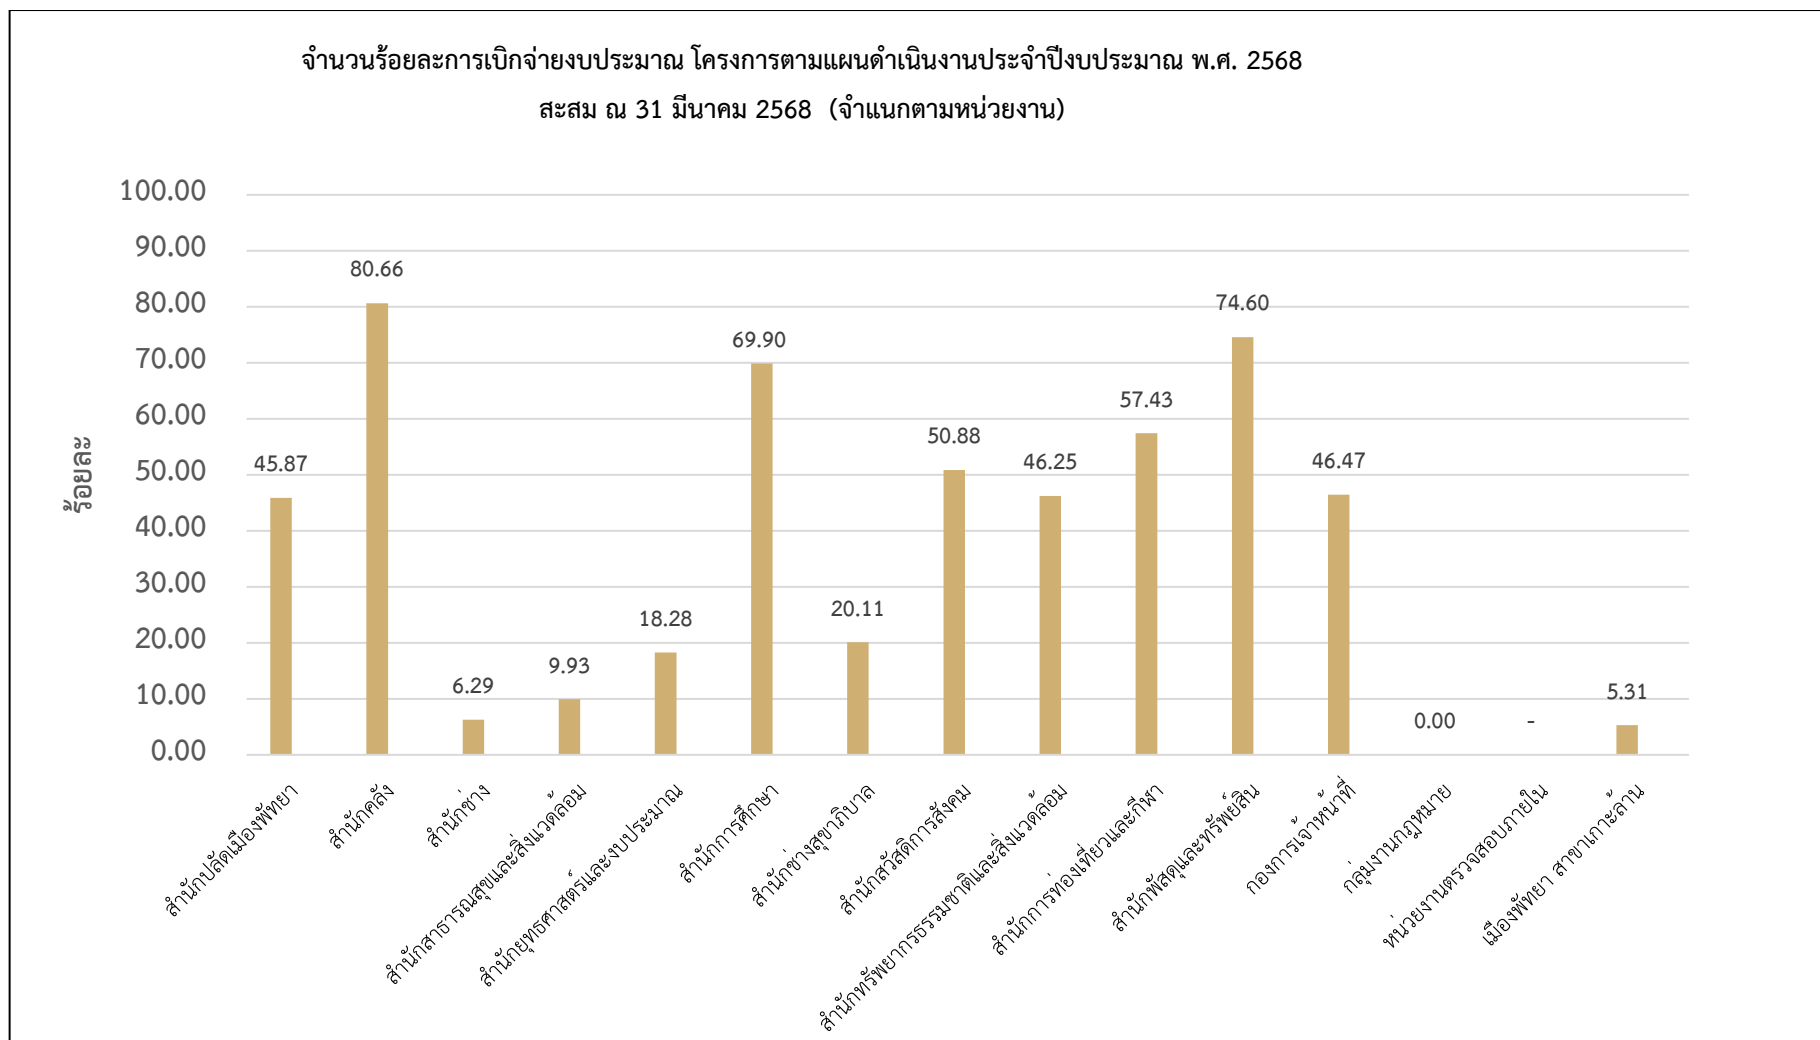

แผนภูมิที่ 3 แสดงร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการตามแผนดำเนินงานเมืองพัทยา พ.ศ. 2568 สะสม ณ 31 มีนาคม 2568 (จำแนกตามหน่วยงาน)

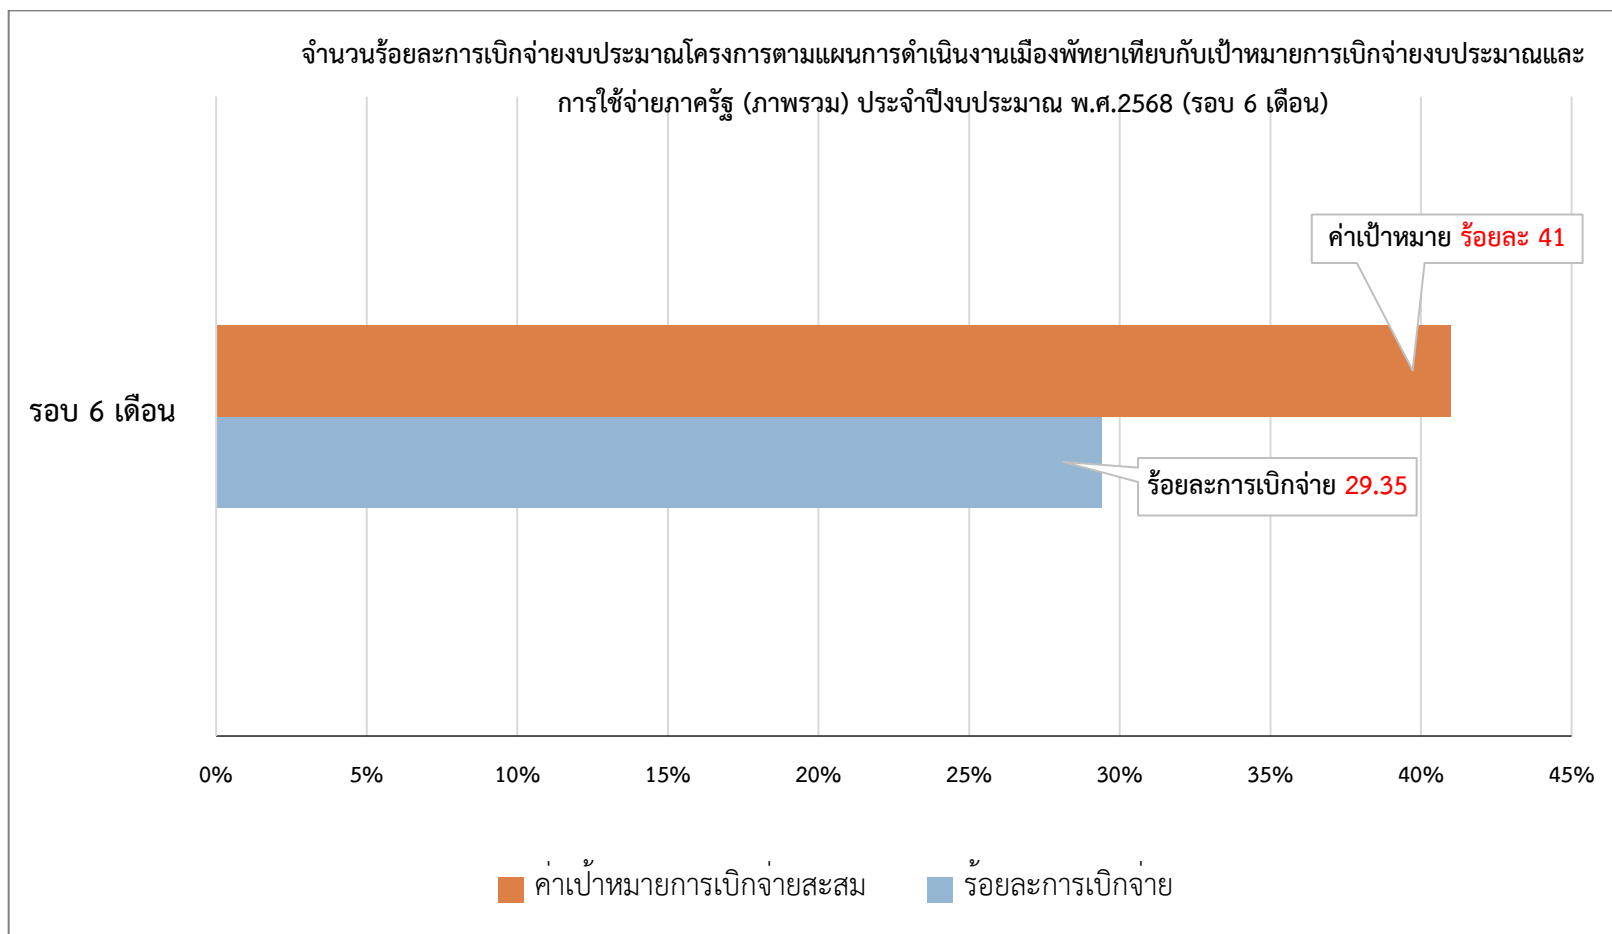

หมายเหตุ : อ้างอิงจากเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0211.2/5420 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2567)

แผนภูมิที่ 4 แสดงจำนวนร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยาเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ (ภาพรวม)


รายการสรุปขั้นตอนการดำเนินงาน
ภาพรวมโครงการตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
(รอบ 6 เดือน)

รายการสรุปขั้นตอนการดำเนินงานภาพรวมโครงการ ตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ราย	จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ขั้นตอนการดำเนินงาน				ตามแผน	ไม่เป็นไปตาม แผน
		ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ยกเลิก/เปลี่ยนแปลง/ ไม่ได้ดำเนินการ		
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)	335	34	232	68	1	257	78

รายการสรุปขั้นตอนการดำเนินงานภาพรวมโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำแนกตามหน่วยงาน (รอบ 6 เดือน)

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน	จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ยกเลิก/เปลี่ยนแปลง/ ไม่ได้ดำเนินการ	ตามแผน	ไม่เป็นไปตาม แผน
1	สำนักปลัดเมืองพัทยา	24	1	18	5	0	21	3
2	สำนักคลัง	5	0	4	1	0	3	2
3	สำนักช่าง	51	1	47	3	0	20	31
4	สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	23	0	19	4	0	22	1
5	สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ	13	0	11	2	0	10	3
6	สำนักการศึกษา	82	21	34	26	1	73	9
7	สำนักช่างสุขาภิบาล	38	2	33	3	0	19	19
8	สำนักสวัสดิการสังคม	24	3	13	8	0	23	1
9	สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	17	2	15	0	0	15	2
10	สำนักการท่องเที่ยวและกีฬา	24	0	13	11	0	23	1
11	สำนักพัสดุและทรัพย์สิน	1	0	0	1	0	1	0
12	กองการเจ้าหน้าที่	2	0	2	0	0	2	0
13	กลุ่มงานกฎหมาย	1	1	0	0	0	0	1
14	หน่วยงานตรวจสอบภายใน	0	0	0	0	0	0	0
15	เมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน	30	3	23	4	0	25	5
รวม		335	34	232	68	1	257	78

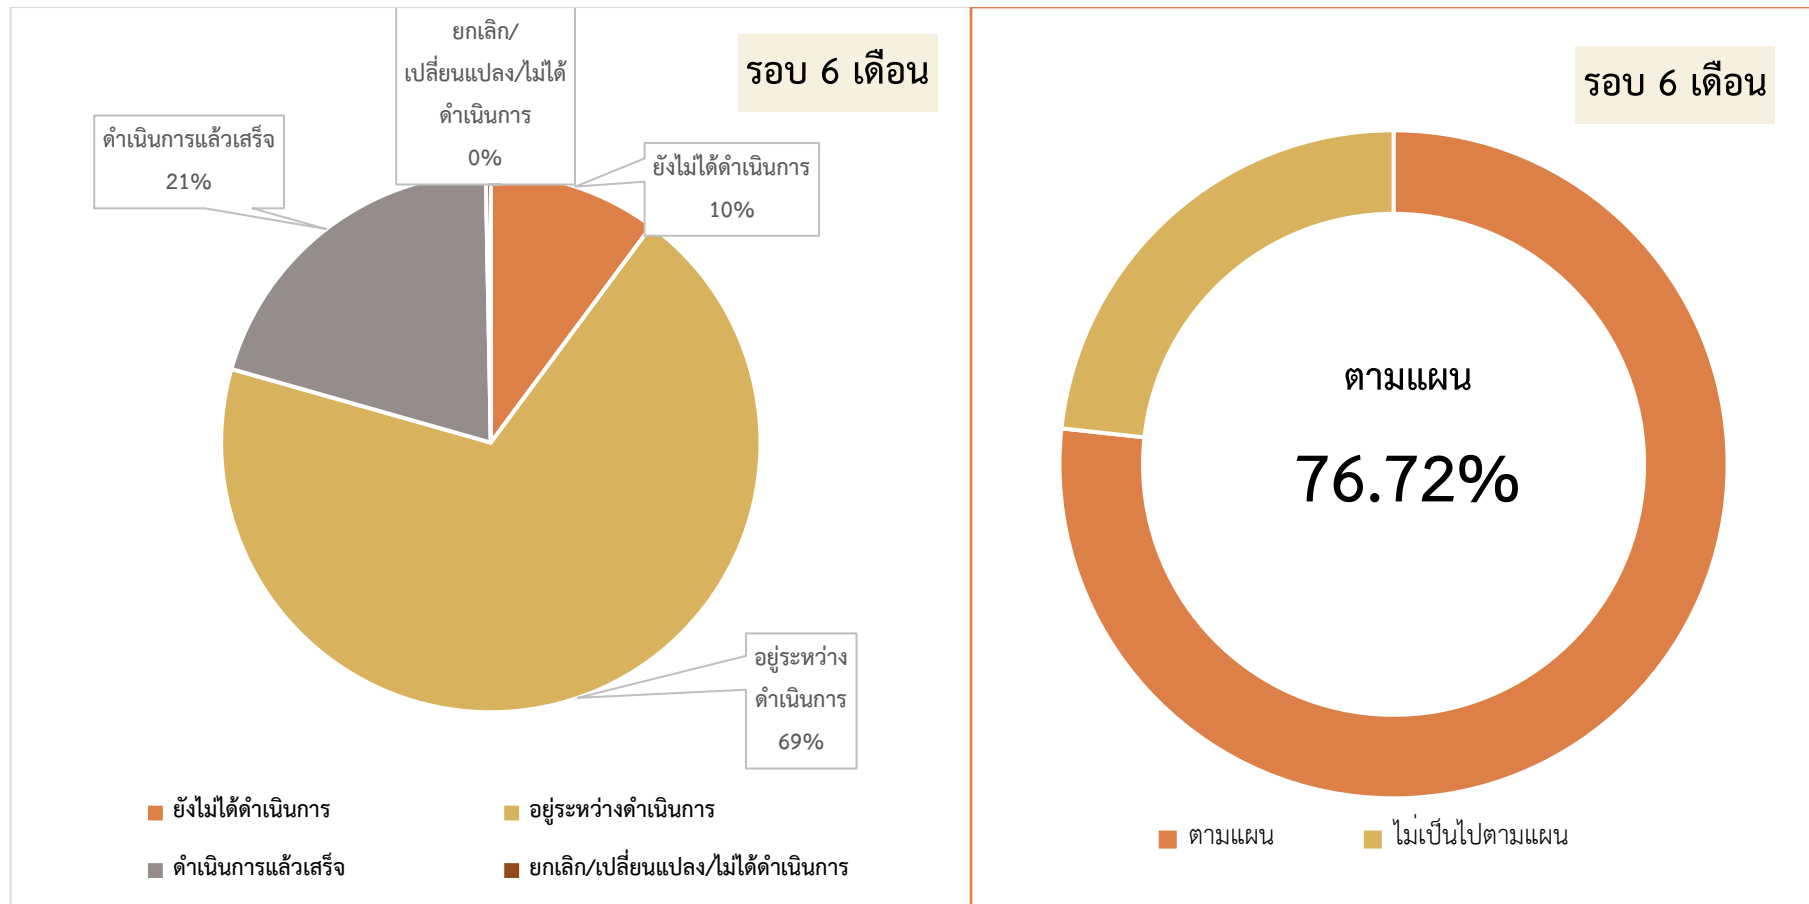

แผนภูมิที่ 5 แสดงผลภาพรวมขั้นตอนการดำเนินงาน โครงการตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

รายการโครงการที่ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ/เปลี่ยนแปลงโครงการ
ตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

รายการโครงการที่ยกเลิก/เปลี่ยนแปลง/ไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

ลำดับ ที่	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	จำนวน งบประมาณ (บาท)	สถานะ	เหตุผล
1	สำนักการศึกษา โครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ	100,000	ไม่ได้ ดำเนินการ	เนื่องจากได้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับอำเภอบางละมุง
รวม		100,000	รวมทั้งหมด 1 โครงการ	

สรุปผลการติดตามผลดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ เมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

จากการสรุปผลการติดตามผลการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2568) จำนวนทั้งสิ้น 335 โครงการ พบว่า สำนักศึกษา มีจำนวนโครงการ ที่บรรจุในแผนการดำเนินงานมากที่สุด จำนวน 82 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 24.48 รองลงมาเป็นสำนักช่าง จำนวน 51 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 15.22 และ รองลงมาสำนักช่างสุขาภิบาล จำนวน 38 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 11.34 โดยพบว่า มีจำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวนทั้งสิ้น 34 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.15 มีจำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวนทั้งสิ้น 232 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 69.25 โดยพบว่า มีจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวนทั้งสิ้น 68 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.30 ยกเลิก/เปลี่ยนแปลง/ไม่ได้ดำเนินการ จำนวนทั้งสิ้น 1 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 0.30 พบว่า โดยพบว่า มี มีจำนวนโครงการที่เป็นไปตามแผน จำนวนทั้งสิ้น 257 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 76.72 และไม่เป็นไปตามแผน มีจำนวน จำนวนทั้งสิ้น 78 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 23.28

จากรายการสรุปขั้นตอนการดำเนินงานภาพรวมโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (จำแนกรายสำนัก) พบว่า

สำนักปลัด มีจำนวนโครงการ ที่บรรจุในแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 24 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.16 โดยพบว่าโครงการส่วนใหญ่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 18 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 75.00 เป็นไปตามแผน จำนวน 21 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 87.50

สำนักคลัง มีจำนวนโครงการ ที่บรรจุในแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.49 โดยพบว่าอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 80.00 เป็นไปตามแผน จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 60.00

สำนักช่าง มีจำนวนโครงการ ที่บรรจุในแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 51 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 15.22 โดยพบว่าโครงการส่วนใหญ่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 47 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 92.16 เป็นไปตามแผน จำนวน 20 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 39.22

สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีจำนวนโครงการ ที่บรรจุในแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 23 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.87 โดยพบว่าโครงการส่วนใหญ่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 19 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 82.61 เป็นไปตามแผน จำนวน 22 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 95.65

สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ มีจำนวนโครงการ ที่บรรจุในแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.88 โดยพบว่าโครงการส่วนใหญ่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 84.62 เป็นไปตามแผน จำนวน 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 76.92

สำนักศึกษา มีจำนวนโครงการ ที่บรรจุในแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 82 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 24.48 โดยพบว่าโครงการส่วนใหญ่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 34 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 41.46 เป็นไปตามแผน จำนวน 73 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 89.02

สำนักช่างสุขาภิบาล มีจำนวนโครงการ ที่บรรจุในแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 38 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 11.34 โดยพบว่าโครงการส่วนใหญ่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 33 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 86.84 เป็นไปตามแผน จำนวน 19 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50.00

สำนักสวัสดิการสังคม มีจำนวนโครงการ ที่บรรจุในแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 24 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.16 โดยพบว่าโครงการส่วนใหญ่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 54.17 เป็นไปตามแผน จำนวน 23 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 95.83

สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีจำนวนโครงการ ที่บรรจุในแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 17 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5.07 โดยพบว่าโครงการส่วนใหญ่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 88.24 เป็นไปตามแผน จำนวน 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 88.24

สำนักการท่องเที่ยวและกีฬา มีจำนวนโครงการ ที่บรรจุในแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 24 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.16 โดยพบว่าโครงการส่วนใหญ่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 54.17 เป็นไปตามแผน จำนวน 22 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 91.67

สำนักพัสดุและทรัพย์สิน มีจำนวนโครงการ ที่บรรจุในแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.30 โดยพบว่าโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00 เป็นไปตามแผน จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00

กองการเจ้าหน้าที่ มีจำนวนโครงการ ที่บรรจุในแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.60 โดยพบว่าโครงการส่วนใหญ่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00 เป็นไปตามแผน จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00

กลุ่มงานกฎหมาย มีจำนวนโครงการ ที่บรรจุในแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.30 โดยพบว่าโครงการยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00 ไม่เป็นไปตามแผน จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00

หน่วยงานตรวจสอบภายใน ไม่มีโครงการบรรจุในแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน มีจำนวนโครงการ ที่บรรจุในแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 30 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 8.96 โดยพบว่าโครงการส่วนใหญ่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 23 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 76.67 เป็นไปตามแผน จำนวน 25 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 83.33

จากรายการสรุปภาพรวมโครงการ ผลการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (จำแนกรายหน่วยงาน) พบว่า

จากผลการติดตามผลการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำแนกตามหน่วยงาน มีจำนวนโครงการตามแผนดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ทั้งสิ้น 335 โครงการ โดยมีงบประมาณโครงการรวม 5,367,980,660 บาท (ห้าพันสามร้อยหกสิบเจ็ดล้านเก้าแสนแปดหมื่นหกร้อยหกสิบบาทถ้วน) โดยพบว่า มีการเบิกจ่ายสะสม รอบ 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 2568 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,575,610,821.84 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบล้านหกแสนหนึ่งหมื่นแปดร้อยยี่สิบเอ็ดบาทแปดสิบลีสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 29.35 สามารถเรียงลำดับผลร้อยละการเบิกจ่ายรายสำนัก 5 อันดับแรกได้ดังนี้

ลำดับที่ 1 สำนักคลัง มีการเบิกจ่ายสะสมรวม 79,728,500 บาท (เจ็ดสิบล้านเก้าแสนเจ็ดแสนสองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 80.66

ลำดับที่ 2 สำนักพัสดุและทรัพย์สิน มีการเบิกจ่ายสะสมรวม 373,000 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 74.60

ลำดับที่ 3 สำนักการศึกษา มีการเบิกจ่ายสะสมรวม 537,354,096.08 บาท (ห้าร้อยสามสิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสี่พันเก้าสิบบาทแปดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 69.90

ลำดับที่ 4 สำนักการท่องเที่ยวและกีฬา มีการเบิกจ่ายสะสมรวม 111,721,525.51 บาท (หนึ่งร้อยสิบล้านเจ็ดแสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบห้าบาทห้าสิบลีสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 57.43

ลำดับที่ 5 สำนักสวัสดิการสังคม มีการเบิกจ่ายสะสมรวม 72,223,603 บาท (เจ็ดสิบล้านสองแสนสองหมื่นสามพันหกร้อยสามบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 50.88

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อให้สามารถวัดผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณเมืองพัทยาได้อย่างเป็นรูปธรรม และก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดในการดำเนินโครงการ ควรมีการนำเกณฑ์ชีวิตที่เป็นมาตรฐานจากส่วนกลางเข้ามาใช้ในการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ตลอดจนการกำกับควบคุมให้ดำเนินการตามกรอบดังกล่าว หรืออาจกำหนดค่าเป้าหมายที่เหมาะสมกับบริบทของเมืองพัทยาเอง เพื่อให้การดำเนินงานโครงการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการตามแผนที่ตั้งไว้ และอาจเพิ่มการกำกับควบคุมการติดตามโครงการที่มีความซับซ้อนเฉพาะตัวของโครงการ ยังคงพบปัญหาความล่าช้าในการดำเนินงาน ที่เกิดจากปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายใน ที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในการดำเนินโครงการ อีกทั้งการกระจุกตัวของการดำเนินโครงการ โดยอาจส่งผลกระทบต่อชีวิต วิถีชีวิตประชาชน ชุมชน และสิ่งแวดล้อมโดยรอบโครงการ ในวงกว้าง อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของเมืองพัทยาก็ด้วย นอกจากนั้นแล้วจากการติดตามประเมินผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณเมืองพัทยา ที่ผ่านมามีพบว่า มีโครงการในแผนการดำเนินงานไม่ได้ดำเนินการติดต่อกันหลายปี ซึ่งอาจพิจารณาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือตัดออกจากแผนดำเนินงานในอนาคต

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ ควรมีการพิจารณาถึงความเป็นไปได้ตลอดจนความพร้อมความสามารถของการดำเนินโครงการ ก่อนการบรรจุเข้าแผนการดำเนินงานโครงการ ซึ่งรวมไปถึงอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ อาทิเช่น กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การขออนุญาตหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ การขอความเห็นชอบหรือการขออำนาจอนุมัติจากจังหวัด กระทรวงมหาดไทย หรือสำนักงานงบประมาณ ในการดำเนินโครงการ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานที่เกิดขึ้น ก่อให้เกิดความล่าช้า เช่นนั้นแล้วหากหน่วยงานมีความพร้อมก่อนการดำเนินโครงการ ก็จะสามารถดำเนินการได้ตามกรอบระยะเวลา และขั้นตอนที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ควรมีความชัดเจนในการกำหนดกรอบระยะเวลาและขั้นตอนดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมและสามารถดำเนินการได้จริง และยังสามารถลดปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ตลอดจนเกิดควมมีประสิทธิภาพประสิทธิผล จากการติดตามประเมินผลสำเร็จของแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปี พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน) นั้นพบว่า โครงการที่มีความยุ่งยากซับซ้อนยังคงติดปัญหาอุปสรรค ทั้งที่เกิดจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน และไม่สามารถดำเนินการได้ตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนด ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นตามไปด้วย

รายการสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนดำเนินงานเมืองพัทยา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(จำแนกตามหน่วยงาน)

(รอบ 6 เดือน)

สำนักปลัดเมืองพัทยา

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุนวันที่เริ่มต้น	ระบุนวันที่สิ้นสุด			
		แผนดำเนินการเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568								
1	68-0032	โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ระบอบประชาธิปไตยให้กับเยาวชนและประชาชนในเขตเมืองพัทยา	-อบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจระบอบประชาธิปไตย -กิจกรรมนันทนาการและการมีส่วนร่วมระบอบประชาธิปไตย เยาวชนไม่น้อยกว่า 150 คน ประชาชนเมืองพัทยา ไม่น้อยกว่า 120 คน	800,000	800,000	1/6/68	31/7/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
2	68-0041	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เมืองพัทยา	1.ทบทวนวิชาความรู้ ที่เคยได้ผ่านการฝึกอบรมมาแล้ว 2.ทบทวนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3.สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 4. ทราบข้อกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ตลอดจนสวัสดิการ ที่มีการปรับปรุงและแก้ไข ให้ทันต่อปัจจุบัน	10,000	0	1/3/68	31/5/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ระหว่างเสนอโครงการ)	ไม่มี	ตามแผน
3	68-0162	โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการรักษาความสงบเรียบร้อย อำเภอบางละมุง (อำเภอบางละมุง)	ข้าราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการชุมชนและกลุ่มพลังมวลชน	300,000	300,000	1/10/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
4	68-0153	โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สถานีตำรวจภูธรบางละมุง)	จัดซื้อชุดตรวจสอบสารเสพติดในปัสสาวะประเภทชุดตรวจยาบ้า และยาไอซ์และชุดตรวจกัญชา	200,000	0	1/10/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เนื่องจากสภ.บางละมุง รายงานผลการดำเนินงานล่าช้า	ไม่เป็นไปตามแผน
5	68-0154	โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา)	จัดซื้อชุดตรวจสอบสารเสพติดในปัสสาวะประเภทชุดตรวจยาบ้า และยาไอซ์และชุดตรวจกัญชา	200,000	200,000	1/10/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
6	68-0163	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ ศอ.ปส.จ.ชบ. (ศอ.ปส.จ.ชบ.)	กลุ่มนักเรียนในเขตจังหวัดชลบุรี 200,000 คน, ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน จำนวน 982 แห่ง, ผู้เสพยาเสพติดได้รับการบำบัด จำนวน 5,000 ราย	2,000,000	2,000,000	1/10/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน

สำนักปลัดเมืองพัทยา

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
7	68-0030	โครงการวันคล้ายวันสถาปนาเมืองพัทยา	เป็นการรำลึกถึงวันคล้ายวันสถาปนาเมืองพัทยาและเป็น เป็นสิริมงคลแก่สถานที่ราชการและพนักงานเมืองพัทยา ตลอดจนประชาชนชาวพัทยาทุกท่าน	100,000	93,150	1/10/67	31/12/67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ตามแผน
8	68-0180	ค่าจ้างเหมาบำรุงดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ฝ่ายทะเบียน ราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน	ระบบคอมพิวเตอร์ฝ่ายทะเบียนราษฎร และบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา	900,000	222,500	1/6/68	31/7/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 2)	ไม่มี	ตามแผน
9	68-0174	ค่าจ้างเหมาการพัฒนาการทำงานเชิงรุกและความร่วมมือภาคี เครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการแก้ไขปัญหาประชาชน	จ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล จำนวน 17 คน	3,000,000	0	1/5/68	30/9/68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
10	68-0001	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน ด้านทะเบียนราษฎร	ติดตั้งระบบบริหารจัดการคิวออนไลน์, เครื่องพิมพ์บัตรคิว แบบหน้าจอสัมผัส, ชุดควบคุมการแสดงผลหมายเลขคิว และประชาสัมพันธ์ข่าวสาร, อุปกรณ์เรียกหมายเลขคิว ประจำช่องบริการ แบบหน้าจอสัมผัส (Touch Screen), อุปกรณ์แสดงป้ายช่องบริการและประเมินความพึงพอใจ แบบหน้าจอสัมผัส (Touch Screen), ระบบติดตามสถานะและออกรายงาน	989,380	0	1/1/68	30/6/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง)	ไม่มี	ตามแผน
11	68-0002	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานทะเบียนราษฎร และบัตรประจำตัวประชาชน	ติดตั้งระบบคำสั่งควบคุมการทำงานระบบงานทะเบียน และติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ HARDWARE/ระบบไฟฟ้า/ อุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบงานทะเบียน	2,093,000	0	1/1/68	30/6/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง)	ไม่มี	ตามแผน
12	68-0003	โครงการปรับปรุงห้องด้านข้างห้องประชุม 401 ศาลาว่าการเมืองพัทยา	งานรื้อถอน, งานสถาปัตยกรรม, งานระบบไฟฟ้า ฯลฯ	500,000	0	1/12/67	30/5/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ระหว่างขอประเมินราคา)	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน

สำนักปลัดเมืองพัทยา

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
13	67-0339	แผนดำเนินการเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่2) (ฉบับที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567)		10,000,000	0	1/10/67	30/6/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง)	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
		โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อดูแลความปลอดภัยแนวชายหาดพัทยาและท่าเรือแหลมบาลีฮาย	จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด บริเวณแนวชายหาดและท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย, งานติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 36 ชุด, งานระบบศูนย์ควบคุมและบันทึกข้อมูล เช่น ระบบตรวจสอบวิเคราะห์ภาพ 30 ลิทรี , ลิทรีการใช้งานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 36 ลิทรี, งานระบบการสื่อสารข้อมูลและงานติดตั้ง, งานระบบไฟฟ้าและสายสัญญาณพร้อมติดตั้ง เป็นต้น							
14	67-0348	โครงการปรับปรุงศูนย์ประชาสัมพันธ์และบริการนักท่องเที่ยว	อาคารศูนย์ประชาสัมพันธ์และบริการนักท่องเที่ยวได้รับการปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานเพื่อบริการประชาชนและนักท่องเที่ยว	474,000	239,250	1/6/68	31/7/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
15	68-0234	แผนดำเนินการเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 (งบประมาณเงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)		49,644,400	0	1/10/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ทำสัญญาแล้ว)	ไม่มี	ตามแผน
		เงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถระบบรักษาความปลอดภัยและการกู้ภัยทางบก	1.เมืองพัทยาสามารถเร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวจากปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด ปัญหาแหล่งเสื่อมโทรม ปัญหาจราจร ปัญหาด้านสาธารณสุขโรค และปัญหาด้านช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางบก โดยจัดให้มีบุคลากรเพื่อปฏิบัติงาน ในฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย ภายใต้การกำกับ ดูแล และควบคุมของเจ้าหน้าที่เมืองพัทยาตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างเร่งด่วนตลอด 24 ชั่วโมง							

สำนักปลัดเมืองพัทยา

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
16	68-0235	เงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถระบบรักษาความปลอดภัยและกู้ภัยทางทะเล	และ 7 วัน ต่อสัปดาห์อย่างต่อเนื่อง 12 เดือน และพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นเป็นต้น เมืองพัทยามีบุคลากรในการรับแจ้งและช่วยสนับสนุนในการจัดการเหตุฉุกเฉินตามแนวชายหาดเมืองพัทยามีบุคลากรในการเฝ้าระวังบริเวณชายฝั่งสำหรับการดำเนินกิจกรรมทางน้ำฯ	19,581,800	0	1/10/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ทำสัญญาแล้ว)	ไม่มี	ตามแผน
17	68-0233	เงินอุดหนุนการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	-ดำเนินกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและยั่งยืนและสนองต่อนโยบายการบริหารราชการ -นักเรียนทั้ง 11 แห่งได้เข้าร่วมกิจกรรมและนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต -ประธานในชุมชน ผู้ประกอบการ ข้าราชการได้รับความรู้ วัตถุประสงค์โครงการได้เข้าร่วมกิจกรรมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และร่วมขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายของโครงการ - ดำเนินกิจกรรมเชิงรุกในการบริการตรวจสอบภาพป้องกันสารเสพติดในหน่วยงาน ราชการ/รัฐวิสาหกิจ/สถานประกอบการ/องค์กรต่างๆ/โรงเรียน/ชุมชน เพื่อเป็นต้นแบบขององค์กรคุณภาพเมืองพัทยา ปลอดภัยยาเสพติด	15,000,000	0	1/10/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ทำสัญญาแล้ว)	ไม่มี	ตามแผน
แผนดำเนินการเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3										
(กรณีเกินเงินงบประมาณเงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)										
18	67-0287	โครงการปรับปรุงการจัดระเบียบการจราจรทางทะเลและแนวเขตว่ายน้ำน้ำเมืองพัทยา 17 เขต ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 รายการ	ดำเนินการปรับปรุง ดังนี้ 1. ติดตั้งทุ่นเขตว่ายน้ำชายหาด จอมเทียน เขตว่ายน้ำน้ำที่ 1 เริ่มจาก บริเวณชายหาดหน้าอาคารทาวนเฮ้าส์	168,096,000	75,600,000	1/10/67	30/5/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน

สำนักปลัดเมืองพัทยา

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
			บ้านเลขที่ 352/17 ถนนพรตำหนัก ซอย 5 ถึงบริเวณบ้านอุ้มทองคอนโด ความยาว100เมตร ห่างจากฝั่งลงไป ในทะเล 150 เมตร 2. ติดตั้งท่อน้ำระบายน้ำชายหาด จอมเทียน เขตวายน้ำที่ 3 เริ่มจาก บริเวณชายหาดหน้าโรงแรมจอมเทียน พลาซ่าคอนโดเทล ถนนที่พระยา ความยาว 63 เมตร ห่างจากฝั่งลงไป ในทะเล 150 เมตร เป็นต้น							
19	67-0284	เงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถระบบรักษา ความปลอดภัยและการกู้ภัยทางบก	ระบบรักษาความปลอดภัยทางบกมีประสิทธิภาพมากขึ้น, จำนวนบุคลากรรักษาความปลอดภัยทางบกเพิ่มขึ้น	37,717,100	37,715,000	1/10/67	31/1/68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ตามแผน
20	67-0285	เงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถระบบรักษา ความปลอดภัยและกู้ภัยทางทะเล	มีเจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน และนักท่องเที่ยวบริเวณแนวชายหาดพัทยา หาดจอมเทียน หาดตาแหวนเกาะล้าน หรือหาดอื่นๆ ภายในเขตเมืองพัทยา (จำนวน 9 จุด เริ่ม 1 พ.ค. 67 ถึง 31 ม.ค. 68)	13,239,100	13,235,000	1/10/67	31/1/68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ตามแผน
21	67-0286	โครงการปรับปรุงโป๊ะเทียบเรือ สำหรับรับ-ส่งผู้โดยสาร บริเวณท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	โป๊ะเทียบเรือท่าที่ ๑ ขนาด ๘.๑๒ X ๓๐.๐๐ เมตร หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า๒๔๓.๖๐ ตารางเมตร, โป๊ะเทียบเรือท่าที่ ๒ ขนาด ๘.๑๒ X ๓๐.๐๐ เมตร หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า๒๔๓.๖๐ ตารางเมตร เป็นต้น	147,662,000	79,542,000	1/10/67	31/5/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
22	67-0283	เงินอุดหนุนการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด	กิจกรรมสร้างพลังเยาวชน ห่างไกลยาเสพติด จำนวน 2 รุ่น ไม่น้อยกว่า 1,300 คน 2.กิจกรรมบริการตรวจคัดกรองสารเสพติดทั้งยาบ้า และกัญชา จำนวน 10,000 ชุด	12,039,100	12,000,000	1/10/67	31/12/67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ตามแผน

สำนักปลัดเมืองพัทยา

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
23	67-0008	คำจ้างเหมาการพัฒนาการทำงานเชิงรุกและความร่วมมือภาคี เครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการแก้ไขปัญหา ประชาชน	3.งานประเมินสถานการณ์ยาเสพติดเมืองพัทยา 4 ครั้ง 4.งานพืยาสานสัมพันธ์ ด้านภัยยาเสพติด 5.งานประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อการเฝ้าระวัง และการแก้ไขปัญหาเสพติดอย่างต่อเนื่อง 6.กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังยาเสพติด (เครือข่ายด้านยาเสพติด) 7.งานสำรวจข้อมูลติดตามประเมินผลสำเร็จของโครงการ จำนวน 4,500 ชุด	3,000,000	1,196,000	1/5/68	31/7/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดที่ 6)	ไม่มี	ตามแผน
			แผนดำเนินการเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4							
			(กรณีกั้นเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)							
24	67-0009	คำจ้างเหมาบำรุงดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ฝ่ายทะเบียน ราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน	จ้างเหมาบำรุงดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา	900,000	890,000	1/10/67	30/6/68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ตามแผน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				488,445,880	224,032,900.00					

โดยงบประมาณตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักปลัดเมืองพัทยา ทั้งสิ้น จำนวน 24 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 488,445,880 บาท

สำนักคลัง

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
1	68-0282	แผนดำเนินการเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568		10,000,000	0	1/10/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขออนุมัติจัดจ้าง)	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
		ค่าจ้างเหมาสำรวจข้อมูลและปรับปรุงระบบบริหารงาน	จ้างเหมาสำรวจข้อมูลและปรับปรุงระบบบริหารงาน							
		ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะมูลฝอย	ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะมูลฝอยสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ							
2	68-0283	ค่าจ้างเหมาสำรองข้อมูลระบบโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (Disaster Recovery site)	จ้างเหมาสำรองระบบโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินสามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และข้อมูลมีความปลอดภัย	957,000	0	1/11/67	31/5/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ (จัดทำ TOR และราคากลาง)	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
3	68-0281	ค่าจ้างเหมาปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในระบบโปรแกรมแผนที่ภาษี	สำรวจข้อมูลภาคสนามและทำการปรับปรุงฐานข้อมูล, พัฒนาระบบสำรวจออนไลน์	6,500,000	0	1/1/68	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ (กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง)	ไม่มี	ตามแผน
4	68-0270	แผนดำเนินการเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 (งบประมาณเงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)		74,891,000	74,891,000	1/1/68	30/9/68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ตามแผน
		เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	เงินที่ได้รับการชดเชยสามารถนำมาใช้จ่าย ในกิจการของเมืองพัทยา							

สำนักคลัง

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
5	67-0015	แผนดำเนินการเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4		6,500,000	4,837,500	1/10/67	30/6/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
		(กรณีเกินเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)								
		คำจ้างเหมาปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในระบบโปรแกรมแผนที่ภาษี	-พัฒนาระบบสำรวจออนไลน์ -สำรวจข้อมูลภาคสนามและทำการปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษี							
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				98,848,000	79,728,500					

โดยงบประมาณตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักคลังทั้งสิ้น จำนวน 5 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 98,848,000 บาท

สำนักช่าง

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
		แผนดำเนินการเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568								
1	68-0155	โครงการจัดทำศูนย์ควบคุมสั่งการจราจร (CCTV)	เก็บข้อมูลการจราจร สถิติอุบัติเหตุ ข้อมูลภาพถ่ายทางด้านการจราจร	204,000	204,000	1/11/67	28/2/68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ตามแผน
2	68-0011	โครงการก่อสร้างติดตั้งป้ายชื่อถนนและซอยในเขตเมืองพัทยา	ติดตั้งป้ายชื่อถนนและซอยภายในเขตเมืองพัทยา จำนวน 50 ป้าย ประกอบด้วย 1. งานฐานเสา ค.ส.ล 2. งานเสาป้ายแล้วหน้าป้าย	802,000	0	1/11/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
3	68-0161	โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณถนนจอมเทียน สาย 2 ตั้งแต่แยกมัจฉานุ ถึงแยกตัดถนนสุขุมวิทจังหวัดชลบุรี	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างระบบเคเบิล ใต้ดินด้านระบบงานโยธาที่อยู่ในความรับผิดชอบของ เมืองพัทยา และระบบงานไฟฟ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตกลงจะดำเนินการย้ายระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า เดิมลงสู่ระบบเคเบิลใต้ดินเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าโดยเร็ว พร้อมทั้งรื้อถอนระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าเดิม ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้แล้วเสร็จ	94,962,970	47,481,483.33	1/11/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
4	68-0434	ค่าจ้างเหมาบริหารจัดการและควบคุมความปลอดภัย ทางลกระดับบริเวณถนนสุขุมวิท-พัทยากลาง	1.เพื่อดำเนินการควบคุมดูแลหมวดระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ได้แก่ ระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายใน “ทางลกระดับพัทยา กลาง” ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในช่วงเวลาปกติและช่วงเวลาฉุกเฉิน 2.เพื่อดำเนินการควบคุมดูแลหมวดระบบไฟฟ้าแรงสูง	2,036,000	0	1/7/68	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน

สำนักช่าง

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
			ได้แก่ ระบบไฟฟ้าแรงสูง ระบบไฟฟ้าสำรอง และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ให้สามารถทำงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพในช่วงเวลาปกติและช่วงเวลาฉุกเฉิน 3.เพื่อดำเนินการควบคุมดูแลหมวดบรรเทาภัยฉุกเฉิน ได้แก่ ระบบไฟฟ้าสำรองและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ระบบดับเพลิง คือ เครื่องสูบน้ำรักษาแรงดัน (Jockey Pump) เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) ระบบสัญญาณดับเพลิง (Fire Alarm) เป็นต้น							
		แผนดำเนินการเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1								
		(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) (ฉบับที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567)								
5	67-0371	โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แบบจอแอลอีดี บริเวณพญาเหือสามแยก มอเตอร์เวย์	ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แบบจอแอลอีดี ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 18 เมตร สูง 4 เมตร ความละเอียด ไม่น้อยกว่า P3.9 จำนวน 2 จอ, งานรื้อถอน, งานโครงสร้างป้าย, งานระบบไฟฟ้า, ฯลฯ	12,100,000	0	1/12/67	31/5/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบขอซื้อขອງ้าง)	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
6	67-0344	โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจรายละเอียดก่อสร้างริมทรัพย์ ถนนสาย ๓ 75 (ถนนพญาสาย 3 ช่วงที่ 2) และถนนสาย ๓ 74 (ซอยนาเกลือ 13) ตามประกาศคณะกรรมการนโยบาย เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง แผนผังการใช้ประโยชน์ ในที่ดินและแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ สาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2562	การสำรวจรายละเอียดก่อสร้างริมทรัพย์ถนนสาย ๓ 75 (ถนนพญาสาย 3 ช่วงที่ 2) และถนนสาย ๓ 74 (ซอยนาเกลือ 13) ตามประกาศคณะกรรมการนโยบาย เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่องแผนผังการใช้ประโยชน์ ในที่ดินและแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ สาธารณูปโภคเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2562 โดยกำหนดให้เป็นถนนก่อสร้างใหม่และถนนเดิม ขยายขนาดเขตทางกว้าง 20 เมตร ระยะทางประมาณ 3.00 กิโลเมตร	12,000,000	4,780,000	1/10/67	31/7/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน

สำนักช่าง

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
7	67-0350	โครงการปรับปรุงสนามกีฬาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดชลบุรี	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ฝั่งตะวันตก (10,000 ที่นั่ง), ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ฝั่งตะวันออก (5,000 ที่นั่ง), ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ฝั่งทิศเหนือ (3,500 ที่นั่ง)	59,132,000	0	1/11/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ระหว่างทบทวนแบบแปลนและจัดทำราคากลาง)	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
8	67-0351	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า-ประปา ภายนอก สนามกีฬาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1. งานปรับปรุงไฟส่องสนาม 2. งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายนอก 3. งานปรับปรุงระบบประปาภายนอก	10,381,000	0	1/12/68	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ระหว่างทบทวนแบบแปลนและจัดทำราคากลาง)	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
9	67-0352	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1. ดำเนินการปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม 2. ดำเนินการก่อสร้างพื้นทางเดินสวนภายใน 3. ติดตั้งม้านั่ง 4. ติดตั้งเครื่องเล่นเด็กกลางแจ้ง 5. ติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง 6. ดำเนินการก่อสร้างทางวิ่งรอบสนามกีฬา โดยวัสดุสังเคราะห์ 7. ดำเนินการก่อสร้างพื้นสนามเด็กเล่น โดยวัสดุสังเคราะห์ 8. ดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างสำหรับงานสวน 9. ดำเนินการติดตั้งระบบงานดูแลต้นไม้	50,018,000	0	1/12/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ระหว่างทบทวนแบบแปลนและจัดทำราคากลาง)	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
10	67-0353	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนพญาคิรี	ถนนกว้างประมาณ 7.00-8.00 เมตร ยาว 3,124 เมตร 1. งานผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต 2. งานฝาบ่อและรางระบายน้ำ 3. งานทาสีตีเส้น	23,000,000	0	1/1/68	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ระหว่างทบทวนแบบแปลนและจัดทำราคากลาง)	ไม่มี	ตามแผน

สำนักช่าง

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
11	67-0354	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนกอไผ่ ซอย 14	ถนนกว้างประมาณ 3.50 เมตร ยาว 148 เมตร รวมพื้นที่ประมาณ 518 ตารางเมตร ประกอบด้วย 1.งานผิวจราจรและแอสฟัลต์ติกคอนกรีต 2.งานทาสีตีเส้น	321,000	0	1/3/68	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ระหว่างลงนามในแบบแปลน)	ไม่มี	ตามแผน
12	67-0355	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนหนองใหญ่	ถนนกว้างประมาณ 5.00-6.00 เมตร ยาว 3,130 เมตร 1.งานผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต 1.งานผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต 2.งานฝาท่อและวางระบายน้ำ 3.งานทาสีตีเส้น	19,596,000	0	1/11/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ระหว่างลงนามในแบบแปลน)	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
13	67-0356	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสุขุมวิท พัทยา 32	ถนนกว้างประมาณ 7.00-8.00 เมตร ยาว 1,090 เมตร รวมพื้นที่ประมาณ 8,720 ตารางเมตร ประกอบด้วย 1.งานผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต 2.งานฝาท่อและวางระบายน้ำ 3.งานทาสีตีเส้น	10,177,000	0	1/12/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ระหว่างลงนามในแบบแปลน)	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
14	67-0357	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนพรประภาณิมิต ถึง ถนนเลียบทางรถไฟฝั่งตะวันตก	ถนนกว้างประมาณ 10.00 เมตร ยาว 535 เมตร รวมพื้นที่ประมาณ 5,350 ตารางเมตร ประกอบด้วย 1.งานผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต 2.งานฝาท่อและวางระบายน้ำ 3.งานทาสีตีเส้น เป็นต้น	6,540,000	0	1/3/68	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ระหว่างลงนามในแบบแปลน)	ไม่มี	ตามแผน

สำนักช่าง

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
15	67-0358	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนบุญสัมพันธ์	ถนนกว้างประมาณ 8.00 เมตร ยาว 840 เมตร รวมพื้นที่ประมาณ 6,720 ตารางเมตร ประกอบด้วย 1.งานผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต 2.งานฝาบ่อและรางระบายน้ำ 3.งานทาสีตีเส้น	10,026,000	0	1/11/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ระหว่างลงนามในแบบแปลน)	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
16	67-0359	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเขาตาโล	ถนนกว้างประมาณ 8.00 เมตร ยาว 848 เมตร รวมพื้นที่ 6,784 ตารางเมตร ประกอบด้วย 1.งานผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต 2.งานฝาบ่อและรางระบายน้ำ 3.งานทาสีตีเส้น	8,060,000	0	1/2/68	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ระหว่างลงนามในแบบแปลน)	ไม่มี	ตามแผน
17	67-0360	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเฉลิมพระเกียรติ ซอย 2	ถนนกว้างประมาณ 4.50-7.00 เมตร ยาว 320 เมตร รวมพื้นที่ประมาณ 2,240 ตารางเมตร ประกอบด้วย 1.งานผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต 2.งานฝาบ่อและรางระบายน้ำ 3.งานทาสีตีเส้น	2,900,000	0	1/12/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ระหว่างลงนามในแบบแปลน)	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
18	67-0361	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา บริเวณพิทยไธขซอย 10/1 (ซอยอดัม)	ขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา วางท่อ HDPE เมตร	807,000	0	1/12/67	30/4/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง)	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
19	67-0362	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา บริเวณซอยสุขุมวิทพิทย 61/1 (ชุมชนพิทยากลาง)	ขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา วางท่อ HDPE ขนาด 110 มิลลิเมตร PN 6 (class 100) ความยาว 475 เมตร	461,200	0	1/12/67	30/4/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง)	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน

สำนักช่าง

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
20	67-0363	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา บริเวณซอยมะปรางอ่อน (ข้างที่ทำการไปรษณีย์ชัยพฤกษ์)	ขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา วางท่อ HDPE ขนาด 110 มิลลิเมตร PN 6 (class 100) ความยาว 325 เมตร	270,000	0	1/12/67	30/4/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง)	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
21	67-0364	โครงการก่อสร้างติดตั้งไฟส่องสว่างถนนพิทยาสายสอง	ก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้าและโคมไฟส่องสว่าง จำนวนประมาณ 285 ต้น พร้อมฐานราก	29,873,000	0	1/1/68	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติแบบแปลน)	ไม่มี	ตามแผน
22	67-0349	โครงการติดตั้งป้ายบอกทาง ป้ายบอกสถานที่ ชนิดเสาสูง เมืองพิทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอวังสะพุง จังหวัดชลบุรี	งานติดตั้งป้าย Overhang พร้อมฐาน 13 ป้าย, งานก่อสร้างติดตั้งป้าย Overhang พร้อมฐาน (ติดตั้งคร่อมช่องจราจร 3 ช่องจราจร) 6 ป้าย, งานก่อสร้างติดตั้งป้าย Overhang พร้อมฐาน (ติดตั้งคร่อมช่องจราจร 4 ช่องจราจร) 2 ป้าย, งานก่อสร้างและติดตั้งป้ายบอกทางแยก 14 ป้าย, งานก่อสร้างและติดตั้งป้ายจราจรประเภทป้ายบังคับ 24 ป้าย	15,000,000	0	1/1/68	30/9/68	ยังไม่ได้ดำเนินการ (อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการและกำหนดราคากลาง)	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
23	67-0345	โครงการสำรวจ ออกแบบถนนสาย ฉ 85 ตามประกาศ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่องแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินและแผนผังการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเขตพัฒนา พิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2562 เมืองพิทยา จังหวัดชลบุรี	สำรวจและออกแบบรายละเอียด ด้านวิศวกรรม ด้านสถาปัตยกรรม งานระบบต่างๆ ประมาณราคาก่อสร้าง กรอบค่าใช้จ่ายในการเวนคืน จำนวนแปลงที่ดิน และพื้นที่ในการก่อสร้างถนน เพื่อให้ได้ความกว้าง 20 เมตร ตลอดเขตทาง	10,000,000	3,980,000	1/10/67	31/7/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ (เบิกจ่ายแล้ว 2 งวด)	ไม่มี	ตามแผน

สำนักช่าง

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
24	67-0346	โครงการ สำรวจ ออกแบบถนนสาย ช 9 ตามประกาศ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่องแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินและแผนผังการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก พ.ศ.2562 เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี	สำรวจและออกแบบรายละเอียด ด้านวิศวกรรม ด้านสถาปัตยกรรม งานระบบต่างๆ ประมาณราคา ค่าก่อสร้าง กรอบค่าใช้จ่ายในการเวนคืน จำนวนแปลงที่ดิน และพื้นที่ในการก่อสร้างถนน เพื่อให้ได้ความกว้าง 25 เมตร ตลอดเขตทาง	6,500,000	2,580,000	1/11/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ (เบิกจ่ายแล้ว 2 งวด)	ไม่มี	ตามแผน
แผนดำเนินการเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2										
(งบประมาณเงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)										
25	68-269	การจัดทำสัญลักษณ์จราจรบนพื้นทางและสัญลักษณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการเดินทางของประชากรเขตเศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวันออก (EEC) บริเวณถนนสายย่อย และพื้นที่เชื่อมโยง เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	จัดทำสัญลักษณ์จราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก มอก.542-2549 47,500.00 ตร.ม. เป็นต้น	58,407,900	0	1/11/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง)	ไม่มี	ตามแผน
26	68-0238	การปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดพัทยาเหนือ - ใต้ เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	งานดูแลต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาด พัทยาเหนือ - ใต้	10,329,400	10,329,400	1/10/67	31/12/67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ตามแผน
27	68-0242	โครงการก่อสร้างสนามกีฬาภาคตะวันออก ระยะที่ 4 เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	ก่อสร้างสนามกีฬาประกอบด้วย 1.อาคารสนาม 2.ลานกีฬา 3.ลู่วิ่ง 4.อาคารสนามเทนนิส (สเตเดียม) 5.อาคารสนามแข่งขันกลางแจ้ง	105,962,200	0	1/10/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างรอบ 3)	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน

สำนักช่าง

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
28	68-0252	การปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเลียบริมทางรถไฟฝั่งตะวันออก ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	แบ่งเป็นระยะ ดังนี้ 1.ระยะที่ 1 ช่วง 1 (บริเวณถนนสาย 36 – ชัยพรวิถิ) 2.ระยะที่ 1 ช่วงที่ 2 (บริเวณชัยพรวิถิ – บุญสัมพันธ์ 3.ระยะที่ 2 (บริเวณบุญสัมพันธ์ – ห้วยใหญ่)	134,400,000	0	1/12/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติในแบบแปลน)	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
29	68-0253	การปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนเลียบริม ทางรถไฟฝั่งตะวันตก ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	ค่างาน Pavement In-Place Recycling จำนวน 112,900 ตารางเมตร, งานหินคลุกบดอัดแน่น จำนวน 9,370 ลูกบาศก์เมตร, ก่อสร้างผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต จำนวน 112,900 ตารางเมตร, งานทาสีตีเส้น จำนวน 6,460 ตารางเมตร, งานอุปกรณ์อำนวยความสะดวกทุกชนิด, ฯลฯ	94,910,000	0	1/12/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติในแบบแปลน)	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
30	68-0254	การปรับปรุงทางเท้าและไฟส่องสว่างถนนพญาสาย 3 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	-เปลี่ยนบล็อคอนกรีตทางเท้าและคันหินและอื่นๆ -โคมไฟส่องสว่าง	83,200,000	0	1/12/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติในแบบแปลน)	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
31	68-0255	โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแสงสว่าง เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพด้านรักษาความปลอดภัยในเขตพื้นที่ เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	ติดตั้งโคมไฟถนนชนิด LED ขนาด 110 วัตต์ พร้อมเสา จำนวน 100 ต้น บริเวณอาคารกีฬาในร่มศูนย์กีฬาแห่งชาติ ภาคตะวันออก ขอยชัยพลกษ 2 เปลี่ยนโคมไฟถนนชนิด LED ขนาด 110 วัตต์ จำนวน 11,000 โคม บริเวณพื้นที่ เขตเมืองพัทยา ติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมโคมไฟถนน ชนิด LED กิ่งคู ขนาด 150 วัตต์ บริเวณถนนสุขุมวิท (สุขุมวิทซอย 22 แยกโพธิ์งาม)	183,520,000	0	1/12/67	31/7/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ลงนามสัญญาแล้ว)	ไม่มี	ตามแผน

สำนักช่าง

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
32	68-0256	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณชายหาด กระเทียมลาย บริเวณชายหาดจอมเทียน และบริเวณท่าเทียบเรือ ท่องเที่ยวพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	งานระบบสายส่งสายไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 4,888 เมตร, ปรับปรุงเสาไฟฟ้าแสงสว่างไฮแมส (ของเดิม), ตู้ควบคุมไฟฟ้าแสงสว่าง 3 ตู้, โคมไฟเสาตแสงแอลอีดี ขนาด 400 วัตต์ จำนวน 252 โคม	23,000,000	0	1/1/68	31/7/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ระหว่างดำเนินการทบทวนแบบแปลนให้ถูกต้อง)	ไม่มี	ตามแผน
33	68-0257	การปรับปรุงทางเท้าถนนพญาสาย 2 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	-เปลี่ยนบล็อกคอนกรีตทางเท้าและคันหินและอื่นๆ -ติดตั้งเสาไฟฟ้าและโคมไฟส่องสว่าง	36,920,000	0	1/12/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง)	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
34	68-0258	โครงการปรับปรุงลานหน้าอาคารกรีฑาในร่ม ศูนย์กีฬาแห่งชาติดิภาคตะวันออก ชอยชัยพฤกษ์ 2 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	งานรื้อถอนผิวบล็อคอนกรีตเดิม 8,610 ตารางเมตร, งานดิน ดินเดิมปรับเกลียบบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 12 เซนติเมตร หินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 12 เซนติเมตร ทรายหยาบรองพื้นคอนกรีต หนาเฉลี่ย 5 เซนติเมตร, งานคอนกรีตเสริมเหล็ก 8,610 ตารางเมตร, งานผิวกระเบื้องปูพื้น ขนาด 40 x 40 x 3.5 เซนติเมตร จำนวน 55,356 แผ่น และขอบคันหิน 477 เมตร, และงานอื่นๆ	20,000,000	0	1/12/67	30/6/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง)	วัสดุมีความผันผวน ด้านราคา	ไม่เป็นไปตามแผน
35	68-0261	การปรับปรุงโครงสร้างลาน ค.ส.ล. ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวพัทยา และสะพานท่าเทียบเรือท่องเที่ยวพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	ซ่อมแซมโครงสร้างลาน ค.ส.ล. ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวพัทยา	18,010,000	0	1/12/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติแบบแปลน และ TOR)	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
36	68-0262	การปรับปรุงทางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สุขุมวิทซอย 46/3 ถึงเฉลิมพระเกียรติซอย 18 เชื่อมพัทยาใต้ ซอย 16 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	-งานผิวจราจรแอสฟัลท์ ตึกคอนกรีต -งานฝาบ่อและรางระบายน้ำ -งานทาสีตีเส้น	14,500,000	0	1/12/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติแบบแปลน)	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน

สำนักช่าง

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
37	68-0251	โครงการก่อสร้างศูนย์ควบคุมระบบการจราจรเมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	งานก่อสร้างศูนย์ควบคุมจราจร 3 ชั้น รวมงานระบบ Fire Alarm ระบบ ดับเพลิงไฟฟ้า ประปาและปรับอากาศ ขนาด 600 ตร.ม. (16 ม x 12.5 ม) และปรับภูมิทัศน์รอบอาคารพร้อมพื้นที่จอดรถ จำนวน 150.00 ตร.ม.	80,000,000	0	1/1/68	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ระหว่างขออนุมัติคณะกรรมการฯ จังหวัด)	ไม่มี	ตามแผน
38	68-0267	โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารกรีฑาในร่มเมืองพัทยา ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก ซอยชัยพฤกษ์ 2 เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	เปลี่ยนวัสดุหลังคา อาคารกรีฑาในร่ม ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก ซอยชัยพฤกษ์ 2 ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร	30,000,000	0	1/12/67	30/6/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง)	วัสดุมีความผันผวน ด้านราคา	ไม่เป็นไปตามแผน
39	68-0236	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร	พนักงานเมืองพัทยาได้รับเงินบำนาญ เงินเดือนและเงินเพิ่มค่าตอบแทน เงินประจำตำแหน่ง เงินค่าเช่าบ้าน ฯลฯ	1,147,300	1,147,300	1/10/67	30/9/68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ตามแผน
แผนดำเนินการเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3										
(กรณีกั้นเงินงบประมาณเงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)										
40	67-0323	โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรคนข้ามถนน ในเขตเมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	1.งานจัดทำแผนการพัฒนาและปรับปรุงระบบสัญญาณ ไฟจราจรคนข้ามถนนและแผนการพัฒนาระบบแจ้งเตือน ความปลอดภัยฯ 2.งานพัฒนาและปรับปรุง รื้อถอน พร้อมติดตั้งระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรคนข้ามถนน จำนวน 19 ทางข้าม เป็นต้น	54,000,000	25,351,800	1/10/67	31/3/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน

สำนักช่าง

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
41	67-0377	โครงการปรับปรุงจอ LED วอล์คกิ้งสตรีท เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	ป้ายประชาสัมพันธ์ช่องทางเข้าฝั่งเหนือ จอ LED 3D , หมวดงานครุภัณฑ์, หมวดงานรื้อถอน, หมวดงานโครงสร้างป้าย, หมวดงานตกแต่ง, หมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบควบคุมการเล่นภาพ เป็นต้น	29,290,000	0	1/12/67	31/5/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ลงนามสัญญาแล้ว)	ไม่มี	ตามแผน
42	67-0322	โครงการก่อสร้างสนามกีฬาภาคตะวันออก ระยะที่ 4 เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	-ก่อสร้างอาคารสนาม -ก่อสร้างลานกีฬา -ก่อสร้างลู่วิ่ง -ก่อสร้างอาคารสนามเทนนิส (สเตเดียม) -ก่อสร้างอาคารสนามแข่งขันกลางแจ้ง	51,105,000	0	1/10/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างรอบที่ 3)	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
แผนดำเนินการเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4										
(กรณีเกินเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)										
43	67-0194	โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้เมืองพัทยา บริเวณซอยกอไผ่ (แยกซอยอิสลาม)	-วางท่อ HDPE ขนาด 110 มิลลิเมตร PN 6 (Class 100) ขนาด 230 เมตร -ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน ขนาด 100 มิลลิเมตร หน้าฝาท่อรอบ จำนวน 1 ตัว -ชุดดับเพลิง ขนาด 100 มิลลิเมตร รวมค่าติดตั้ง จำนวน 1 ชุด -ท่อน้ำเหล็กหล่อหน้างานปลายปากกระชัง ขนาด 200 มิลลิเมตร จำนวน 2 ตัว -ค่าแรงตัดถนน ค.ส.ล. ขนาด 230 เมตร -ค่าซ่อมถนนคอนกรีต ขนาด 115 ตารางเมตร ฯลฯ 2.ค่าขนส่ง กทม-พัทยา รถบรรทุก 10 ล้อ จำนวน 1 เที่ยว เป็นต้น	271,030	0	1/2/68	31/5/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ระหว่างยื่นอัตรการประมาณราคาและทบทวนราคากลาง)	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน

สำนักช่าง

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
44	67-0195	โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้เมืองพัทยา บริเวณซอยกอไผ่ 6/2	วางท่อ HDPE ขนาด 110 มิลลิเมตร PN 6 (Class 100) ขนาด 317 เมตร -ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน ขนาด 100 มิลลิเมตร หน้าฝาท่อรอบ จำนวน 2 ตัว -ชุดดับเพลิง ขนาด 100 มิลลิเมตร รวมค่าติดตั้ง จำนวน 1 ชุด -ท่อน้ำเหล็กหล่อหน้างานปลายปากกระชัง ขนาด 200 มิลลิเมตร จำนวน 4 ตัว -ค่าแรงติดตั้ง ค.ส.ล. ขนาด 317 เมตร -ค่าซ่อมถนนคอนกรีต ขนาด 159 ตารางเมตร ฯลฯ 2. ค่าขนส่ง กทม-พัทยา รถบรรทุก 10 ล้อ จำนวน 1 เที่ยว เป็นต้น	382,510	0	1/2/68	31/5/68 (อยู่ระหว่างยื่นการประมาณราคาและทบทวนราคากลาง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
45	67-0196	โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ให้เมืองพัทยาบริเวณซอยทุ่งกลม - ตาลหมัน 89	-วางท่อ HDPE ขนาด 110 มิลลิเมตร PN 6 (Class 100) ขนาด 382 เมตร -วางท่อ HDPE ขนาด 160 มิลลิเมตร PN 6 (Class 100) ขนาด 407 เมตร -วางท่อปลอก S ขนาด 200 มิลลิเมตร จำนวน 12 เมตร -ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน ขนาด 100 มิลลิเมตร หน้าฝาท่อรอบ จำนวน 2 ตัว -ชุดดับเพลิง ขนาด 100 มิลลิเมตร รวมค่าติดตั้ง จำนวน 1 ชุด -ท่อน้ำเหล็กหล่อหน้างานปลายปากกระชัง ขนาด 200 มิลลิเมตร จำนวน 4 ตัว -ค่าแรงติดตั้ง ค.ส.ล. ขนาด 789 เมตร	1,005,840	0	1/2/68	31/5/68 (อยู่ระหว่างยื่นการประมาณราคาและทบทวนราคากลาง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน

สำนักช่าง

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
46	67-0198	โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ให้เมืองพัทยาบริเวณซอยสุขุมวิท พัทยา 45 (แยกซอย 9/1)	-ค่าซ่อมถนนคอนกรีต ขนาด 435 ตารางเมตร ฯลฯ 2. ค่าขนส่ง กทม-พัทยา รถบรรทุก 10 ล้อ จำนวน 1 เที่ยว เป็นต้น วางท่อ HDPE ขนาด 110 มิลลิเมตร PN 6 (Class 100) ขนาด 165 เมตร -ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน ขนาด 100 มิลลิเมตร พร้อมฝาครอบ จำนวน 1 ตัว -ชุดดับเพลิง ขนาด 100 มิลลิเมตร รวมค่าติดตั้ง จำนวน 1 ชุด -ค่าคอนกรีตเหล็กยึดฝาครอบประตุน้ำ จำนวน 1 จุด -ค่าแรงตัดถนน ค.ส.ล. ขนาด 165 เมตร -ค่าซ่อมถนนคอนกรีต ขนาด 83 ตารางเมตร ฯลฯ 2. ค่าขนส่ง กทม-พัทยา รถบรรทุก 10 ล้อ จำนวน 1 เที่ยว เป็นต้น	194,680	0	1/2/68	31/5/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ระหว่างยืนยันการประมาณราคาและทบทวนราคากลาง)	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
47	67-0199	โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ให้เมืองพัทยาบริเวณซอยสุขุมวิท พัทยา 63	-วางท่อ HDPE ขนาด 110 มิลลิเมตร PN 6 (Class 100) ขนาด 709 เมตร -วางท่อปลอก S ขนาด 150 มิลลิเมตร จำนวน 6 เมตร -ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน ขนาด 100 มิลลิเมตร พร้อมฝาครอบ จำนวน 3 ตัว -ชุดดับเพลิง ขนาด 100 มิลลิเมตร รวมค่าติดตั้ง จำนวน 2 ชุด -ท่อน้ำเหล็กหล่อหน้างานปลายปากกระซัง ขนาด 300 มิลลิเมตร จำนวน 4 ตัว -ค่าแรงตัดถนน ค.ส.ล. ขนาด 709 เมตร -ค่าซ่อมถนนคอนกรีต ขนาด 355 ตารางเมตร ฯลฯ 2. ค่าขนส่ง กทม-พัทยา รถบรรทุก 10 ล้อ จำนวน 1 เที่ยว เป็นต้น	818,650	0	1/2/68	31/5/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ระหว่างยืนยันการประมาณราคาและทบทวนราคากลาง)	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน

สำนักช่าง

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
48	67-0200	โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ให้เมืองพัทยาบริเวณซอยสุขุมวิท พัทยา 83/1	-วางท่อ HDPE ขนาด 160 มิลลิเมตร PN 6 (Class 100) ขนาด 455 เมตร -วางท่อปลอก S ขนาด 200 มิลลิเมตร จำนวน 12 ตัว -ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน ขนาด 150 มิลลิเมตร พร้อมฝาครอบ จำนวน 1 ตัว -ชุดดับเพลิง ขนาด 100 มิลลิเมตร รวมค่าติดตั้ง จำนวน 1 ชุด -ท่อน้ำเหล็กหล่อหน้างานปลายปากกระชัง ขนาด 300 มิลลิเมตร จำนวน 2 ตัว -ค่าแรงตัดถนน ค.ส.ล. ขนาด 455 เมตร -ค่าซ่อมถนนคอนกรีต ขนาด 273 ตารางเมตร ฯลฯ 2. ค่าขนส่ง กทม-พัทยา รถบรรทุก 10 ล้อ จำนวน 1 เที่ยว เป็นต้น	703,560	0	1/2/68	31/5/68 (อยู่ระหว่างยืนยันการประมาณราคาและทบทวนราคากลาง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
49	67-0201	โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ให้เมืองพัทยาบริเวณซอยสุขุมวิท พัทยา 91/2	-วางท่อ HDPE ขนาด 110 มิลลิเมตร PN 6 (Class 100) ขนาด 1,075 เมตร -วางท่อปลอก S ขนาด 150 มิลลิเมตร จำนวน 6 เมตร -ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน ขนาด 100 มิลลิเมตร พร้อมฝาครอบ จำนวน 3 ตัว -ชุดดับเพลิง ขนาด 100 มิลลิเมตร รวมค่าติดตั้ง จำนวน 2 ชุด -ท่อน้ำเหล็กหล่อหน้างานปลายปากกระชัง ขนาด 300 มิลลิเมตร จำนวน 4 ตัว -ค่าแรงตัดถนน ค.ส.ล. ขนาด 1,075 เมตร -ค่าซ่อมถนนคอนกรีต ขนาด 538 ตารางเมตร ฯลฯ 2. ค่าขนส่ง กทม-พัทยา รถบรรทุก 10 ล้อ จำนวน 1 เที่ยว เป็นต้น	1,166,280	0	1/2/68	31/5/68 (อยู่ระหว่างยืนยันการประมาณราคาและทบทวนราคากลาง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน

สำนักช่าง

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
50	67-0202	โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ให้เมืองพัทยาบริเวณซอยเพนียดข้าง 4/2 และซอยเพนียดข้าง 6	-วางท่อ HDPE ขนาด 110 มิลลิเมตร PN 6 (Class 100) ขนาด 575 เมตร -วางท่อปลอก S ขนาด 150 มิลลิเมตร -ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน ขนาด 100 มิลลิเมตร พร้อมฝาครอบ จำนวน 6 ตัว -ชุดดับเพลิง ขนาด 100 มิลลิเมตร รวมค่าติดตั้ง จำนวน 2 ชุด -ท่อน้ำเหล็กหล่อหน้างานปลายปากกระชัง ขนาด 100 มิลลิเมตร จำนวน 4 ตัว -ค่าแรงตัดถนน ค.ส.ล. ขนาด 575 เมตร -ค่าซ่อมถนนคอนกรีต ขนาด 288 ตารางเมตร ฯลฯ 2. ค่าขนส่ง กทม-พัทยา รถบรรทุก 10 ล้อ จำนวน 1 เที่ยว เป็นต้น	712,210	0	1/2/68	31/5/68 (อยู่ระหว่างยืนยันการประมาณราคาและทบทวนราคากลาง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
51	67-0018	โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลสนามกีฬาภาคตะวันออก เมืองพัทยา ระยะที่ 3 จังหวัดชลบุรี (ส่วนที่เหลือ)	ก่อสร้างสนามฟุตบอลที่ได้มาตรฐานบริเวณสนามกีฬา ภาคตะวันออกเมืองพัทยาดังนี้ 1.งานฝังอัฒจันทร์ประธาน 2.งานฝังอัฒจันทร์ 2,500 ที่นั่ง (ฝังทิศใต้) 3.งานฝังอัฒจันทร์ 2,500 ที่นั่ง (ฝังทิศใต้และทิศเหนือ) 4.งานฝังอัฒจันทร์ 5,000 ที่นั่ง 5.งานซ่อมแซมของเดิมเป็นต้น	105,000,000	0	1/10/67	30/9/68 (อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณปี 2565)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				1,524,123,730	95,853,983.33					

โดยงบประมาณตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักช่าง ทั้งสิ้น จำนวน 51 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 1,524,123,730 บาท

สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
		แผนดำเนินการเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568								
1	68-0068	โครงการกีฬาสัมพันธ์สำหรับ อสม. และจิตอาสา ด้านสาธารณสุข	อสม.และจิตอาสาด้านสาธารณสุข แข่งขันกีฬาสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง โดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลาง	75,000	0	1/3/68	31/7/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
2	68-0073	โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคของประชาชนในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ในงานสมัชชาสุขภาพสากลเมืองพัทยา	กิจกรรมพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพใน งานสมัชชาสุขภาพสากลเมืองพัทยา	300,000	0	1/11/67	31/1/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
3	68-0074	โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. และจิตอาสาด้านสาธารณสุข ในการดำเนินงานเชิงรุก	-อบรมศึกษาดูงานด้านสาธารณสุข 1 ครั้ง/ปี -อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จิตอาสาด้านสาธารณสุข และเครือข่ายการดูแล สุขภาพในชุมชน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 190 คน	1,100,000	654,061.20	1/11/67	31/3/68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ตามแผน
4	68-0075	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเมืองพัทยา	อบรมสัมมนาและศึกษาดูงานปีละ 1 ครั้ง -คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 110 คน	600,000	0	1/4/68	31/8/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
5	68-0077	โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตเมืองพัทยา	ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขและแมว ไม่น้อยกว่า 2,000 ตัว, ศัลยกรรมทำหมันสุนัขและแมว ทั้งเพศผู้และเพศเมียที่อาศัยอยู่ในชุมชนในเขตเมืองพัทยา ไม่น้อยกว่า 600 ตัว	600,000	596,880	1/11/67	30/6/68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ตามแผน

สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
6	68-0078	โครงการสุขภาพดีมีสุข	ให้บริการตรวจสุขภาพฟรีตลอดชีวิตโดยผู้สูงอายุ ตรวจปีละหนึ่งครั้ง, ผลักดันให้เกิดมหรรมสุขภาพ ให้บริการประชาชน (Health Expo), ส่งเสริมสุขภาพ Wellness Center	4,000,000	45,050	1/12/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
7	68-0156	โครงการการบริหารจัดการเพื่อการสงเคราะห์สัตว์ และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ในการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด และสัตว์จรจัดในจังหวัดชลบุรี	สุนัขและสัตว์จรจัดที่ถูกทอดทิ้งในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือและจัดสวัสดิภาพสัตว์ อย่างมีมาตรฐาน, ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับความปลอดภัยจากโรคระบาดของสัตว์ที่แพร่เชื้อสู่ มนุษย์	2,000,000	0	1/3/68	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
8	68-0167	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาล ฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) ของมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน	จัดซื้อหุ่น CRP 40 ตัว ตัวละ 10,000 บาท , เครื่อง AED Trainer 10 ตัว ตัวละ 10,000 บาท, สไปนอลบอร์ด พร้อมอุปกรณ์บอร์ด 10 ชุด ชุดละ 12,000 บาท	620,000	620,000	1/1/68	30/5/68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ตามแผน
9	68-0079	โครงการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	1.การประชุมพัฒนาศักยภาพครูผู้รับผิดชอบ การดำเนินงานด้านยาเสพติดและบุหรืในสถานศึกษา 2. การเฝ้าระวังและป้องกันการแก้ไขปัญหายาเสพติดและบุหรื 3. การประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนแก่ผู้รับบริการ รวมถึงประชาสัมพันธ์สื่อความรู้ต่างๆ ด้านการบำบัดรักษาฟื้นฟูยาเสพติดและบุหรื 4. บำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและบุหรื ในสำนักงาน และในสถานศึกษา ชุมชน สถานประกอบการในเขตเมืองพัทยา	100,000	0	1/11/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน

สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
10	68-0008	โครงการก่อสร้างเพื่อขยายศูนย์ไตเทียมโรงพยาบาลเมืองพัทยา	5.การดำเนินการศูนย์คัดกรองเมืองพัทยา 6. การอบรมพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่อาสาสมัครเชี่ยวชาญยาเสพติดและบุหรี่ เพื่อขยายพื้นที่สำหรับรองรับผู้รับบริการที่เข้ามา รับบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม	6,990,000	0	1/10/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
11	68-0076	โครงการพัฒนาศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)	-นิเทศติดตามการดำเนินงานอย่างน้อย 3ครั้ง/ปี/แห่ง -สนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ให้กับ ศสมช. เมืองพัทยา จำนวน 33 แห่ง -ประชาชนในพื้นที่ 42 ชุมชน ได้รับการดูแลสุขภาพ	80,000	44,700	1/12/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
แผนดำเนินการเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4										
(กรณีเกินเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)										
12	67-0022	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการแพทย์และการ สาธารณสุข เพื่อดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนเมืองพัทยา	-ระบบบริหารสิทธิ์ผู้ใช้งาน -ระบบบริหารการเชื่อมโยงข้อมูล 43 แฟ้มข้อมูล ด้านสุขภาพ จากระบบโรงพยาบาล ประกอบด้วย -แฟ้มสะสมงาน จำนวน 10 แฟ้ม -แฟ้มบริการ จำนวน 25 แฟ้ม -แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ จำนวน 15 แฟ้ม -แฟ้มตามนโยบาย จำนวน 1 แฟ้ม -แฟ้มแก้ไข จำนวน 1 แฟ้ม -ระบบบริหารปฏิทินบริการสุขภาพ -ระบบบริหารจัดการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์	9,900,000	0	1/2/68	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน

สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
			-ระบบบริหารจัดการไฟล์ข้อมูลผู้รับบริการด้านสุขภาพ -ระบบบริการการเชื่อมโยงผู้รับบริการด้านสุขภาพผ่าน Line Pattaya Connect -เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 3 เครื่อง -ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 3 ลิขสิทธิ์ -เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 3 เครื่อง -กล้องเว็บแคม จำนวน 3 ตัว -คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (512GB) ขนาดหน้าจอ (12) จำนวน 20 เครื่อง -การติดตั้ง การเชื่อมโยงระบบ ปรับเปลี่ยน และทดสอบ -การฝึกอบรม ผู้ดูแลระบบ พนักงานและเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่รับผิดชอบ							
		แผนดำเนินการเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5								
		(กองทุนหลักประกันสุขภาพเมืองพัทยา)								
13	68-0437	โครงการสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรค	1.กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อความปลอดภัย การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 2.กิจกรรมอบรมสัมฤทธิ์เชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ เสริมทักษะการมีส่วนร่วม 3.กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การป้องกันควบคุมโรคติดต่อ	268,040	226,240	1/2/68	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน

สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
14	68-0438	โครงการป้องกันควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	1.กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ป้องกันโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 2.กิจกรรมเชิงรุกในการป้องกันโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 3.กิจกรรมรณรงค์สร้างกระแสความตื่นตัวและค่านิยมทางสังคม	136,455	29,355	1/2/68	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
15	68-0439	โครงการสร้างการมีส่วนร่วมเครือข่ายการดูแลสุขภาพ เพื่อประชาชนทุกกลุ่มวัยสุขภาพดี	ดำเนินงาน 3 กิจกรรม ดังนี้ 1. อบรมวิชาการ "การดูแลสุขภาพประชาชนเชิงรุก" จำนวน 6 ครั้ง 2. อบรมเชิงปฏิบัติการ "ความคิดเชิงบวกอย่างสร้างสรรค์ สู่ความสำเร็จในการทำงาน" จำนวน 1 ครั้ง 3. พัฒนาศักยภาพ การใช้ประโยชน์จาก "แอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม." ในการดูแลสุขภาพประชาชน จำนวน 4 ครั้ง (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)	1,116,500	80,600	1/2/68	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
16	68-0440	โครงการป้องกันและควบคุมโรคปริสติดหนองพยาธิ	1.กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคปริสติดหนองพยาธิ แก่นักเรียนในสถานศึกษาและกลุ่มเสี่ยง 2.กิจกรรมสอบสวนโรคและควบคุมโรคปริสติดหนองพยาธิ โรคปริสติดหนองพยาธิ	83,600	40,600	1/2/68	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
17	68-0441	โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเมืองพัทยา	1.ส่งเสริมทักษะการดูแลสุขภาพ เกิดการแลกเปลี่ยน ทัศนคติและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพที่เหมาะสม ตามวัย 2.สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม	423,300	74,610	1/2/68	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน

สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
18	68-0442	โครงการส่งเสริมทักษะการมีสุขภาพเด็กวัยเรียน ในสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา	ส่งเสริมภาพลักษณ์ และความรู้สึกรักมีคุณค่าในตนเอง 3. สนับสนุนการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการพัฒนาระบบการ ส่งเสริมสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 1.นักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพ รักษาพยาบาลเบื้องต้น และคำแนะนำการปฏิบัติตัว 2.ส่งเสริมทักษะการดูแลสุขภาพอนามัยส่วนบุคคล เพื่อป้องกันการมีเหาและแพร่กระจายสู่ผู้อื่น 3. ส่งเสริมทักษะด้านโภชนาการเด็กวัยเรียนที่มีภาวะอ้วน 4.เฝ้าระวังปัญหาสุขภาพสายต่านักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา	164,700	0	1/3/68	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
19	68-0443	โครงการเฝ้าระวังตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี และซีในพื้นที่เมืองพัทยา	1.กิจกรรมตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี และซีในพื้นที่เมืองพัทยา	38,005	38,005	1/2/68	30/9/68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ตามแผน
20	68-0444	โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ อุบัติใหม่ - อุบัติซ้ำ ในพื้นที่เมืองพัทยา	กิจกรรมที่ 1 การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ อุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ กิจกรรมที่ 1.1 กิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคติดต่ออุบัติใหม่- อุบัติซ้ำ แก่ตัวแทนในสถานประกอบการ (สปา) (สวิงพัทยา) มุลนิธิซิสเตอร์ ศูนย์ชุมชนคนข้ามเพศ เป็นต้น กิจกรรมที่ 1.2 กิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคติดต่ออุบัติใหม่- อุบัติซ้ำ แก่ตัวแทนองค์กรอิสระ ได้แก่ เครือข่ายสุขภาพ และโอกาส Hon house พัทยา มูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ	109,015	64,015	1/3/68	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน

สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
21	68-0445	โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ในพื้นที่เมืองพัทยา	กิจกรรมที่ ๑ การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 1.1 กิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ นำโดยแมลงในพื้นที่เสี่ยงของชุมชนเมืองพัทยา 1.2 กิจกรรมนิเทศติดตามเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม โรคติดต่อนำโดยแมลงในศาสนสถาน สถานศึกษา และสถานประกอบการในเขตเมืองพัทยา เป็นต้น	443,505	343,560	1/3/68	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
22	68-0446	โครงการโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน	1.กิจกรรมสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคตามเกณฑ์กำหนด ได้แก่ Flu แก่กลุ่มเสี่ยง MMR แก่เด็กเรียนป.1 dT แก่นักเรียนป.1 ป.6 และในวัยผู้ใหญ่ HPV แก่นักเรียนหญิงป.5 2.กิจกรรมสอบสวนโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน 3.กิจกรรมสุศึกษาประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การป้องกัน โรคติดต่อที่ป้องกันโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน	84,890	73,650	1/2/68	31/9/25	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
23	68-0447	โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคจากสัตว์ฟันแทะ (หนู) ในพื้นที่เมืองพัทยา	กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องโรคที่เกิดจาก สัตว์ฟันแทะ (หนู) แก่ตัวแทนสมาชิกเครือข่ายเฝ้าระวัง สอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว (SRRT เมืองพัทยา) และจิตอาสา กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมป้องกันและกำจัดสัตว์ฟันแทะ (หนู) กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมสำรวจประชากรสัตว์ฟันแทะ (หนู) เป็นต้น	280,480	480	1/3/68	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				29,513,490	2,931,806.20					

โดยงบประมาณตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น จำนวน 23 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 29,513,490 บาท

สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
		แผนดำเนินการเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568								
1	68-0004	โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดบริเวณชายหาดพัทยา	ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดบริเวณชายหาดพัทยา	6,298,880	0	1/2/68	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ (รอประชุมคณะกรรมการจังหวัด)	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
2	68-0293	ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลเมืองพัทยา ระยะ 5 (พ.ศ. 2569 - 2573)	จ้างที่ปรึกษาเข้ามาศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติทางด้านดิจิทัลเพื่อเมืองพัทยาเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City)	3,500,000	0	1/3/68	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
3	68-0310	ค่าจ้างเหมาบริการเชื่อมต่อวงจรสื่อสารอินเทอร์เน็ตเมืองพัทยา	จ้างเหมาบริการเชื่อมต่อวงจรสื่อสารอินเทอร์เน็ต	4,500,000	0	1/10/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ทำสัญญาแล้ว)	ไม่มี	ตามแผน
4	68-0352	ค่าจ้างเหมาเอกชนเพื่อให้บริการเช่าระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (งานเช่าระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด)	ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดทดแทนระบบเดิมจำนวน 940 กล้อง	45,509,000	0	1/10/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
5	68-0311	ค่าจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเมืองพัทยา	ดูแลบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเมืองพัทยาให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง	10,000,000	2,368,917.84	1/10/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
6	68-0314	ค่าจ้างเหมาบริการต่ออายุการใช้งาน Application Social Media Package รายปี	จ้างเหมาบริการต่ออายุการใช้งาน Application Social Media Package รายปี เพื่อให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง	5,600,000	1,312,500	1/10/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน

สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
		แผนดำเนินการเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1								
		(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) (ฉบับที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567)								
7	67-0336	โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในจุดเสี่ยงภัยของเมืองพัทยา	ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในจุดเสี่ยงภัยของเมืองพัทยา จำนวน 54 กล้อง, งานระบบบริหารจัดการบันทึกสัญญาณภาพ 1 ระบบ, งานระบบไฟฟ้าและสายใยแก้วนำแสง 1 งาน	10,300,000	0	1/1/68	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ระหว่างจัดทำ TOR และประเมินราคา)	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
8	67-0337	โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพื้นที่ชุมชนเมืองพัทยา ระยะที่ 2	ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพื้นที่ชุมชนเมืองพัทยา จำนวน 107 กล้อง, ระบบบริหารจัดการบันทึกสัญญาณภาพ, งานระบบไฟฟ้าและสายใยแก้วนำแสง	12,896,000	0	1/12/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ระหว่างจัดทำ TOR และประเมินราคา)	ไม่มี	ตามแผน
9	67-0338	โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในอาคารของหน่วยงานสังกัดเมืองพัทยา	ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 207 กล้อง, งานระบบบริหารจัดการบันทึกสัญญาณภาพ 1 ระบบ, งานระบบไฟฟ้าและสายนำสัญญาณใยแก้วนำแสง 1 งาน เป็นต้น	14,953,000	0	1/12/67	31/8/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ระหว่างจัดทำ TOR และประเมินราคา)	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
		แผนดำเนินการเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2								
		(งบประมาณเงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)								
10	68-0259	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในพื้นที่อาคารกรรทไนรม์ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก ซอยชัยพฤกษ์ 2 เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ เช่น ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 264 ชุด เป็นต้น	57,629,000	0	1/10/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน

สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
11	67-0282	แผนดำเนินการเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3		35,000,000	31,185,000	1/10/67	31/1/68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ตามแผน
		(กรณีกันเงินงบประมาณเงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)								
		โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสายนำสัญญาณ	ดำเนินการติดตั้งสายนำสัญญาณใยแก้วนำแสงลงใต้ดิน							
		ใยแก้วนำแสงแบบฝังใต้ดิน ระยะที่ 6 (ระยะสุดท้าย) เมืองพัทยา	ระยะที่ 6,7,8							
		ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 รายการ								
12	67-0012	แผนดำเนินการเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4		4,500,000	4,500,000	1/12/67	30/9/68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ตามแผน
		(กรณีกันเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)								
		คำจ้างเหมาบริการเชื่อมต่อวงจรสื่อสารอินเทอร์เน็ตเมืองพัทยา	จ้างเหมาบริการเชื่อมต่อวงจรสื่อสารอินเทอร์เน็ตสำหรับหน่วยงานเมืองพัทยา							
13	67-0013	คำจ้างเหมาเอกชนเพื่อให้บริการเช่าระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (งานเช่าระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด)	เช่าระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดติดตั้งในเขตพื้นที่เมืองพัทยา	45,582,000	7,474,619	1/10/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				256,267,880	46,841,036.84					

โดยงบประมาณตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ ทั้งสิ้น จำนวน 13 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 256,267,880 บาท

สำนักงานการศึกษา

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
		แผนดำเนินการเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568								
1	68-0042	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนและการแสดงผลงานทางการศึกษาของนักเรียนและพนักงานครูสังกัดเมืองพัทยา	-จัดการโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับเมืองพัทยา -จัดการโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาค -จัดการโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา -จัดการโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศ	1,000,000	0	1/5/68	30/9/68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
2	68-0044	โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการสำหรับนักเรียนในสังกัดเมืองพัทยา	จัดค่ายทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในสังกัดเมืองพัทยา	100,000	0	1/3/68	30/5/68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
3	68-0045	โครงการพัฒนาสมรรถนะทางการเรียนระดับชาติของนักเรียนสังกัดเมืองพัทยา	ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะทางการเรียนระดับชาติของนักเรียนสังกัดเมืองพัทยา	200,000	134,401.80	1/3/68	30/5/68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ตามแผน
4	68-0047	โครงการความร่วมมือทางวิชาการในการจัดการศึกษาของเมืองพัทยา	-เข้าร่วมกิจกรรม/ศึกษาดูงาน	10,000	0	1/3/68	30/5/68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
5	68-0048	โครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเมืองพัทยา	-จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อดำเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา สู่การพัฒนาเทคโนโลยีและปฏิรูปการศึกษาในปัจจุบัน	400,000	393,576	1/10/67	28/2/68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ตามแผน
6	68-0049	โครงการวันครู	-ดักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง -พิธีสงฆ์ -จัดพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์	200,000	194,500	1/11/67	31/1/68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ตามแผน

สำนักงานการศึกษา

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด			
7	68-0051	โครงการสุขภาพพื้นที่ มีสุข	-อบรมให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา	10,000	0	1/5/68	30/6/68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
8	68-0055	โครงการจัดการเรียนรู้ด้านอาชีพของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา	จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น 4 สัปดาห์ และจัดกิจกรรมเราทำได้	500,000	0	1/5/68	31/8/68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
9	68-0057	โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดเมืองพัทยา	การเตรียมพร้อมรับการประเมินภายนอก	100,000	0	1/4/68	30/6/68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ตามแผน
10	68-0061	โครงการพัฒนานวัตกรรมและสมรรถนะการคิดขั้นสูง	การพัฒนาครูภาษาไทยการสอนด้วย Phenomenon Based	300,000	172,536	1/10/67	31/5/68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ตามแผน
11	68-0062	โครงการมหกรรมแนะแนวศึกษาต่อและเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย	การจัดมหกรรมแนะแนวศึกษาต่อ	2,000,000	0	1/5/68	31/7/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
12	68-0063	โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษ	อบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา สังกัดเมืองพัทยา	300,000	0	1/7/68	31/8/68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
13	68-0064	โครงการสัปดาห์ห้องสมุด	จัดนิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุด เพื่อเยาวชนและประชาชน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สามารถนำความรู้มาพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จากแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญคือ ห้องสมุดประชาชนสัมพันธ์ ทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ	100,000	0	1/4/68	31/8/68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
14	68-0067	โครงการอบรมให้ความรู้การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับปฐมวัยในสังกัดเมืองพัทยา	-การบรรยายให้ความรู้ประกอบสื่อต่าง ๆ -จัดกิจกรรมกลุ่มย่อย/ฝึกปฏิบัติ/ระดมความคิดร่วมกัน -นำเสนอผลงาน และสรุปกิจกรรม	50,000	0	1/5/68	30/6/68	ยกเลิก (โอนไปทำโครงการอื่น)	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน

สำนักงานการศึกษา

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด			
15	68-0371	ค่าจ้างเหมาครูชาวต่างประเทศสอนภาษาอังกฤษ สำหรับโรงเรียนเมืองพัทยาสังกัดเมืองพัทยา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จ้างครูชาวต่างประเทศสอนภาษาอังกฤษ สำหรับโรงเรียน สังกัดเมืองพัทยา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1,500,000	0	1/10/67	31/1/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
16	68-0104	โครงการกิจกรรมร่วมน้ำเยาวชนเมืองพัทยา	จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ เขตเมืองพัทยาให้มีทักษะพื้นฐานของการร่วมน้ำเพื่อสามารถ ช่วยเหลือตนเองได้จากอุบัติเหตุทางน้ำ	500,000	0	1/10/67	28/2/68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
17	68-0106	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนภายในสังกัดเมืองพัทยา	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬานักเรียนภายในสังกัดเมืองพัทยา	700,000	233,125	1/11/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
18	68-0110	โครงการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเยาวชน	จัดการแข่งขันกีฬาให้เด็กเยาวชนในเขตเมืองพัทยา	800,000	500,000	1/5/68	31/8/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
19	68-0111	โครงการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ของโรงเรียน ในสังกัดเมืองพัทยา	ฝึกอบรมและพัฒนาลูกเสือเนตรนารีให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบเสียสละมีระเบียบวินัยมีความสามัคคี สร้างสรรค์สังคมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ มีโอกาสมุ่งมั่นมิตรกับลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนอื่น ในสังกัดเมืองพัทยา	1,300,000	1,183,440	1/11/67	31/1/68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ตามแผน
20	68-0122	โครงการจัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ	จัดกิจกรรมวันเยาวชนให้เด็กและเยาวชนตระหนัก ถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเองรู้จักสิทธิ และตระหนัก ว่าตนเองเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสำคัญต่อการพัฒนา ประเทศชาติต่อไปในอนาคต	200,000	0	1/7/67	30/9/68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน

สำนักงานการศึกษา

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด			
21	68-0113	โครงการประกวดแข่งขันวงดนตรีเยาวชนเมืองพัทยา	จัดประกวดแข่งขันวงดนตรีเยาวชนเพื่อเป็นการผลักดันยกระดับศักยภาพทางดนตรีของเยาวชนให้มีความก้าวหน้าทัดเทียมเยาวชนในระดับภาคและระดับประเทศได้	500,000	463,300	1/1/68	31/3/68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ตามแผน
22	68-0114	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จัดงานวันเด็กโดยมีเด็กและเยาวชนในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา	1,500,000	1,491,300	1/12/67	28/2/68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ตามแผน
23	68-0115	โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน	จัดกิจกรรมอบรมทักษะพื้นฐานด้านกีฬา, นันทนาการ และจัดการแข่งขันกีฬาให้แก่สมาชิกศูนย์เยาวชนเมืองพัทยา เช่น ฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ เทนนิส อบรมดนตรี English summer camp ฯลฯ	1,000,000	137,400	1/1/68	31/3/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
24	68-0117	โครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้านภาพยนตร์เยาวชนพัทยา	อบรมให้ความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบเกี่ยวกับการเขียนบทการกำกับและถ่ายทำภาพยนตร์สั้น	200,000	0	1/7/68	30/9/68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
25	68-0118	โครงการเข้าค่ายเยาวชนอบรมคุณธรรม จริยธรรม (ภาคฤดูร้อน) สำหรับเยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลามในเขตเมืองพัทยา	-จัดกิจกรรมอบรมเยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลาม	200,000	0	1/3/68	31/5/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
26	68-0127	โครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่	ประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุและสามเณร ในโอกาส วันขึ้นปีใหม่ ในวันที่ 1 มกราคม 2567 ณ ลานเอนกประสงค์ สวนสาธารณะลานโพธิ์นาเกลือ, วัดชัยมงคลพระอารามหลวง พัทยาใต้ และถนนเลียบริมชายหาดจอมเทียน มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม	150,000	0	1/12/67	31/1/68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ตามแผน

สำนักงานการศึกษา

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
27	68-0128	โครงการประเพณีวันสงกรานต์จังหวัดชลบุรี	กิจกรรมร่วมกับอำเภอบางละมุงเข้าร่วมงานประเพณีวันสงกรานต์จังหวัดชลบุรี	150,000	0	1/3/68	30/4/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
28	68-0130	โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา	กิจกรรมด้านสุขภาพ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ซึ่งการนวดฝ่าเท้าและการทำลูกประคบสมุนไพร เป็นการช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต ฯลฯ ให้แก่เยาวชน นักเรียน และคณะครู บุคลากรทางการศึกษา	200,000	0	1/6/68	30/7/68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
29	68-0133	โครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ	1.กิจกรรมถวายความจงรักภักดีของข้าราชการในพื้นที่ อำเภอบางละมุงและประชาชนทุกหมู่เหล่า (ร่วมถวายพานพุ่มดอกไม้สดและกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมอำเภอบางละมุง)	100,000	0	1/11/67	31/12/67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
30	68-0134	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมาเด็จพระบรมราชินี พันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม	1.กิจกรรมถวายความจงรักภักดีของข้าราชการในพื้นที่ อำเภอบางละมุงและประชาชนทุกหมู่เหล่า (ร่วมถวายพานพุ่มดอกไม้สดและกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมอำเภอบางละมุง)	100,000	0	1/7/68	31/8/68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
31	68-0135	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมาเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐	1.กิจกรรมถวายความจงรักภักดีของข้าราชการในพื้นที่ อำเภอบางละมุงและประชาชนทุกหมู่เหล่า (ร่วมถวายพานพุ่มดอกไม้สดและกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมอำเภอบางละมุง)	100,000	0	1/6/68	31/8/68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน

สำนักงานการศึกษา

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
32	68-0136	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมาเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน	1.กิจกรรมถวายความจงรักภักดีของข้าราชการในพื้นที่ อำเภอบางละมุงและประชาชนทุกหมู่เหล่า (ร่วมถวายพานพุ่มดอกไม้สดและกิจกรรมจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมอำเภอบางละมุง)	100,000	0	1/5/68	30/6/68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
33	68-0137	โครงการวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในวัน คล้ายวันเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ เป็นพระเจ้ากรุงธนบุรี	400,000	338,500	1/11/67	31/1/68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ตามแผน
34	68-0139	โครงการส่งเสริมศาสนาคุณธรรมและจริยธรรม	กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนสังกัดเมืองพัทยา	350,000	0	1/5/68	30/7/68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
35	68-0165	โครงการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตเยาวชนเมืองพัทยา	จัดกิจกรรมอบรมทักษะกีฬาอีสปอร์ตและจัดการแข่งขันกีฬา อีสปอร์ตให้กับเยาวชนเมืองพัทยา	500,000	0	1/6/68	30/9/68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
36	68-0166	โครงการส่งเสริมนักกีฬาเยาวชนสังกัดเมืองพัทยาในระดับต่างๆ สู่ความเป็นเลิศ	จัดกิจกรรมอบรมทักษะพื้นฐานด้านกีฬา, นันทนาการ และจัดการแข่งขันกีฬาให้แก่สมาชิกศูนย์เยาวชนเมืองพัทยา เช่น ฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ เทนนิส อบรมดนตรี English summer camp ฯลฯ	3,500,000	3,925,736.28	1/1/68	28/2/68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ตามแผน
37	68-0168	โครงการประกวดวาดภาพทัศนศิลป์ เมืองพัทยา (สภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา)	กิจกรรมประกวดภาพทัศนศิลป์	270,000	270,000	1/5/68	30/6/68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ตามแผน
38	68-0169	โครงการอนุรักษ์มรดกไทย (สภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา)	กิจกรรมอนุรักษ์มรดกไทย	1,273,000	1,273,000	1/3/68	30/4/68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ตามแผน
39	68-0431	โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ วัดใหม่สำราญเกาะล้าน	ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ วัดใหม่สำราญเกาะล้าน จำนวน 1 หลัง	1,500,000	1,500,000	1/3/68	30/4/68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ตามแผน

สำนักงานการศึกษา

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
40	68-0053	โครงการการศึกษาสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต	อบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ประชาชนในชุมชนเขตเมืองพัทยา	150,000	0	1/6/68	30/7/68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
41	68-0066	โครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับประชาชน	จัดอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารให้กับประชาชน ในเมืองพัทยา	500,000	128,750	1/11/67	31/3/68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ตามแผน
42	68-0103	โครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E)	จัดกิจกรรมต่อต้านการใช้ยาเสพติดนักเรียนชั้น ป.5 ของโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา	400,000	398,320	1/10/67	30/4/68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ตามแผน
43	68-0120	โครงการงานประเพณีลอยกระทงเมืองพัทยา	1. การประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับ เมืองพัทยา 2. การประกวดประชันกระทงจากวัสดุธรรมชาติ 3. การแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมไทย 4. การแสดงวงดนตรีที่มีชื่อเสียงจากศิลปิน และ/หรือ นักร้องที่มีศักยภาพและเป็นที่ยอมรับ 5. การตกแต่งสถานที่ให้สวยงาม สื่อถึงงานวันลอยกระทง	2,500,000	2,005,850	1/10/67	31/12/68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ตามแผน
44	68-0119	โครงการงานประเพณีกองข้าวเมืองพัทยา	สวนสาธารณะลานโพธิ์ นาเกลือ หรือสถานที่อื่น ๆ ที่เมืองพัทยากำหนด -การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านและการละเล่นพื้นบ้าน ประกอบด้วย การแข่งขันยิงหนังสติ๊ก ตะกร้อลอดห่วง วิบาก -การสาธิตกีฬาพื้นบ้าน มวยตำบลจาก -การบวงสรวงเทวดา ผีป่า นางฟ้า -การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย และการแสดงวงดนตรีลูกทุ่ง	2,000,000	0	1/3/68	30/4/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน

สำนักงานการศึกษา

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด			
45	68-0123	โครงการตกแต่งเกวียนกันชนงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี	วัดหนองใหญ่ -ก่อกองพระเจดีย์ทราย -การบวงสรวงเทวดา ผีป่า นางฟ้า -การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย	150,000	150,000	1/10/67	31/11/24	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ตามแผน
46	68-0129	โครงการประเพณีวันไหลนาเกลือ	-พิธีเจริญพระพุทธมนต์ -พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง -พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป -พิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ -การแสดงศิลปวัฒนธรรม -ขบวนแห่รูปขาคติ	500,000	0	1/3/68	30/4/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
47	68-0132	โครงการลานวัฒนธรรมเมืองพัทยา	1. การแสดงดนตรีไทยและนาฏศิลป์ วิถีชีวิตของชุมชนเมืองพัทยา ด้านวัฒนธรรม,ศิลปหัตถกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 2. ชุมจำลองวิถีชีวิตของชุมชนเมืองพัทยา ด้านวัฒนธรรม,ศิลปหัตถกรรม,ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเผยแพร่ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม นาฏศิลป์ – ดนตรี ภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองพัทยา	500,000	499,000	1/12/67	28/2/68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ตามแผน
48	68-0138	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวประเพณีวันไหลเมืองพัทยา	จัดพิธีตักบาตรอาหารแห้ง, จัดพิธีสรงน้ำพระ, จัดพิธีรดน้ำผู้สูงอายุ, จัดขบวนรูปขาคติ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 10,000 คน	1,800,000	0	1/3/68	31/5/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน

สำนักงานการศึกษา

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
49	68-0054	โครงการจัดการเรียนรู้ด้านการจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา ในสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา	จัดอบรมการจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา เก็บขยะชายหาด มาคัดแยก และสามารถนำมาประดิษฐ์แปรรูป เป็นจานรองแก้ว กระถางต้นไม้ และบล็อกพลาสติก เป็นต้น	100,000	99,965	1/12/67	28/2/68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ตามแผน
50	68-0006	โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียนและงานวัดผลการศึกษา แบบออนไลน์ของโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา	จัดซื้อระบบงานทะเบียนและงานวัดผลการศึกษาแบบออนไลน์ของโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา จำนวน 1 โครงการ	3,025,000	0	1/11/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
51	68-0046	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษ สำหรับพนักงานครูและพนักงานจ้างสังกัดเมืองพัทยา	จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษให้แก่พนักงานครูและพนักงานจ้างสังกัดเมืองพัทยา (อบรมออนไลน์)	500,000	0	1/4/68	30/6/68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
52	68-0050	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	หลักเงินให้โรงเรียนเมืองพัทยา 1 - 11	34,334,040	22,258,970	1/10/67	31/5/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
53	68-0052	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น (Performance Agreement : PA)	-อบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน Performance Agreement (PA)	200,000	0	1/3/68	30/4/68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
54	68-0056	โครงการนำร่องหลักสูตรการเรียนการสอนด้านภาพยนตร์	พัฒนาเทคนิคการสอนด้านภาพยนตร์	500,000	488,894	1/10/67	28/2/68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ตามแผน
55	68-0058	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา	ออกแบบการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน	200,000	0	1/2/68	30/4/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน

สำนักงานการศึกษา

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุนที่เริ่มต้น	ระบุนที่สิ้นสุด			
56	68-0059	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพครูปฐมวัย ในสังกัดเมืองพัทยา	-การบรรยายให้ความรู้ประกอบสื่อต่าง ๆ -จัดกิจกรรมกลุ่มย่อย/ฝึกปฏิบัติ/ระดมความคิดร่วมกัน -ศึกษาดูงาน -นำเสนอผลงาน และสรุปกิจกรรม	200,000	0	1/4/68	31/5/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
57	68-0060	โครงการพัฒนาทักษะครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา	การออกแบบการจัดการเรียนรู้สู่ศึกษาและพลศึกษา และการพัฒนาการสอน STEM	200,000	199,832	1/10/67	28/2/68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ตามแผน
58	68-0065	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูปฐมวัยด้านการส่งเสริม ทักษะสมอง Executive Function (EF) สำหรับเด็กปฐมวัย สังกัดเมืองพัทยา	-การบรรยายให้ความรู้ประกอบสื่อต่าง ๆ -จัดกิจกรรมกลุ่มย่อย/ฝึกปฏิบัติ/ระดมความคิดร่วมกัน -นำเสนอผลงาน และสรุปกิจกรรม	70,000	0	1/5/68	30/6/68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
59	68-0007	โครงการปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนเมืองพัทยา 1	ปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนเมืองพัทยา 1	8,080,000	0	1/6/68	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
60	68-0043	โครงการพัฒนาทักษะการสอนของพนักงานครูเพื่อยกระดับ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติของนักเรียน	สัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะการสอน ของพนักงานครูเพื่อยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติของนักเรียน	10,000	0	1/3/68	31/7/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
แผนดำเนินการเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่2) (ฉบับที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567)										
61	67-0340	โครงการบูรณาการระบบเสียงประกาศและประชาสัมพันธ์ ผ่านเครือข่ายเน็ตเวิร์ค (IP Broadcasting) ภายในพื้นที่โรงเรียน สังกัดเมืองพัทยา	จัดซื้อระบบเสียงประกาศและประชาสัมพันธ์ผ่าน เครือข่ายเน็ตเวิร์ค (IP Broadcasting) ภายในพื้นที่โรงเรียน สังกัดเมืองพัทยา จำนวน 5 ระบบๆ 2,405,430 บาท	12,027,150	0	1/3/68	31/7/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน

สำนักงานการศึกษา

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
		แผนดำเนินการเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2								
		(งบประมาณเงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)								
62	68-0214	เงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม)	จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้นักเรียนในสังกัดเมืองพัทยา	16,848,100	16,848,100	1/10/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
63	68-0217	ค่าหนังสือเรียน	จัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับนักเรียนในสังกัดเมืองพัทยา	10,069,400	10,069,400	1/1/68	30/6/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
64	68-0218	ค่าจัดการเรียนการสอน	เบิกค่าจัดการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา	39,997,000	39,997,000	1/10/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
65	68-0219	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	เบิกค่าเครื่องแบบนักเรียนให้นักเรียนในสังกัดเมืองพัทยา	5,840,700	5,840,700	1/10/67	30/5/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
66	68-0220	ค่าอุปกรณ์การเรียน	เบิกค่าอุปกรณ์การเรียนให้นักเรียนในสังกัดเมืองพัทยา	6,057,300	6,057,300	1/10/67	30/5/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
67	68-0225	เงินอุดหนุนค่าบริหารจัดการการศึกษา	เบิกค่าบริหารจัดการการศึกษา เช่น ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน เป็นต้น สำหรับโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา	34,536,500	34,536,500	1/10/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
68	68-0247	โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาและเพิ่มพูนทักษะในการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล โรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา จำนวน 11 แห่ง ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	จัดหาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา และเพิ่มพูนทักษะ พร้อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับโรงเรียน ในสังกัดเมืองพัทยา ทั้ง 11 โรงเรียน	81,271,100	0	1/4/68	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
69	68-0423	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	เบิกหลักหักส่งค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้แก่โรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา	9,655,800	9,655,800	1/10/67	30/5/68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ตามแผน

สำนักงานการศึกษา

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด			
70	68-0424	เงินอุดหนุนค่าจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน	เบิกจ่ายค่าจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน ให้แก่โรงเรียนในสังกัด	500,000	500,000	1/10/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
71	68-0428	เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน	เบิกผลหักส่งเงินค่าอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน ในสังกัดเมืองพัทยา	40,734,700	40,734,700	1/10/67	30/5/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
72	68-0425	เงินอุดหนุนค่าจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อเยาวชน	จัดกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ด้านดนตรีและศิลปะ ในเขตพื้นที่เมืองพัทยา	880,000	880,000	1/11/67	31/1/68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ตามแผน
73	68-0426	เงินอุดหนุนค่าจัดกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	จัดกิจกรรมค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียน ในสังกัดเมืองพัทยา จำนวน 5 รุ่น	1,045,000	1,045,000	1/11/67	31/7/68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ตามแผน
74	68-0427	เงินอุดหนุนค่าจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตบอล เปตอง เซปักตะกร้อ เป็นต้น	881,600	881,600	1/5/68	31/8/68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ตามแผน
75	68-0221	เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)	เบิกเงินเดือนให้กับครูในสังกัดเมืองพัทยา	219,966,500	219,966,500	1/10/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
76	68-0222	เงินอุดหนุนสำหรับค่าจ้างประจำบุคลากรทางการศึกษา	เบิกเงินเดือนให้แก่ลูกจ้างประจำสังกัดเมืองพัทยา	529,500	529,500	1/10/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
77	68-0224	เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	เบิกค่าการศึกษาบุตรให้แก่ผู้มีสิทธิในสังกัดเมืองพัทยา	1,586,600	1,586,600	1/10/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
78	68-0422	เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ)	เบิกจ่ายค่าบำเหน็จ บำนาญ ให้แก่ผู้มีสิทธิในสังกัดเมืองพัทยา	92,563,800	92,563,800	1/10/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน

สำนักงานการศึกษา

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
79	68-0215	เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่ารักษาพยาบาล)	เบิกเงินค่ารักษาพยาบาลให้กับคุณครูหรือผู้มีสิทธิ ในสังกัดเมืองพัทยา	15,589,200	15,589,200	1/10/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
		แผนดำเนินการเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3								
		(กรณีเกินเงินงบประมาณเงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)								
80	67-0310	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมระหว่างอาคารเรียน โรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพทยาเหนือ) เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง		25,000,000	1,632,000	1/12/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
81	67-0311	โครงการจัดหาครุภัณฑ์สื่อเทคโนโลยี เพื่อยกระดับคุณภาพ การเรียนการสอนในชั้นเรียนของสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 รายการ	จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา	47,700,000	0	1/12/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
82	67-0312	โครงการพัฒนาการเพิ่มศักยภาพการให้บริการอินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาและระบบเสียงประกาศผ่านเครือข่ายเน็ตเวิร์ค โรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 รายการ	เพิ่มศักยภาพการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา และระบบเสียงประกาศผ่านเครือข่ายเน็ตเวิร์ค โรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา	27,200,000	0	1/11/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				768,761,990	537,354,096.08					

โดยงบประมาณตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักงานการศึกษา ทั้งสิ้น จำนวน 80 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 768,761,990 บาท

สำนักช่างสุขาภิบาล

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
		แผนดำเนินการเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568								
1	68-0012	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยเชื่อมซอยเทพประสิทธิ์ 7 (ข้างฟลามิงโก)	งานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ HDPE ขนาด Ø 800 มม. (SN6) พร้อมบ่อพักระบายน้ำ ค.ส.ล. ความยาวรวม ไม่น้อยกว่า 314 เมตร โดยมีจำนวนบ่อพักไม่น้อยกว่า 30 บ่อ พร้อมฝาเหล็กหล่อ เป็นต้น	5,640,000	0	1/11/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง)	การสืบราคาวัสดุ	ไม่เป็นไปตามแผน
2	68-0013	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมผิวจราจร ค.ส.ล. ซอย เชื่อมซอยบุญยัถ์ภูงา 1 เชื่อมซอย บุญยัถ์ภูงา 3	งานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพักระบายน้ำ ค.ส.ล. ความ ยาวรวมไม่น้อยกว่า 364 เมตร โดยมีจำนวนบ่อพักไม่น้อยกว่า 35 บ่อ พร้อมฝาเหล็กหล่อ เป็นต้น	4,370,000	0	1/11/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง)	การสืบราคาวัสดุ	ไม่เป็นไปตามแผน
3	68-0014	โครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยเชื่อมซอยบุญยัถ์ภูงา 4 (หลังตลาดแม่ละอ)	งานทาสีตีเส้น คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 58 ตารางเมตร, งานติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างแบบกึ่งจับ จำนวนไม่น้อยกว่า 9 ชุด, งานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพักระบายน้ำ ค.ส.ล. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 397 เมตร เป็นต้น	4,860,000	0	1/11/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง)	การสืบราคาวัสดุ	ไม่เป็นไปตามแผน
4	68-0015	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยเชื่อมซอยสุขุมวิท-พญา 73 (หมู่บ้านอยู่สุข)	งานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร. พร้อมบ่อพักระบายน้ำ ค.ส.ล. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 360 เมตร โดยมีจำนวนบ่อพักไม่น้อยกว่า 36 บ่อ พร้อมฝาเหล็กหล่อ เป็นต้น	4,730,000	0	1/11/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง)	การสืบราคาวัสดุ	ไม่เป็นไปตามแผน

สำนักช่างสุขาภิบาล

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
5	68-0016	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยเชื่อมถนนชัยพฤกษ์ 2 (ข้างหมู่บ้านเดอะกรีน พาร์ค จอมเทียน)	งานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ HDPE ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 600 มม.(SN6) พร้อมบ่อพักระบายน้ำ ค.ส.ล. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 44 เมตร เป็นต้น	5,140,000	0	1/11/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง)	การสืบราคาวัสดุ	ไม่เป็นไปตามแผน
6	68-0017	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยหนองกระบอก ซอย 2	งานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ HDPE ขนาด Ø 600 มม. (SN6) พร้อมบ่อพักระบายน้ำ ค.ส.ล. ความยาวรวม ไม่น้อยกว่า 123 เมตร โดยมีจำนวนบ่อพักไม่น้อยกว่า 13 บ่อ พร้อมฝาทะลักท่อ เป็นต้น	2,130,000	0	1/11/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง)	การสืบราคาวัสดุ	ไม่เป็นไปตามแผน
7	68-0018	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมผิวจราจร ค.ส.ล ซอยเชื่อมซอยหนองใหญ่ 2 (เขื่องพาร์ทเมนต์ เดอะแพนโคร่า แฮลส์)	งานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ HDPE ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 600 มม.(SN6) พร้อมบ่อพักระบายน้ำ ค.ส.ล. ความยาวรวม ไม่น้อยกว่า 44 เมตร เป็นต้น	1,050,000	0	1/11/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง)	การสืบราคาวัสดุ	ไม่เป็นไปตามแผน
8	68-0019	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมผิวจราจร ค.ส.ล โรงเรียนเมืองพัทยา 1	งานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ HDPE ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 800 มม. (SN6) พร้อมบ่อพักระบายน้ำ ค.ส.ล ความยาวรวม ไม่น้อยกว่า 739 เมตร โดยมีจำนวนบ่อพักไม่น้อยกว่า 73 บ่อ พร้อมฝาทะลักท่อ เป็นต้น	13,970,000	0	1/11/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง)	การสืบราคาวัสดุ	ไม่เป็นไปตามแผน
9	68-0020	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยข้างสวนสาธารณะ ซอยชัยพฤกษ์4 (หนองโพรง)	งานก่อสร้างบ่อรวมน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 5.00x5.00x2.10 เมตร. จำนวน 1 บ่อ, งานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ HDPE ขนาด Ø 1,000 มม. (SN6) พร้อมบ่อพักระบายน้ำ ค.ส.ล. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 722 เมตร โดยมีจำนวนบ่อพัก ไม่น้อยกว่า 67 บ่อ พร้อมฝาทะลักท่อ เป็นต้น	26,800,000	0	1/11/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง)	การสืบราคาวัสดุ	ไม่เป็นไปตามแผน

สำนักช่างสุขาภิบาล

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
10	68-0021	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมผิวจราจร ค.ส.ล. ซอย เชื่อมซอยสุขุมวิท-พญา 21(ทางเข้าหมู่บ้านงามเจริญ 14)	งานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ HDPE ขนาด Ø 800 มม. (SN6) พร้อมบ่อพักระบายน้ำ ค.ส.ล. ความยาวรวม ไม่น้อยกว่า 574 เมตร. โดยจำนวนบ่อพักไม่น้อยกว่า 54 บ่อ พร้อมฝาเหล็กหล่อ เป็นต้น	15,100,000	0	1/11/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง)	การสืบราคาวัสดุ	ไม่เป็นไปตามแผน
11	68-0022	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมผิวจราจร ค.ส.ล. ซอย เชื่อมถนนพญาสาย 3 (ข้างไทยอุดมอพาร์ทเมนต์)	งานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักระบายน้ำ ค.ส.ล. ความยาวรวมบ่อพัก ไม่น้อยกว่า 152 เมตร โดยมีจำนวนบ่อพักไม่น้อยกว่า 15 บ่อ พร้อมฝาเหล็กหล่อ เป็นต้น	1,910,000	0	1/11/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง)	การสืบราคาวัสดุ	ไม่เป็นไปตามแผน
12	68-0023	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยเชื่อมซอยสุขุมวิท-พญา 2	งานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักระบายน้ำ ค.ส.ล. ความยาวรวม ไม่น้อยกว่า 99 เมตร โดยมีจำนวนบ่อพักไม่น้อยกว่า 11 บ่อ พร้อมฝาเหล็กหล่อ เป็นต้น	1,100,000	0	1/11/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง)	การสืบราคาวัสดุ	ไม่เป็นไปตามแผน
13	68-0024	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยเชื่อมถนนสุขุมวิท (ซอยมะปรางอ่อน)	งานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ HDPE ขนาด Ø 800 มม. (SN6) พร้อมบ่อพักระบายน้ำ ค.ส.ล. ความยาวรวม ไม่น้อยกว่า 324 เมตร เป็นต้น	5,860,000	0	1/11/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง)	การสืบราคาวัสดุ	ไม่เป็นไปตามแผน
14	68-0025	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยนาเกลือ 16/3	งานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ HDPE ขนาด Ø 600 มม. (SN6) พร้อมบ่อพักระบายน้ำ ค.ส.ล. ความยาวรวม ไม่น้อยกว่า 648 เมตร เป็นต้น	9,680,000	0	1/11/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง)	การสืบราคาวัสดุ	ไม่เป็นไปตามแผน

สำนักช่างสุขาภิบาล

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
15	68-0026	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและบ่อสูบล้อม พร้อมผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยข้างเพนียดช้าง 2 (ตรงข้ามพิทยาสถา สป่า แอนด์ มาสซาง)	งานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ HDPE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 800 มม.(SN6) พร้อมบ่อพักระบายน้ำ ค.ส.ล. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 251 เมตร เป็นต้น	8,920,000	0	1/12/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง)	การสืบราคาวัสดุ	ตามแผน
16	68-0027	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและบ่อสูบล้อม พร้อม ผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยเชื่อมซอยเทพประสิทธิ์ 17	งานก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. ความกว้างประมาณ 4.40-5.75 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 287 เมตร เป็นต้น	11,200,000	0	1/12/68	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง)	การสืบราคาวัสดุ	ตามแผน
17	68-0028	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและบ่อสูบล้อม พร้อม ผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยสุขุมวิท-พญา 34 (โรงเรียนต้นตารักษ์)	งานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร. พร้อมบ่อพักระบายน้ำ ค.ส.ล. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 448 เมตร เป็นต้น	10,350,000	0	1/12/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง)	การสืบราคาวัสดุ	ตามแผน
18	68-0092	โครงการรณรงค์จัดการน้ำเสียชุมชนด้วยชุมชน	การอบรมเพื่ออธิบายในรายละเอียดข้อกฎหมายที่บังคับ ใช้เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้มีความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น	40,000	0	1/12/67	31/7/68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
19	68-0312	คำจ้างเหมาบริการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพ น้ำคลองและคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งในเขตเมืองพญา	ตรวจสอบคุณภาพน้ำในคลองกระทิงลาย คลองนกยาง คลองนาเกลือ คลองสองหนองปรือและห้วยเสือเผ่นและ จัดทำรายงานการตรวจสอบเผยแพร่คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง	500,000	0	1/11/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
20	68-0429	งานจ้างเหมาเอกชนดูแลจัดล้างท่อระบายน้ำ	ดำเนินการจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมทั้งกฎกระทรวงระเบียบและประกาศ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	2,000,000	0	1/12/67	30/6/68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน

สำนักช่างสุขาภิบาล

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
21	67-0369	แผนดำเนินการเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1		30,000,000	0	1/3/68	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง)	การสืบราคาวัสดุ	ตามแผน
		(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่2) (ฉบับที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567)								
		โครงการเชื่อมต่อระบบระบายน้ำถนนเลียบริมทางรถไฟฝั่งตะวันออกเมืองพัทยา ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	-งานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ HDPE (SN6) ขนาด 1,200 มม. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 430 ม. โดยมีบ่อพักไม่น้อยกว่า 44 บ่อ พร้อมฝาเหล็กหล่อ -งานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ HDPE (SN6) ขนาด 600 มม. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 244 บ่อ โดยมีจำนวนบ่อพักไม่น้อยกว่า 23 บ่อ พร้อมฝาเหล็กหล่อ -งานก่อสร้างรางระบายน้ำกว้าง 0.75 เมตร ยาว 7.40 เมตร พร้อมติดตั้งฝาเหล็กหล่อ จำนวน 7 ชุด -งานก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 6.30 - 14.80 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 337 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,555 ตารางเมตร เป็นต้น							
22	67-0370	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานและห้องประชุม โรงพยาบาลน้ำเสียวัดหนองใหญ่	ดำเนินการดังนี้ 1.หมวดงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม จำนวน 1 งาน 2.หมวดงานสวน จำนวน 1 งาน 3.หมวดงานเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายใน จำนวน 1 งาน 4.หมวดงานสุขภัณฑ์ จำนวน 1 งาน 5.หมวดงานระบบไฟฟ้า สื่อสาร และประปา จำนวน 1 งาน 6.หมวดงานอื่นๆ จำนวน 1 งาน	18,000,000	0	1/1/68	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ระหว่างจัดทำแบบแปลน)	การสืบราคาวัสดุ	ตามแผน

สำนักช่างสุขาภิบาล

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
23	68-0239	แผนดำเนินการเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2		56,110,700	33,234,700	1/10/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
		(งบประมาณเงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)								
		โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หาดนาจอมเทียน เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	1. ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำท่อ ค.ส.ล. ชนิดเหลี่ยมขนาด 3.00 x 3.00 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 3,220 เมตร 2. ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำท่อ ค.ส.ล. ชนิดเหลี่ยม ขนาด 1.80 x 1.80 เมตร ความยาวรวม ไม่น้อยกว่า 970 เมตร 3. ก่อสร้างวางท่อระบบไฟฟ้าใต้ดิน ท่อ ค.ส.ล. ชนิดเหลี่ยมขนาด 0.60x1.50 เมตร โดยมีความยาวรวม ไม่น้อยกว่า 4,270 เมตร 4. งานซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. ความหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 29,890 ตารางเมตร 5. งานก่อสร้างลาน ค.ส.ล. ความหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 18,710 ตารางเมตร 6. งานปรับปรุงเสาโคมไฟ จำนวน 40 แห่ง 7. งานปูทางเท้าพร้อมพื้นฐาน คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 21,350 ตารางเมตร							
24	68-0241	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนสุขุมวิทบริเวณพญาใต้ ถึงซอยชัยพฤกษ์ 3 (ถนนสุขุมวิทพญา 54) เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	1.ก่อสร้างบ่อสูรับระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 5.00x50.00 เมตร ความลึกไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร จำนวน 2 บ่อ 2.ก่อสร้างบ่อรับน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 6.00x10.00 เมตร ความลึกไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร จำนวน 1 บ่อ 3.ก่อสร้างวางท่อแรงดัน HDPE ขนาด ๑ 1,000 มม. (PE100 PN10) ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 3,644 เมตร 4.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ HDPE ขนาด ๑ 1,400 มม.	20,131,900	6,251,600	1/10/67	28/2/68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ตามแผน

สำนักช่างสุขาภิบาล

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
25	68-0240	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยเทพประสิทธิ์ 9 เชื่อมขยายหาดจอมเทียน เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	(SN6) ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 1,493 เมตร 5.งานเครื่องสูบ 750 ลิตร/วินาที กำลังไฟ 200 kw จำนวน 2 ชุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 6.งานเครื่องสูบ 1100 ลิตร/วินาที กำลังไฟ 450 kw จำนวน 2 ชุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 7.งานขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งหม้อแปลงขนาด 500 KVA และติดตั้งมิเตอร์ จำนวน 1 จุด 8.งานขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งหม้อแปลงขนาด 1250 KVA และติดตั้งมิเตอร์ จำนวน 1 จุด	22,282,600	0	1/10/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
26	68-0243	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนเลียบริมทางรถไฟ ฝั่งตะวันออก ระยะที่ 2 เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	-งานวางท่อแรงดัน HDPE ขนาด 1,200 มิลลิเมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 1,995 เมตร เป็นต้น	88,147,800	0	1/10/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
27	68-0244	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย พื้นที่พัทยา และนาเกลือ เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	1. ก่อสร้างโครงสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ถังตกทราย (Vertex Grit Chamber) จำนวน 1 ถัง เป็นต้น	85,000,000	0	1/10/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน

สำนักช่างสุขาภิบาล

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
28	68-0245	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบป้องกันน้ำท่วมเมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	1. จัดทำโปรแกรมบริหารจัดการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยน้ำท่วม จำนวน 1 ระบบ 2. ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดระดับน้ำและอัตราการไหลของน้ำอัตโนมัติ จำนวน 50 ชุด 3. ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดระดับน้ำฝนอัตโนมัติ รวม 10 ชุด 4. ติดตั้งห้องวางแผนและปฏิบัติการหลัก (Main War room) ณ โรงบำบัดน้ำเสีย หนองใหญ่ จำนวน 1 ระบบ	54,180,000	0	1/10/67	30/9/68 (อยู่ระหว่างขออนุมัติคณะกรรมการคอมพิวเตอร์จังหวัด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
29	68-0246	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำฝนสถานีสูบน้ำ PS12 เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	งานก่อสร้าง Over Head Crane พร้อมโครงสร้างรับรางเครน และฐานราก ประกอบด้วย 1.1 รอกโซ่ไฟฟ้ายกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 7.5 เมตริกตัน ยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร จำนวน 1 ชุด 1.2 ชุดมอเตอร์ขับเคลื่อน - ขวาว จำนวน 1 ชุด เป็นต้น	90,000,000	0	1/10/67	30/9/68 (อยู่ในกระบวนการด้านพัสดุ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
แผนดำเนินการเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3										
(กรณีเกินเงินงบประมาณเงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)										
30	67-0324	การก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนเลียบริมทางรถไฟฝั่งตะวันออก ระยะที่ 1 เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	งานก่อสร้างวางท่อเหล็กระบายน้ำรับแรงดันขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1,800 มม. 14 มม. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 1,047 เมตร ทดสอบระบบสูบล้าง	164,771,400	62,150,800	1/10/67	31/3/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
31	67-0325	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ขอยเทพประสิทธิ์ 9 เชื่อมขยายหาดจอมเทียน เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	ก่อสร้างระบบระบายน้ำเทพประสิทธิ์ ขอย 9 เชื่อมขยายหาดจอมเทียน เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	47,600,000	0	1/10/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน

สำนักช่างสุขาภิบาล

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
32	67-0327	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนเลียบริมทางรถไฟฝั่งตะวันออก ระยะที่ 2 เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	1.งานวางท่อแรงดัน HOPE ขนาด 1,200 มิลลิเมตร ความยาวรวมไม่น้อย 2.งานวางท่อ HOPE ชนิดลอนเสริมเหล็ก ขนาด 1,800 มิลลิเมตร พร้อมต่อปากปิดเหล็กหล่อจำนวน 38 ชุด ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 1,750 เมตร 3.งานวางท่อ HOPE ชนิดลอนเสริมเหล็ก ขนาด 2,200 มิลลิเมตร พร้อมต่อปากปิดเหล็กหล่อจำนวน 23 ชุด ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 1,068 เมตร เป็นต้น	42,000,000	40,485,000	1/10/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
33	67-0328	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียพื้นที่พัทยาและนาเกลือ เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	ก่อสร้างปรับปรุงและขยายระบบบำบัดน้ำเสียเมืองพัทยา ขยายหนองใหญ่ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	45,000,000	0	1/10/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
34	67-0329	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าสถานีสูบน้ำป้องกันน้ำท่วมเมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 รายการ	จัดหาและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบสถานีสูบน้ำป้องกันน้ำท่วม จำนวน 5 แห่งได้แก่ 1.สถานีสูบน้ำสุขุมวิทพัทยา45 SUIMP1) 2.สถานีสูบน้ำสุขุมวิทพัทยา75 SUMP2) 3.สถานีสูบน้ำสุขุมวิทพิทยاب้านเขาน้อย (SUMP3) 4.สถานีสูบน้ำสุขุมวิทพิทยาบ้านเขาตาโล (Sump4) 5.สถานีสูบน้ำสุขุมวิทพิทยาบ้านชัยพฤกษ์ (SUMP5)	60,000,000	8,000,100	1/10/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน

สำนักช่างสุขาภิบาล

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
35	67-0330	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำฝนสถานีสูบน้ำ PS7 เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 รายการ	1.งานก่อสร้าง OVER Head Crane พร้อมโครงสร้างรับราง เครนและฐานราก 2.งานก่อสร้างประตูน้ำ SLuice Gate ขนาดความกว้าง ไม่น้อยกว่า 2 เมตร พร้อมโครงสร้างและชุดตู้ควบคุมไฟฟ้า 3.งานครุภัณฑ์ งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุม เครื่องสูบน้ำ	55,000,000	54,850,100	1/10/67	30/4/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
แผนดำเนินการเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4										
(กรณีเกินเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)										
36	67-0081	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยเชื่อมซอยสุขุมวิท - พัทยา 91/1 เชื่อมถนนเลียบริมทางรถไฟ	จัดจ้างก่อสร้าง 1. วางท่อระบายน้ำ HDPE ขนาด 800 มม. ความยาว 1560 เมตร บ่อพัก 153 บ่อ 2. ก่อสร้างบ่อรวมน้ำขนาด 4.00*4.00 เมตร จำนวน 3 บ่อ 3. ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. หน้า 0.20 เมตร พื้นที่ 4759 ตารางเมตร	24,720,000	0	1/10/67	31/7/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
37	67-0082	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยเชื่อมซอยเทพประสิทธิ์ 5 (ตรงข้ามซอยเทพประสิทธิ์ 5/1)	จัดจ้างก่อสร้าง 1. วางท่อระบายน้ำ HDPE ขนาด 800 มม. ความยาว 38 เมตร บ่อพัก 5 บ่อ 2. ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร พื้นที่ 129 ตารางเมตร	670,000	669,900	1/10/67	31/12/67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ตามแผน

สำนักช่างสุขาภิบาล

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
38	67-0083	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมฝิวจราจร ค.ส.ล. หมู่บ้านเกตุทิพย์พัฒนา	จัดจ้างก่อสร้าง 1. วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 400 มม. ความยาว 146 เมตร บ่อพัก 16 บ่อ 2. วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 600 มม. ความยาว 296 เมตร บ่อพัก 34 บ่อ 2. ก่อสร้างฝิวจราจร ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร พื้นที่ 1085 ตารางเมตร	4,670,000	4,266,500	1/10/67	31/12/67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ตามแผน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				1,043,634,400	209,908,700.00					

โดยงบประมาณตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักช่างสุขาภิบาลทั้งสิ้น จำนวน 38 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 1,043,634,400 บาท

สำนักสวัสดิการสังคม

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
		แผนดำเนินการเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568								
1	68-0098	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา	จัดอบรม/กิจกรรมสตรีที่อยู่ในเขตเมืองพัทยา	100,000	0	1/4/68	30/6/68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
2	68-0099	โครงการสรรหาผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น	จัดพิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณ 1 ครั้ง	50,000	0	1/6/68	30/9/68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
3	68-0080	โครงการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเมืองพัทยา	ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคนพิการเมืองพัทยา	2,000	840	1/1/68	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
4	68-0081	โครงการช่วยเหลือบุคคลไร้ที่พึ่งในเขตเมืองพัทยา	บุคคลไร้ที่พึ่งในเขตเมืองพัทยามีคุณภาพชีวิตที่ดี, เพื่อช่วยเหลือให้บุคคลไร้ที่พึ่งได้มีที่พักพิงอย่างปลอดภัย, เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับเมืองพัทยา และลดปัญหาบุคคลไร้ที่พึ่งในเขตเมืองพัทยา, เพื่อส่งเสริมให้บุคคลไร้ที่พึ่งมีแนวทางในการดำเนินชีวิต ที่ถูกต้องเหมาะสม	50,000	31,270	1/10/67	30/9/68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ตามแผน
5	68-0082	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	ช่วยเหลือประชาชนที่ได้ ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรงชีพ หรือประสบปัญหาทางสังคมในด้านต่างๆ	20,000	19,455.39	1/10/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
6	68-0083	โครงการสงเคราะห์อุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการและผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย	จัดหาอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับสภาพความพิการของคนพิการและผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย	10,000	0	1/2/68	30/6/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน

สำนักสวัสดิการสังคม

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
7	68-0084	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	ดำเนินการอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	50,000	0	1/3/68	30/7/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
8	68-0085	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ดำเนินการอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	50,000	0	1/3/68	30/7/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
9	68-0086	โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพัฒนาสังคมเมืองพัทยา	เครือข่ายพัฒนาสังคมและสังคมสงเคราะห์ทั้งภาครัฐและเอกชนในเขตเมืองพัทยาและพื้นที่ใกล้เคียง, ประชาชนในเขตเมืองพัทยาที่ทำงานด้านสังคมสงเคราะห์	150,000	0	1/2/68	30/6/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
10	68-0157	โครงการพัฒนาสู่การพึ่งพาตนเองในเด็กและเยาวชน (มูลนิธิคุณ พอเรย์)	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้มูลนิธิคุณพอเรย์ เพื่อให้เด็กได้รับรู้และเข้าใจวิธีการดูแลตนเองทางด้านกายใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม โดยได้รับการเติมเต็มตามศักยภาพ มีพฤติกรรมที่เหมาะสมตามวัย มีสุขอนามัยที่ดี และได้ฝึกทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต	225,000	225,000	1/10/67	30/9/68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ตามแผน
11	68-0158	โครงการส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการและบริหารจัดการสำนักงานศูนย์จัดหางานคนพิการพระมหาไถ่ (มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อพัฒนาคนพิการ)	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้มูลนิธิพระมหาไถ่ เพื่อพัฒนาคนพิการ มีงบประมาณในการบริหารจัดการ และสามารถให้บริการแก่ผู้รับบริการได้อย่างยั่งยืน	500,000	500,000	1/10/67	30/9/68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ตามแผน
12	68-0159	โครงการส่งเสริมพัฒนาการและฝึกอาชีพสำหรับบุคคลบกพร่องสติปัญญาออทิสติกและสมองพิการ (มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ)	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้มูลนิธิพระมหาไถ่ เพื่อการพัฒนาคนพิการ เพื่อให้ผู้รับบริการช่วยเหลือตนเองได้ในชีวิตประจำวัน และเป็นการเตรียมความพร้อมและฝึกอาชีพสำหรับบุคคลบกพร่องสติปัญญา	272,000	272,000	1/10/67	30/9/68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ตามแผน

สำนักสวัสดิการสังคม

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
13	68-0160	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรม เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี (สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี)	ออทิสติกและสมอง คนพิการสู่การมีงานทำ สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้สำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดชลบุรี เพื่อให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจาก ประสบสาธารณภัยและผู้ด้อยโอกาส ได้รับการช่วยเหลือ อย่างทัน่วงทีและมีคุณภาพชีวิตที่ดี	200,000	200,000	1/10/67	30/9/68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ตามแผน
14	68-0093	โครงการประชาคมและจัดทำแผนชุมชนประจำปี	สำรวจข้อมูลเชิงลึกและประชาคมทำแผนชุมชน 42 ชุมชน จำนวน 1 ครั้ง/ปี	70,000	65,624	1/11/67	30/7/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
15	68-0095	โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนและจัดตั้ง ชุมชนย่อยในเขตเมืองพัทยา	จัดการเลือกตั้งกรรมการชุมชนที่ครบวาระ	100,000	11,760	1/10/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
16	68-0164	โครงการติดตั้งป้ายชื่อชุมชน ในเขตเมืองพัทยา	ติดตั้งป้ายชุมชน จำนวน 42 ป้าย ขนาด 100x50 ซม. (แบบมีเสาคู่)	1,300,000	0	1/12/67	28/2/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
17	68-0094	โครงการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ อย่างยั่งยืน	จัดอบรม พัฒนา ผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มอาชีพ วิชาชีพชุมชน กลุ่ม PATTAYA BRAND และประชาชนทั่วไปที่สนใจ ในเขตเมืองพัทยานุเคราะห์การร่วมกับEEC SELECT	100,000	98,475	1/10/67	31/12/67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ตามแผน
18	68-0096	โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน	จัดฝึกอบรมการทำสื่อโซเชียลมีเดีย ให้กับกลุ่มชุมชน ในเขตพื้นที่เมืองพัทยา	100,000	0	1/5/68	30/7/68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน

สำนักสวัสดิการสังคม

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
19	68-0097	โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	จัดอบรมและศึกษาดูงานให้กับกลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจและผู้ประกอบการรายย่อย	100,000	98,578	1/12/67	28/2/68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ตามแผน
20	68-0101	โครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป	จัดฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไปในเขตเมืองพัทยา	700,000	226,936	1/11/67	30/6/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
21	68-0100	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพ คณะกรรมการชุมชนผู้นำชุมชนและผู้นำท้องถิ่นในเขต เมืองพัทยา	คณะกรรมการชุมชนผู้นำชุมชนและผู้นำท้องถิ่น จากกลุ่มต่างๆ ในเขตเมืองพัทยาทั้ง 42 ชุมชน	3,900,000	2,248,565	1/10/67	31/12/67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ตามแผน
แผนดำเนินการเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2										
(งบประมาณเงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)										
22	68-0230	เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	1.สร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ เป็นการแบ่งเบา ภาระ ค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน 2.ส่งเสริมให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาล ผ่านการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	118,138,800	58,702,100	1/10/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
23	68-0231	เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	1.จัดสวัสดิการให้แก่คนพิการและทุพพลภาพ เป็นการแบ่งเบาภาระ ค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน 2.ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่คนพิการและทุพพลภาพ ให้ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลผ่านการจ่ายเงิน เบี้ยยังชีพความพิการ	13,802,400	7,573,000	1/10/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน

สำนักสวัสดิการสังคม

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
24	68-0232	เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	สร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่มีรายได้ ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ และทำให้ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	1,950,000	1,950,000	1/10/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				141,940,200	72,223,603.39					

โดยงบประมาณตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักสวัสดิการสังคม ทั้งสิ้น จำนวน 24 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 141,940,200 บาท

สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
		แผนดำเนินการเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568								
1	68-0398	ค่าจ้างเหมาตรวจวัดติดตามคุณภาพอากาศชนิดเคลื่อนย้าย Trailer Mobile	ติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศชนิดเคลื่อนย้าย Trailer Mobile จำนวน 1 สถานี โดย ต้องดำเนินการเคลื่อนย้ายตรวจวัดคุณภาพอากาศ ไม่น้อยกว่า 10 จุดให้ครอบคลุมพื้นที่เมืองพัทยา	2,357,800	704,187.28	1/10/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
2	68-0146	โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านพลังงานทางเลือก	ประชาชน ชุมชน บุคลากรสถานศึกษาในเขตเมืองพัทยา	40,000	0	1/12/67	30/4/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
3	68-0148	โครงการพืชมืองคาร์บอนต่ำ	ชุมชนเมืองพัทยา ผู้ประกอบการ ประชาชน และนักท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยา	100,000	0	1/7/68	30/8/68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
4	68-0149	โครงการฟื้นฟูธรรมชาติเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	จัดทำแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนในทะเล เพาะพันธุ์สัตว์และอนุบาลสัตว์วัยอ่อน จัดหาพันธุ์สัตว์น้ำขนาดเล็กและปล่อยสัตว์น้ำกลับสู่ทะเล เพิ่มพื้นที่สีเขียวและสิ่งแวดล้อมบริเวณลานโพธิ์และลานจอดรถ รักษาความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาดสวยงาม	100,000	0	1/12/67	30/8/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
5	68-0151	โครงการอนุรักษ์ป่าโกงกางคลองนกยาง คลองนาเกลือ และพื้นที่โดยรอบ	จ้างบุคลากรดูแลพื้นที่คลองนกยาง 2 คนประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้นำชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณคลองนกยาง	200,000	0	1/12/67	31/7/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน

สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
6	68-0089	โครงการดำเนินกิจกรรมปลูกพันธุ์กรรมพืชในพื้นที่สาธารณะ และพื้นที่สวนสาธารณะของเมืองพัทยา เพื่อร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	จัดกิจกรรมดังต่อไปนี้, กิจกรรมปลูกพันธุ์กรรมพืช, กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมพันธุ์กรรมพืช, กิจกรรมปลูกรักษาพันธุ์กรรมพืช, กิจกรรมอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์พันธุ์กรรมพืช, กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุ์กรรมพืช	300,000	0	1/3/68	30/4/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
7	68-0091	โครงการรวมพลังร่วมพัฒนาพิทยาน่าอยู่น่ามอง ขยะ คูคลอง (Big Cleaning)	ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะในเขตเมืองพัทยา	100,000	0	1/1/68	30/8/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง)	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
8	68-0297	ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการในกิจการที่เกี่ยวข้องกับสวนสาธารณะ	จ้างเหมาแรงงานเพื่อตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ ตัดหญ้า	300,000	0	1/7/68	30/8/68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
9	68-0298	ค่าจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดและบำรุงรักษาสวนสาธารณะของเมืองพัทยา	จัดจ้างเหมาเอกชนเข้ามาดูแลและบำรุงรักษาสวนสาธารณะของเมืองพัทยา จำนวน 10 แห่ง	32,866,000	9,566,675.56	1/10/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
10	68-0406	ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในสวนสาธารณะของเมืองพัทยา	จัดจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและทรัพย์สินของทางราชการ จำนวน 6 แห่ง จำนวน 25 ราย	6,570,000	1,772,666.68	1/10/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
11	68-0090	โครงการรณรงค์ส่งเสริมการจัดการมูลฝอยของเมืองพัทยา	รณรงค์ส่งเสริมการจัดการมูลฝอย พื้นที่ในเขตเมืองพัทยา	100,000	0	1/5/68	30/8/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ (การขออนุมัติโครงการ)	ไม่มี	ตามแผน
12	68-0301	ค่าจ้างเหมากวาดและทำความสะอาดในเขตเมืองพัทยา	จัดจ้างบริษัทเอกชนในการกวาดและทำความสะอาดในเขตเมืองพัทยา, จัดจ้างแรงงานชุมชนในการกวาดและทำความสะอาดในเขตเมืองพัทยา	36,470,710	9,730,782	1/10/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
13	68-0304	ค่าจ้างเหมาเอกชนกำจัดของเสียอันตรายเขตเมืองพัทยา	จ้างเหมาเอกชนดำเนินการขนถ่ายและกำจัดของเสียอันตราย	268,000	0	1/11/67	28/2/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ (การขออนุมัติโครงการ)	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน

สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระยะวันที่เริ่มต้น	ระยะวันที่สิ้นสุด			
14	68-0305	คำจ้างเหมาเอกชนในการเก็บขน ขนถ่ายและกำจัดมูลฝอย ชุมชนในเขตเมืองพัทยา	จัดจ้างบริษัทเอกชนในการเก็บขน ขนถ่ายมูลฝอย จากสถานีขนถ่ายไปยังสถานที่กำจัด	154,394,000	148,127,529.75	1/10/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
		แผนดำเนินการเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 (งบประมาณเงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)								
15	68-0248	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะเมืองพัทยา 35 ไร่ (ซอยชัยพฤกษ์ 2) ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	รายละเอียดงานที่จะดำเนินการ 1.งานเตรียมพื้นที่โครงการ แล้วเสร็จและ 2.งานถมปรับระดับพื้นที่ คสล. 4.งานก่อสร้างลู่วิ่ง/ทางเดิน 5.งานก่อสร้างลานแอโรบิค 6.งานก่อสร้างสนามเด็กเล่น 7.งานก่อสร้างสนามบาสเก็ตบอล 8.งานก่อสร้างสนามตะกร้อ 9.งานก่อสร้างลานอเนกประสงค์ 10.งานติดตั้งระบบรดน้ำต้นไม้ 11.งานปลูกต้นไม้และสนามหญ้า	82,310,000	0	1/1/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง)	ไม่มี	ตามแผน
		แผนดำเนินการเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 (กรณีกั้นเงินงบประมาณเงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)								
16	67-0375	โครงการจ้างเหมาปรับปรุงประสิทธิภาพไฟประดับป้าย PATTAYA CITY ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	จ้างเหมาปรับปรุงประสิทธิภาพไฟประดับป้าย PATTAYA CITY ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	22,000,000	0	1/10/67	28/2/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน

สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
17	67-0376	โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและสิ่งแวดล้อม เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	จัดซื้อครุภัณฑ์ 6 รายการ 10 ดังนี้ 1.รถตรวจการณ์ (UTV) จำนวน 3 คัน 2.รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบติดเชื้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8 ลูกบาศก์เมตร ชนิด 6 ล้อ จำนวน 2 คัน 3.รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบติดเชื้อ ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 คัน 4.รถดับน้ำขุดหลัง ชนิด 4 ล้อ ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน เมตร ชนิด 10 ล้อ จำนวน 1 คัน 6.รถยนต์บรรทุกน้ำแบบเอนกประสงค์ ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร ชนิด 10 ล้อ จำนวน 2 คัน	28,850,000	0	1/10/67	30/5/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				367,326,510	169,901,841.27					

โดยงบประมาณตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น จำนวน 17 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 367,326,510 บาท

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
1	68-0102	แผนดำเนินการเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568		7,000,000	2,518,500	1/10/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
		โครงการจัดกิจกรรมฟื้นฟูและส่งเสริมการท่องเที่ยว	เช่น โครงการชลบุรีคอฟฟี่ ออนเดอะบีช คาดว่าจะจัดในเดือน พ.ย. 67, โครงการสัปดาห์หมอบเตอร์ไซค์และเสียงเพลงแห่งเสรีภาพ คาดว่าจะจัดในเดือน ก.พ. 68, โครงการเทศกาลปลาหมึกและอาหารทะเล คาดว่าจะจัดในเดือน มิ.ย. 68, โครงการแข่งขันทักษะการผสมเครื่องดื่มเมืองพัทยา คาดว่าจะจัดในเดือน ก.ย. 68, โครงการ E-Sport คาดว่าจะจัดในเดือน เม.ย. 68, โครงการเทศกาลโฮี คาดว่าจะจัดในเดือน มิ.ย. 68 และโครงการอื่นๆ ที่เมืองพัทยาร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นต้น							
2	68-0107	โครงการกีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยา	-การแข่งขันตกปลาบริเวณอ่าวเมืองพัทยา -การแข่งขันบาสเกตบอลพัทยาโอเพ่น -การแข่งขันกีฬาทางน้ำเมืองพัทยา -การแข่งขันวิ่งเกาะล้านเทรล -การแข่งขันฟุตบอลชายหาดนานาชาติเมืองพัทยา -การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดเมืองพัทยา -การแข่งขันกีฬาเรือใบเมืองพัทยา -การแข่งขันวิ่งพิทยาเทรล -กีฬาอื่น ๆ ตามความเหมาะสม -มีนักกีฬา ผู้ติดตาม และนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1,500 คน	6,500,000	5,065,610	1/10/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
3	68-0108	โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนเมืองพัทยา	-การแข่งขันฟุตบอลละมั่งคัพ -การแข่งขันเปตองเมืองพัทยา -การแข่งขันเจ็ตสกีและเรือเร็วท้องถิ่นเมืองพัทยา -การแข่งขันยิงปืนสั้นชาวบ้าน รายการ Koh Larn Shooting -การแข่งขันวอลเลย์บอลพัทยาโอเพ่น -การแข่งขันฟุตบอลพัทยาคัพ -การแข่งขันฟุตซอลพัทยาคัพ -การแข่งขันว่ายน้ำพัทยาโอเพ่น -การแข่งขันสเก็ตบอร์ดเมืองพัทยา -กีฬาอื่น ๆ ตามความเหมาะสม -มีนักกีฬา ผู้ติดตาม และนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 1,500 คน	6,500,000	1,760,510	1/10/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
4	68-0109	โครงการแข่งขันพืชมาราธอน	-การจัดการแข่งขันวิ่งในระยะ 5 ประเภท ได้แก่ 1. ระยะมาราธอน 42.195 กม. 2. ระยะฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม. 3. ระยะ 10 กม. 4. ระยะพัมปิลีน และระยะวีลแชร์ ไม่เกิน 5 กม. -มีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 60,000 คน	10,000,000	0	1/10/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
5	68-0122	โครงการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่	1. การแสดงดนตรี 2. การจุดพลุเฉลิมฉลองศักราชใหม่ 3. การจำหน่ายสินค้า 4. จำนวนผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 30,000 คน	10,000,000	10,000,000	1/10/67	28/2/68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ตามแผน

สำนักการท่องเที่ยวและกีฬา

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุนที่เริ่มต้น	ระบุนที่สิ้นสุด			
6	68-0124	โครงการเทศกาลดนตรีเมืองพัทยา	1. การแสดงดนตรี 2. การจำหน่ายอาหาร 3. จำนวนผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 30,000 คน	15,000,000	0	1/10/67	30/5/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
7	68-0125	โครงการเทศกาลพลุนานาชาติเมืองพัทยา	1.การแสดงดนตรี 2.การแสดงพลุ 3.การจำหน่ายอาหาร 4.จำนวนผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 100,000	28,000,000	30,960,000	1/10/67	31/1/68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ตามแผน
8	68-0126	โครงการเทศกาลศิลปะแสงไฟเมืองพัทยา	1.การแสดงแสงไฟ 2.จำนวนผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 10,000 คน	10,000,000	0	1/12/67	30/6/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
9	68-0140	โครงการขับเคลื่อนเมืองพัทยาสู่เมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ ของยูเนสโก	จัดงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองพัทยา / กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายและกิจกรรมสร้างการรับรู้ เมืองพัทยาสู่เมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์	10,000,000	0	1/12/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
10	68-0141	โครงการเทศกาลดนตรีแจ๊สเมืองพัทยา	จัดงานเทศกาลดนตรีแจ๊ส มีการจัดจำหน่ายสินค้าและอาหาร ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 10,000 คน	10,000,000	10,000,000	1/12/67	30/9/68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ตามแผน
11	68-0142	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการท่องเที่ยวเมืองพัทยา	จัดประชุมภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา	200,000	0	1/1/68	30/4/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ)	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
12	68-0143	โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์พื้นที่นาเกลือ	จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ในพื้นที่ จัดอบรมและศึกษาดูงาน พื้นที่สร้างสรรค์	500,000	0	1/4/68	30/5/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ)	ไม่มี	ตามแผน

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
13	68-0145	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว Pattaya Road Show	-งานเทศกาลไทยครั้งที่9 ระหว่างวันที่ 3-7 ต.ค. 67 -งานThailand Yoga Art&Dance ประจำปี2567 ระหว่างวันที่25-27 ต.ค. 67 - งาน ITB Berlin มี.ค. 68 -งานThai Festival เดือนส.ค./มิ.ย. 68 -งานส่งเสริมการท่องเที่ยวรูปแบบOnline	8,000,000	5,277,263.51	1/10/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
14	68-0121	โครงการจัดงานเทศกาลตรุษจีนเมืองพัทยา	-ตกแต่งสถานที่บริเวณนาเกลือและถนนอโศกคิงสตรีท -จัดประกวดตี-หมวย หนูน้อยไฉนีส -การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน -การแสดงของศิลปิน -พิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 3 สถานที่ คาดหวังว่ามีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 20,000 คน	3,000,000	115,000	1/10/67	31/3/68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ตามแผน
15	68-0131	โครงการพัฒนาพื้นที่นาเกลือเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	-การจำหน่ายสินค้าของคนในชุมชนบริเวณนาเกลือ -การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย -การแสดงของศิลปิน -การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการประมงนาเกลือ -อบรมดับเพลิงให้ความรู้แก่พ่อค้าแม่ค้า คาดหวังว่ามีผู้เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 50,000 คน	6,000,000	5,975,000	1/10/67	31/3/68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ตามแผน
16	68-0144	โครงการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (Pattaya MICE City)	-งานประชุมไอซีอี ครั้งที่61 ระหว่างวันที่14-17 พ.ย. 67 -งานประชุมใหญ่โลออนส์สากลภาครวม ระหว่างวันที่7-9 มี.ค.68 -งาน IMEX มี.ค.68 -งานTravel Tour Expo -งานIT&CMA 2025 กันยายน 2568	5,000,000	2,675,842	1/10/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
17	68-0343	ค่าจ้างเหมาจัดทำปฏิทินตั้งโต๊ะเพื่อการประชาสัมพันธ์	จ้างเหมาจัดทำปฏิทินตั้งโต๊ะเพื่อการประชาสัมพันธ์เมืองพัทยา แบบ 2 ภาษา (ภาษาไทย – อังกฤษ) จำนวน 30,000 ชุด เพื่อเผยแพร่แก่ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน	1,354,000	1,125,000	1/10/67	31/12/67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ตามแผน
18	68-0344	ค่าจ้างเหมาบริการระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ Pattaya Contact Center 1337	ค่าจ้างเหมาบริการระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ Pattaya Contact Center 1337 ประกอบด้วย ผู้จัดการสำนักงาน หัวหน้าพนักงานรับสาย พนักงานรับสายผู้มีความสามารถ ด้านภาษาอังกฤษ ภาษาจีน พนักงานรับเรื่องทางไลน์แอท Pattaya Connect พนักงานรับสายหมายเลขโทรศัพท์ ส่วนกลาง การเพิ่มข้อมูลใหม่และการปรับปรุงข้อมูล ค่าธรรมเนียมการใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ เป็นต้น	12,352,600	4,188,800	1/10/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
19	68-0349	ค่าจ้างเหมายกระดับประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ ที่ดีของเมืองพัทยา	จ้างเหมายกระดับประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ ที่ดีของเมืองพัทยา เป็นค่าดูแลระบบ บำรุงระบบ และแก้ไขปัญหาทางเทคนิค รวมทั้งจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ วิดีทัศน์ และอื่น ๆ ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมของเมืองพัทยา เป็นต้น	9,000,000	0	1/3/68	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
แผนดำเนินการเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4										
(กรณีเกินเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)										
20	67-0123	โครงการ Pattaya Beach Games (กีฬาชายหาดเมืองพัทยา)	จัดกิจกรรมกีฬายาซหาดและกีฬารมณันทนาการ เพื่อนำเสนอมุมมองใหม่ เช่น ฟุตบอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด EXTREME SPORT ฯลฯ	3,000,000	3,000,000	1/10/67	31/11/24	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ตามแผน

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
21	67-0125	โครงการขับเคลื่อนเมืองพัทยาสู่เมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ของยูเนสโก	บูรณาการหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมต่างเพื่อขับเคลื่อนเมืองพัทยาสู่เมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ของยูเนสโก อย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง	10,000,000	5,990,000	1/10/67	31/12/67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ตามแผน
22	67-0132	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว Pattaya Road Show	ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวของเมืองพัทยาทั้งในประเทศและต่างประเทศ	10,000,000	10,000,000	1/10/67	31/10/67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ตามแผน
23	67-0122	ค่าจ้างเหมาบริการระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ Pattaya Contact Center 1337	ประสานงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวตลอด 24 ชั่วโมง	12,352,600	12,310,000	1/10/67	31/11/24	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ตามแผน
24	67-0131	โครงการยกระดับประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเมืองพัทยา	ศึกษากลยุทธ์หรือแผนการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์, ประชาชนเมืองพัทยาทราบข่าวสารการบริหารและบริการประชาชนอย่างทั่วถึง	765,000	760,000	1/10/67	31/3/68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ตามแผน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				194,524,200	111,721,525.51					

โดยงบประมาณตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา ทั้งสิ้น จำนวน 24 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 194,524,200 บาท

สำนักพัสดุและทรัพย์สิน

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
1	67-0245	แผนดำเนินการเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4		500,000	373,000	1/1/68	31/1/68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ตามแผน
		(กรณีเกินเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)								
		โครงการปรับปรุงห้องทำงานภายในสำนักพัสดุและทรัพย์สิน	ปรับปรุงห้องทำงานภายในสำนักพัสดุและทรัพย์สิน ประกอบด้วย 1.งานรื้อ 2.งานผนังกระจก 3.ประตู พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 4.งานระบบไฟฟ้า 5.งานครุภัณฑ์							
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				500,000	373,000					

โดยงบประมาณตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักพัสดุและทรัพย์สิน ทั้งสิ้น จำนวน 1 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 500,000 บาท

กองการเจ้าหน้าที่

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
		แผนดำเนินการเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568								
1	68-0430	โครงการจ้างคนพิการเข้าทำงาน	จ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานการอันเป็นประโยชน์ แก่อปท. ตามที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 12 คน	1,500,000	710,967.74	1/10/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
2	68-0433	ค่าจ้างที่ปรึกษาสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจ ของคุณภาพการให้บริการของเมืองพัทยา	จ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาในการดำเนินการสำรวจ ความพึงพอใจของผู้รับบริการของเมืองพัทยา	30,000	0	1/1/68	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				1,530,000	710,967.74					

โดยงบประมาณตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของกองการเจ้าหน้าที่ ทั้งสิ้น จำนวน 2 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 1,530,000 บาท

กลุ่มงานกฎหมาย

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
1	68-0036	แผนดำเนินการเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568		30,000	0	1/3/68	30/4/68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ขอเปลี่ยนแปลง แผนดำเนินงาน	ไม่เป็นไปตามแผน
		โครงการอบรมสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้แก่ผู้ประกอบการ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 เกี่ยวกับธุรกิจขายรถยนต์ใช้แล้ว และธุรกิจการ เสริมความงาม	บรรยาย และตอบข้อซักถาม โดยวิทยากรหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง							
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				30,000	0					

โดยงบประมาณตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของกลุ่มกฎหมาย ทั้งสิ้น จำนวน 1 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 30,000 บาท

เมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
		แผนดำเนินการเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568								
1	68-0033	โครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชนทั่วไปบนพื้นที่เกาะล้าน	1.จัดการอบรมพร้อมปฏิบัติประดิษฐ์ (ดอกไม้จันทน์) 2.อบรมให้ความรู้เรื่องการตลาดออนไลน์	100,000	89,670	1/3/68	30/4/68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ตามแผน
2	68-0069	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่แบบบูรณาการเชิงรุกค้นหาและคัดกรองภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพในประชาชนเกาะล้าน	จัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย 3 ครั้ง/ปี เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนในพื้นที่เข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพ และได้รับการตรวจคัดกรองภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพ , จัดกิจกรรมออกหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่แบบบูรณาการเชิงรุกค้นหาและคัดกรองภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพในประชาชนเกาะล้าน 1 ครั้ง/ปี, ดำเนินงานเชิงรุกในชุมชนให้บริการด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือกลุ่มติดบ้าน หรือผู้ป่วยกลุ่มติดเตียงที่ต้องได้รับการดูแลจากทีมสหวิชาชีพ อย่างน้อยร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแล, ดำเนินงานเชิงรุกคัดกรองโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง ในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป อย่างน้อยร้อยละ 80 ของประชากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการคัดกรอง, จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนสื่อการเรียนรู้ ด้านพัฒนาการและโภชนาการในเด็กอายุ 0-5 ปี 1 ครั้ง , ปรับปรุงฐานข้อมูลประชากรในพื้นที่ ม.7 บ้านเกาะล้าน พร้อมรายงานสรุปข้อมูลสถิติด้านสุขภาพดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดโครงการ	70,000	0	1/1/68	30/4/68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เลื่อนดำเนินการในเดือน ก.ค.	ไม่เป็นไปตามแผน

เมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
3	68-0071	โครงการพัฒนาการบริการการแพทย์ฉุกเฉินการกู้ชีพขั้นพื้นฐานและช่วยชีวิตทางนํ้าบนพื้นที่เกาะล้าน	ผู้เข้าร่วมอบรมมีองค์ความรู้ด้านการกู้ชีพขั้นพื้นฐานครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทย จำนวน 10 ล้านคนภายใน 3 ปี (ตามเป้าหมายกระทรวงสาธารณสุข), ผู้เข้าร่วมอบรมมีทักษะด้านการกู้ชีพขั้นพื้นฐานครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่เกาะล้าน, ผู้เข้าร่วมอบรมทราบถึงภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสิทธิ UCEP “ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิทุกที่” และการแจ้งเหตุฉุกเฉินด้วยการโทร 1669, ผู้เข้าร่วมอบรมมีทักษะในการช่วยนํ้าเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางนํ้า การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย ณ จุดเกิดเหตุเพื่อผู้ประสบภัยปลอดภัยมีเจตคติที่ดีต่อสังคมมีคุณธรรม จริยธรรม	136,000	96060	1/12/67	30/7/68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ตามแผน
4	68-0152	โครงการแกนนำสุขภาพประจำครอบครัว	มีแกนนำสุขภาพประจำครอบครัวที่มีความรู้ความสามารถทักษะในการช่วยชีวิตคนในครอบครัวได้เบื้องต้นและเป็นภาคเครือข่ายระหว่างองค์กรกับชุมชนได้ร้อยละ 90, สามารถลดการมาสถานพยาบาลในกรณีที่ไม่จำเป็นหรือไม่ใช่เหตุฉุกเฉินเนื่องจากประชาชนสามารถดูแลตนเองและบุคคลในครอบครัวในเบื้องต้นได้ร้อยละ 80, แกนนำสุขภาพประจำครอบครัว สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดให้บุคคลในครอบครัวได้ร้อยละ 90	100,000	8,360	1/12/67	31/3/68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ตามแผน
5	68-0402	ค่าจ้างเหมาดำเนินงานศูนย์แพทย์ชุมชนบ้านเกาะล้านเมืองพัทยา	จัดจ้างเอกชนเพื่อให้บริการและดำเนินงานด้านการแพทย์และการสาธารณสุขครบถ้วนตามมาตรฐาน	28,760,000	7,189,717	1/10/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน

เมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
6	68-0432	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่เกาะล้าน	จัดบริการออกตรวจสุขภาพอาหาร จำนวน 2 ครั้ง/ปี, จัดบริการออกหยอดทรายอะเบทและพ่นหมอกควัน ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง /ปี, รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 1 ครั้ง/ปี, จัดบริการฉีดพ่นสารเคมีเพื่อควบคุมการระบาดของ ของโรคในพื้นที่เสี่ยงหรือตามฤดูกาลไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/ปี	300,000	0	1/1/68	30/4/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
7	68-0072	โครงการรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบนพื้นที่เกาะล้าน	รณรงค์ทำความสะอาดเก็บขยะชายหาดไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/ปี รณรงค์ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี, รณรงค์ปลูกต้นไม้อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี, ร่วมรณรงค์เก็บขยะ รักษาได้ทะเลกับหน่วยงานที่อาสาจัดกิจกรรมดังกล่าว	50,000	0	1/2/68	30/5/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
8	68-0410	ค่าจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติหน้าที่คนงานสวน	จัดจ้างเหมาแรงงานในพื้นที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่คนสวน ให้เกิดความสวยงามของต้นไม้ที่อยู่บนพื้นที่เกาะล้าน	1,559,520	465,784.15	1/10/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
9	68-0394	โครงการจ้างที่ปรึกษาติดตาม ตรวจสอบ ศึกษาวิจัย และพัฒนาศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนด้วยวิธีการเผาทำลาย บนพื้นที่เกาะล้านแบบครบวงจร เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี	จัดจ้างบุคลากรเพื่อเป็นที่ปรึกษาและควบคุมงาน ดังนี้ 1.ผู้จัดการโครงการ 2.วิศวกรเครื่องกล 3.วิศวกรโยธา เป็นต้น	2,000,000	0	1/3/68	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
10	68-0401	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยบนพื้นที่เกาะล้าน	กำจัดขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวันได้อย่างถูกหลักสุขาภิบาล	23,000,000	0	1/10/67	30/9/68	ยังไม่ได้ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอนสร้างโรงงาน)	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
11	68-0403	ค่าจ้างเหมาแรงงานกวาดทำความสะอาดถนน บนพื้นที่เกาะล้าน	จัดจ้างเหมาแรงงานในพื้นที่เพื่อกวาดทำความสะอาด บนพื้นที่เกาะล้าน	5,978,160	1,970,422.33	1/10/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน

เมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
12	68-0351	ค่าจ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบสื่อสารและระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวแบบรวมอะไหล่พร้อมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยพื้นที่เกาะล้านเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน	1.ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 2. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 3. รับแจ้งเหตุตลอด 24 ชั่วโมง 4. แสดงข้อมูลการท่องเที่ยวในรูปแบบ คิวอาร์โค้ด	9,900,000	0	1/12/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
13	68-0039	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการซักซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย	1.เพิ่มพูนความรู้ความสามารถให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ 2.ประชาชนและเจ้าหน้าที่ได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและระงับอัคคีภัย 3.เสริมสร้างศักยภาพความเข้มแข็งความพร้อมเพียงในการให้บริการประชาชนรวมทั้งการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว	120,000	0	1/3/68	30/5/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
แผนดำเนินการเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1										
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่2) (ฉบับที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567)										
14	67-0365	โครงการก่อสร้างถนนภายในชุมชนเกาะล้าน บริเวณซอยยายหนู	ก่อสร้างถนนภายในชุมชนเกาะล้าน พื้นที่ไม่น้อยกว่า 246 ตารางเมตร บริเวณซอยยายหนู โดยดำเนินการดังนี้ 1.งานบล็อกคอนกรีตผิวทาง 2.งานขอบทางคอนกรีต 3.งานพิเศษ	390,000	0	1/10/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
15	67-0367	โครงการก่อสร้างถนนภายในชุมชนเกาะล้าน บริเวณซอยดาจุ่น	ก่อสร้างถนนภายในชุมชนเกาะล้าน พื้นที่ไม่น้อยกว่า 210 ตารางเมตร บริเวณซอยดาจุ่น โดยดำเนินการดังนี้ 1.งานบล็อกคอนกรีตผิวทาง 2.งานขอบทางคอนกรีต 3.งานพิเศษ	330,000	0	1/10/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน

เมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
16	67-0373	โครงการก่อสร้างถนนภายในชุมชนเกาะล้าน บริเวณสายท่าไร่ เกาะล้าน เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	โดยปูบล็อกคอนกรีตพร้อมคันหินสำเร็จรูป ความกว้างไม่น้อยกว่า 4.50 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 557.00 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 6,350.00 ตารางเมตร พร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง ขนาด 110 วัตต์ จำนวนไม่น้อยกว่า 60 ต้น เป็นต้น	17,850,000	0	1/10/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
แผนดำเนินการเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2										
(งบประมาณเงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)										
17	68-0250	โครงการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการบริหาร จัดการด้านความปลอดภัยพื้นที่เกาะล้าน (ระยะที่ 2) เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	1.ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 2.ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 3.รับแจ้งเหตุตลอด 24 ชั่วโมง 4.แสดงข้อมูลข่าวสารในรูปแบบ คิวอาร์โค้ด	29,308,500	0	1/10/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
18	68-0249	การซ่อมแซมทางเดินเชื่อมหาดตาแหวน - หาดสังวาลย์ เกาะล้าน เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	-ซ่อมแซมสะพานไม้ความกว้างไม่น้อยกว่า 3 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 125.50 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อย กว่า 376.50 ตารางเมตร -โคมไฟฟ้าส่องสว่าง หลอด LED เสาสูง 3 เมตร จำนวน ไม่น้อยกว่า 15 ชุด -รายละเอียดตามแบบแปลนเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน	21,160,000	0	1/1/68	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ทบทวนราคา)	ไม่มี	ตามแผน
19	68-0260	การซ่อมแซมเส้นทางเชื่อมโยงหาดตาแหวน-หาดทองหลาง เกาะล้าน เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	-ซ่อมแซมเส้นทาง คสล. ความกว้างไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 411.00 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อย กว่า 2,055.00 ตารางเมตร -ห้องน้ำชาย พื้นที่ประมาณ 20.00 ตารางเมตร	77,900,000	0	1/10/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ทบทวนราคา)	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน

เมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
20	68-0263	การก่อสร้างศูนย์จักรกลโยธา เกาะล้าน เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	ห้องน้ำหญิง พื้นที่ประมาณ 20.00 ตารางเมตร -คอมไฟฟ้าส่องสว่างกิ่งเดี่ยวหลอด LED เสาสูง 6 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ชุด -คอมไฟฟ้าส่องสว่างกิ่งคู่หลอด LED เสาสูง 6 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 37 ชุด และงานอื่นที่เหลือ -รายละเอียดตามแบบแปลนเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน -ก่อสร้างอาคารโครงสร้าง คสล. หลังคาโครงเหล็ก ความกว้าง 20.00 เมตร ความยาว 30.00 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร -ระบบเคลื่อนย้ายความสามารถในการยกน้ำหนัก ไม่น้อยกว่า 30 ตัน -ถังสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) เพื่อจ่ายบริการ ความจุไม่น้อยกว่า 6,000.00 ลิตร -งานอื่นๆ -รายละเอียดตามแบบแปลนเมืองพัทยาสาखाเกาะล้าน	30,000,000	0	1/1/68	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ทบทวนราคา)	ไม่มี	ตามแผน
21	68-0264	การก่อสร้างถนนภายในชุมชนเกาะล้าน บริเวณหาดทองหลาง เกาะล้าน เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	-ปรับปรุงผิวจราจรความกว้างไม่น้อยกว่า 7.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 765.00 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 5,055.00 ตารางเมตร -ติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างจำนวนไม่น้อยกว่า 74 ชุด -งานอื่นๆ -รายละเอียดตามแบบแปลนเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน	16,141,000	0	1/10/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง)	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน

เมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
22	68-0265	การปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยวด้วยการเดินเท้าบริเวณหาดถ้ำ - หาดกรวด เกาะล้าน เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	-ก่อสร้างทางเดินเท้า ความกว้างไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 124.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 223.00 เมตร -โคมไฟฟาส่องสว่าง กิ่งเดี่ยว หลอด LED เสาสูง 3 เมตร -งานอื่นๆ -รายละเอียดตามแบบแปลนเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน	20,740,000	0	1/1/68	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ทบทวนราคา)	ไม่มี	ตามแผน
23	68-0266	การก่อสร้างทางเดินเท้าบริเวณหาดตายาย-หัวโขด เกาะล้าน เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	-ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า 2 ช่วง ความยาวรวม ไม่น้อยกว่า 66 เมตร ช่วงที่ 1 ความกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 21.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 31.50 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ความกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 45 เมตร หรือ พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 67.50 ตารางเมตร - โคมไฟฟาส่องสว่างหลอด LED เสาสูง 3 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 12 ชุด - รายละเอียดตามแบบแปลนเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน	11,430,000	0	1/1/68	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ทบทวนราคา)	ไม่มี	ตามแผน
24	68-0268	การปรับปรุงลานคอนกรีต หน้าสำนักงานหาดตาแหวน เกาะล้าน เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	-ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้างไม่น้อยกว่า 14.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 60.00 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร -งานปูพื้นกระเบื้องคอนกรีต ความกว้างไม่น้อยกว่า 14.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 60.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร -ราวกันตก ความยาวไม่น้อยกว่า 100 เมตร -ศาลาพัก ขนาดความกว้างประมาณ 5 เมตร	15,000,000	0	1/1/68	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน

เมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
25	68-0237	เงินอุดหนุนสำหรับเงินเดือนบุคลากรถ่ายโอน ด้านงานสาธารณสุข	ความประมาณ 5 เมตร จำนวน 2 หลัง -เสาธงพร้อมฐาน 1 แห่ง -และงานอื่นที่เหลือ -รายละเอียดตามแบบแปลนเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน จ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเมืองพัทยา ค่าตอบแทน ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล และเงินสิทธิประโยชน์ต่างๆของพนักงานเมืองพัทยา	301,200	109,110	1/10/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
แผนดำเนินการเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 (กรณีกักเงินงบประมาณเงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)										
26	67-0316	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมลานเอนกประสงค์ทำเทียมเรือ ท่าหน้าบ้าน เกาะล้าน เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	ปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างลานเอนกประสงค์ทำเทียมเรือ ท่าหน้าบ้าน บริเวณผิวคอนกรีตด้านล่าง, คานรองรับลานคอนกรีต,และขอบกำแพงกันคลื่นโดนรอบ, ทำการติดตั้งวัสดุเสริมกำลังโครงสร้าง,ทำการเคลือบปิดผิว ป้องกันการกัดกร่อนลานเอนกประสงค์ทำเทียมเรือ ท่าหน้าบ้าน พื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 4,631.00 ตารางเมตร	49,897,000	2,492,700	1/10/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
27	67-0315	โครงการก่อสร้างถนนภายในชุมชนเกาะล้านบริเวณหาดตายาย เกาะล้าน เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	ก่อสร้างผิวจราจรพร้อมทางเท้า โดยปูบล็อกคอนกรีต พร้อมขอบคันหินสำเร็จรูป ความกว้างไม่น้อยกว่า 6.00-8.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 1,288.00 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 9,954.00 ตารางเมตร พร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 102 ต้น	29,190,000	6,812,650	1/10/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน

เมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
		แผนดำเนินการเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4		28,760,000	4,794,388	1/10/67	31/10/67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ตามแผน
		(กรณีเกินเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)								
28	67-0141	ค่าจ้างเหมาดำเนินงานศูนย์แพทย์ชุมชนบ้านเกาะล้านเมืองพัทยา	จัดจ้างเอกชนเพื่อให้บริการและดำเนินงานด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ครบถ้วนตามมาตรฐาน							
29	67-0146	โครงการจ้างกำจัดขยะมูลฝอยบนพื้นที่เกาะล้าน	จ้างเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยบนพื้นที่เกาะล้าน	27,063,000	0	1/6/68	30/9/68	ยังไม่ได้ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอนสร้างโรงงาน)	ไม่มี	ตามแผน
30	67-0142	ค่าจ้างเหมาบุคลากรในการบริหารจัดการศูนย์สื่อสารความปลอดภัยพื้นที่เกาะล้าน	จัดจ้างเจ้าหน้าที่เพื่อดูแลปลอดภัย 2.ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินสาธารณะ 3.ระบบประกาศประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนภัย 4.ระบบกล้องวงจรปิด 5.ระบบโปรแกรมประชาสัมพันธ์ผ่านระบบคิวอาร์โค้ด	5,000,000	0	1/10/67	31/12/67	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ระหว่างตรวจรับงาน)	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				452,534,380	24,028,861.48					

โดยงบประมาณตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเมืองพัทยา สาขาเกาะล้านทั้งสิ้น จำนวน 30 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 452,534,380 บาท

ภาคผนวก

56.38
๖

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๑๑.๒/๕๕๒๐



ศาลาว่าการเมืองพัทยา
เลขที่รับ 8032
เลขที่ 8-8-2567
วันที่ 14/๖๕๖๗
เวลา 14:๖๕

กระทรวงมหาดไทย
สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
ส่วนงบประมาณ

๖ มีนาคม ๒๕๖๗

ฝ่ายงบประมาณและเงินอุดหนุน

เรื่อง สรุปผลประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
วันที่ 8 มี.ค. 67

เรียน ปลัดเมืองพัทยา

เวลา 15:42 ผู้รับ อินทุพัชร์

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปผลการประชุมคณะกรรมการฯ

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐได้เชิญกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ๑ ชั้น ๑ กระทรวงการคลัง และประชุมผ่านระบบ Video Conference ด้วยโปรแกรม Cisco Webex Meetings ณ ห้องประชุมสำนักนโยบายและแผน ชั้น ๗ อาคารดำรงราชานุสรณ์ ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ) เป็นประธาน

ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยได้สรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้เมืองพัทยาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการ สามารถเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับมาตรการที่กำหนด ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ทางเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย www.ppb.moi.go.th หัวข้อ “หนังสือแจ้งเวียน/ประชาสัมพันธ์”

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุทธิพงษ์ จุกเจริญ)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักนโยบายและแผน

โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๔๗

เรียน หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและเงินอุดหนุน
เพื่อโปรดทราบ

กระทรวงมหาดไทยได้สรุปผลประชุม
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและ
การใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
เพื่อให้เมืองพัทยาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการและ
สามารถเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรการที่กำหนด


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบถือปฏิบัติในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป



(นางสาวอรุณรัตน์ กันภัย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

เรียน ผู้อำนวยการส่วนงบประมาณ

- เพื่อโปรดทราบ
- เสนอขอเงินอุดหนุนเพื่อโปรดทราบ



(นางสาวสิตาญา เลิศทองทิม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและเงินอุดหนุน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ

- เพื่อโปรดทราบ
- เสนอขอเงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

มรธ ๖ กับสำเนาแล้วทุกส่วน รวบรวมให้ตรงแล้ว ก่อเป็น
แนวทางในการดำเนินงานต่อไป



(นางสาวเอกรัตน์ สารทิพย์)
ผู้อำนวยการส่วนงบประมาณ

เรียน ปลัดเมืองพัทยา

- เพื่อโปรดทราบ
- เสนอขอเงินอุดหนุน



(นายสุทัต สิริวัชรเวทย์)

ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ

11 มี.ค. 2567

เรียน นายกเมืองพัทยา

- เพื่อโปรดทราบ
- เสนอขอเงินอุดหนุนเพื่อโปรดทราบ

(นายเกียรติศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย)

รองปลัดเมืองพัทยา รักษาการการแทน
ปลัดเมืองพัทยา

11 มี.ค. 2567

ทราบ



(นายปรเมศวร์ จามพิเชษฐ์)

นายกเมืองพัทยา
๑๒ มี.ค. ๒๕๖๗

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
และการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ๑ ชั้น ๑ กระทรวงการคลัง ผ่านระบบ Video Conference

๑. เรื่องเพื่อทราบ

๑.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗ เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ซึ่งมีการทบทวนองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังที่กำกับดูแลกรมบัญชีกลางเป็นรองประธานกรรมการ และปลัดกระทรวงมหาดไทยร่วมเป็นกรรมการ เพื่อติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุนของหน่วยรับงบประมาณ ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายภาครัฐอื่นๆ และโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ รายงานผลความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคการดำเนินการและเสนอแนะแนวทางแก้ไขรวมทั้งกำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐในแต่ละปีงบประมาณ

๑.๒ แนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดแนวทางปฏิบัติในการเตรียมจัดซื้อจัดจ้างและการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้หน่วยงานถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๔๑ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ สรุปได้ดังนี้

๑) ให้หน่วยงานเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนที่เป็นเรื่องภายในของหน่วยงาน และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้รับจ้างไว้ก่อน เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จะได้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงได้ทันที

๒) ลดระยะเวลาในการเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างเพื่อให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น ดังนี้

ตารางที่ ๑ สรุปการลดระยะเวลาในการเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างเพื่อให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเภท	ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๔๑ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การเผยแพร่ร่างประกาศ และร่างเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้อยู่ในดุลพินิจ	วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้อยู่ในดุลพินิจ
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป การเผยแพร่ประกาศ และเอกสาร การจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับการซื้อหรือจ้าง ด้วยวิธี e-Bidding	วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไม่น้อยกว่า ๕ วันทำการ	วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ
	วงเงินตั้งแต่ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไม่น้อยกว่า ๑๐ วันทำการ	
	วงเงินตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไม่น้อยกว่า ๑๒ วันทำการ	วงเงินตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไม่น้อยกว่า ๒๐ วันทำการ
	วงเงินตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไม่น้อยกว่า ๒๐ วันทำการ	
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป การเผยแพร่ประกาศ และเอกสารการจ้างที่ปรึกษา การเผยแพร่ประกาศ และเอกสารการจ้างออกแบบ หรือควบคุมงานก่อสร้าง	ไม่น้อยกว่า ๕ วันทำการ	ไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ

๑.๓ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรณีการจ่ายเงินก่อนมีการตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงาน กระบวนการคลัง โดยกรมบัญชีกลาง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรณีการจ่ายเงินก่อนมีการตรวจรับ ทรัพย์สินหรือตรวจรับงาน เพื่อเป็นการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐให้สามารถ มีเม็ดเงินจากระบบงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐลงสู่ระบบเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นตามหนังสือ กระบวนการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๓๑ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ สรุปได้ดังนี้

๑) เมื่อคู่สัญญาของส่วนราชการได้ส่งมอบทรัพย์สินหรือส่งมอบงานในแต่ละงวดแล้วและมีหนังสือ แจ้งความประสงค์ว่าจะขอรับเงินก่อนที่ส่วนราชการจะตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงานเสร็จสิ้นให้คู่สัญญา หรือผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ (BANK GUARANTEE) มามอบให้ส่วนราชการเพื่อเป็นหลักประกันในการจ่ายเงินของส่วนราชการ โดยหลักประกันที่คู่สัญญา นำมามอบให้กับส่วนราชการจะต้องมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินที่ส่วนราชการต้องจ่ายตามงวดงานในสัญญา

๒) ให้ส่วนราชการรีบดำเนินการขอเบิกเงินจากคลังทันที โดยไม่ต้องดำเนินการตรวจรับทรัพย์สิน หรือตรวจรับงาน เพื่อจ่ายเงินให้คู่สัญญาหรือผู้รับโอนสิทธิเรียกร้อง และกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินเข้าบัญชี ให้กับคู่สัญญาหรือผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องโดยตรง ทั้งนี้เมื่อส่วนราชการได้ดำเนินการตรวจรับทรัพย์สิน หรือตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้วตามกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐแล้ว ให้ส่วนราชการคืนหนังสือค้ำประกันให้แก่คู่สัญญาหรือผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องต่อไป

๑.๔ รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ

๑) ภาพรวมการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน วงเงินงบประมาณ ๑,๘๑๖,๔๙๗ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวม ๑,๑๗๔,๒๖๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๖๔ ผลการใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๖ จำแนกเป็นงบรายจ่ายประจำปีมีผลการใช้จ่ายร้อยละ ๖๗.๐๑ และงบรายจ่ายลงทุนร้อยละ ๖๒.๗๒

๒) การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ฝ่ายเลขานุการ ได้รายงานผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของหน่วยงานระดับกระทรวงและขนาดของวงเงินงบประมาณ รายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรร ซึ่งกระทรวงมหาดไทยอยู่ในกลุ่มกระทรวงที่ได้รับงบรายจ่ายลงทุนมากกว่า ๑๐,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป โดยมีผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน ๕,๓๐๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๗๑ และผลการใช้จ่าย งบรายจ่ายลงทุน ๑๓,๕๐๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๑๑

๓) การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ จำนวน ๔๓ แห่ง มีกรอบงบลงทุน จำนวน ๒๘๕,๐๙๓ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย ๒๕๔,๙๖๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙ ของกรอบงบลงทุน (ข้อมูลจากระบบ GFMS-SOE ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗)

๔) การเบิกจ่ายเงินลงทุนและสถานะโครงการลงทุนภาครัฐที่ใช้เงินกู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) จำนวน ๙๕ โครงการ กรอบวงเงินลงทุนตามมติ คณะรัฐมนตรี จำนวน ๒.๐๓ ล้านล้านบาท โดย ณ สิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๗ มีผลการเบิกจ่ายเงินสะสม จำนวน ๙๙๓,๘๑๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๙ ของกรอบวงเงินตามมติคณะรัฐมนตรี

มติที่ประชุม รับทราบตามข้อ ๑ และมอบฝ่ายเลขานุการรายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดทราบต่อไป

/๒. เรื่องเพื่อพิจารณา...

๒. เรื่องเพื่อพิจารณา

มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ฝ่ายเลขานุการได้เสนอมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นปัจจัยสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและหน่วยรับงบประมาณใช้เป็นแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี เงินงบประมาณและงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ จึงเห็นสมควรให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๗๗ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน และมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน และกำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สารสำคัญของมาตรการ มีดังนี้

๒.๑ เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑) กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการให้สอดคล้องกับเป้าหมายในภาพรวมของประเทศ โดยจำแนกเป้าหมายเป็นรายไตรมาส ดังนี้

ตารางที่ ๒ เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รายการ	รวม		ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
รายจ่ายภาพรวม	๙๓.๐๐	๑๐๐.๐๐	๒๔.๐๐	๒๕.๓๑	๔๑.๐๐	๔๓.๐๙	๕๑.๐๐	๕๓.๘๖	๙๓.๐๐	๑๐๐.๐๐
รายจ่ายประจำ	๙๘.๐๐	๑๐๐.๐๐	๒๙.๐๐	๒๙.๓๙	๔๗.๐๐	๔๙.๕๙	๕๘.๐๐	๖๑.๒๓	๙๘.๐๐	๑๐๐.๐๐
รายจ่ายลงทุน	๗๕.๐๐	๑๐๐.๐๐	๗.๐๐	๙.๙๕	๑๕.๐๐	๑๘.๘๗	๒๑.๐๐	๒๕.๕๐	๗๕.๐๐	๑๐๐.๐๐

๒) เมื่อหน่วยรับงบประมาณได้รับอนุมัติเงินจัดสรรแล้ว กรณีเป็นรายจ่ายที่ต้องดำเนินการหรือเบิกจ่ายโดยสำนักงานในส่วนภูมิภาค ให้หน่วยรับงบประมาณเร่งดำเนินการส่งเงินจัดสรรต่อไปยังสำนักงานในส่วนภูมิภาคภายใน ๕ วันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติเงินจัดสรร เพื่อให้สำนักงานในส่วนภูมิภาคดำเนินการใช้จ่ายหรือก่อนนี้ผูกพันต่อไป

๓) รายการงบลงทุนปีเดียวให้ก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ สำหรับรายการผูกพันใหม่ให้ก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

๔) ให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ รวมทั้งทุนหมุนเวียนภายใต้สังกัด รายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายภาครัฐ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานเจ้าของงบประมาณที่กำกับดูแล บริหารจัดการเร่งรัดการดำเนินการ เพื่อให้สามารถก่อนนี้และเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมทั้งรายงานให้กรมบัญชีกลางทราบทุกวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป เพื่อรายงานคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ และคณะรัฐมนตรีต่อไป

๒.๒ การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ

๑) กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ ของกรอบงบลงทุน และให้รัฐวิสาหกิจดำเนินการอย่างเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงให้รัฐวิสาหกิจพิจารณากำหนดให้เป้าหมายดังกล่าวเป็นตัวชี้วัดของผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ เนื่องจากผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจเป็นบุคคลที่มีความสำคัญที่สามารถผลักดันและติดตามการเบิกจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายได้

๒) ให้รัฐวิสาหกิจเร่งรัดการลงทุนที่ลงนามในสัญญาแล้ว รวมถึงเร่งลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ สำหรับรัฐวิสาหกิจที่ใช้เงินงบประมาณในการลงทุนให้รัฐวิสาหกิจเตรียมความพร้อมเพื่อให้สามารถลงนามในสัญญาได้ทันทีเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ

/๓) ให้รัฐวิสาหกิจ...

๓) ให้รัฐวิสาหกิจปรับแผนการเบิกจ่าย โดยเพิ่มการเบิกจ่ายในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๗ - มิถุนายน ๒๕๖๗ (Front - Loaded) และหลีกเลี่ยงการกระจุกตัวของการเบิกจ่ายงบลงทุนในไตรมาสสุดท้าย

๔) ให้รัฐวิสาหกิจปีปฏิทินปรับปรุงงบลงทุนระหว่างปี ๒๕๖๗ ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรก สำหรับรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณที่ยังปรับปรุงไม่แล้วเสร็จ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

๕) ให้กระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจกำกับดูแลให้รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายงบลงทุนให้ได้ตามเป้าหมาย และดำเนินการตามมาตรการในข้อ ๑) - ๔) อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะกระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงพลังงาน ที่กำกับดูแลรัฐวิสาหกิจที่มีกรอบงบลงทุนประจำปี ๒๕๖๗ คิดเป็นสัดส่วนรวมกัน มากกว่าร้อยละ ๘๕ ของกรอบงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจทั้งหมด ทั้งนี้ ให้รัฐวิสาหกิจรายงานความคืบหน้า การดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจทุกวันที่ ๕ ของเดือน เพื่อรายงานคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ และคณะรัฐมนตรีต่อไป

มติที่ประชุม เห็นชอบและมอบฝ่ายเลขานุการรายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดพิจารณา ให้ความเห็นชอบมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณใช้เป็นแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐต่อไป

กลุ่มงานติดตามและประเมินผล สำนักนโยบายและแผน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
